



YLY2020068

**宁波市中隆包装制品有限公司**  
**年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设**  
**项目竣工环境保护验收报告**

建设单位:宁波市中隆包装制品有限公司

二〇二〇年九月

建设单位法定代表人:\*\*\*

编制单位法定代表人:\*\*\*

项目负责人:\*\*\*

填表人:\*\*\*

建设单位: 宁波市中隆包装制品有限公司

电话: 137\*\*\*\*0876

邮编: 315600

地址: 宁海县深叻镇长洋村 953 号

编制单位: 宁波市甬蓝检测有限公司

电话: 0574-65358650

邮编: 315600

地址: 宁海县桃源街道堤树路 9 号

# 目 录

第一部分 宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目竣工环境保护验收监测报告表.....	1
表一 项目基本情况 .....	1
表二 工程建设内容.....	3
表三 主要污染源、污染物处理和排放流程.....	7
表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定.....	8
表五 验收监测质量保证及质量控制.....	10
表六 验收监测内容.....	11
表七 生产工况及验收监测结果.....	12
表八 验收监测结论及建议.....	14
附件 1.宁波市中隆包装制品有限公司环评批复“甬环宁建〔2020〕220 号”.....	16
附件 2.宁波市中隆包装制品有限公司监测期间生产工况.....	18
附件 3.宁波市中隆包装制品有限公司监测方案.....	19
附件 4.宁波市中隆包装制品有限公司检测报告.....	20
第二部分 宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目竣工环境保护验收意见.....	25
第三部分 宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目其他需要说明的事项.....	29

# 第一部分 宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目竣工环境保护验收监测报告表

表一 项目基本情况

建设项目名称	年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目				
建设单位名称	宁波市中隆包装制品有限公司				
建设项目性质	新建√ 改扩建 技改 迁建				
建设地点	宁海县深甽镇长洋村 953 号				
主要产品名称	镀铝膜、PET 膜				
设计生产能力	年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜				
实际生产能力	年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜				
建设项目环评时间	2020.08	开工建设时间	2020.08		
调试时间	2020.08	验收现场监测时间	2020.08.29-2020.08.30		
环评报告表审批部门	宁波市生态环境局	环评报告表编制单位	宁波奇英环保技术咨询有限公司		
环保设施设计单位	-	环保设施施工单位	-		
投资总概算	50 万元	环保投资总概算	2 万元	比例	4%
实际总概算	50 万元	环保投资	2 万元	比例	4%
验收监测依据	<p>1、国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》；</p> <p>2、国家生态环境部 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告 2018 年 第 9 号）；</p> <p>3、浙江省人民政府令第 364 号《浙江省人民政府关于修改&lt;浙江省建设项目环境保护管理办法&gt;的决定》；</p> <p>4、浙江省环境保护厅办公室《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发〔2009〕76 号）；</p> <p>5、国环规环评〔2017〕4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；</p> <p>6、宁波奇英环保技术咨询有限公司《宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目环境影响报告表》；</p> <p>7、宁波市生态环境局《关于&lt;宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目环境影响报告表&gt;的审批意见》（甬环宁建〔2020〕220 号）；</p> <p>8、宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目验收监测方案。</p>				

验收监测评价标准、标号、级别、限值

### 1、废水

本项目废水为生活污水。冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理后纳管排放。生活污水排放口执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，其中氨氮、总磷排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准。具体详见表 1-1。

表 1-1 污水污染物排放标准（单位：mg/L，pH 值无量纲）

污染物		pH 值	悬浮物	化学需氧量	氨氮	总磷	动植物油
废水排放标准	GB 8978-1996	6-9	400	500	-	-	100
	GB/T 31962-2015	-	-	-	45	8	-

### 2、噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类标准。具体详见表 1-2。

表 1-2 厂界噪声执行标准

监测对象	项目	单位	限值	引用标准
厂界噪声	等效 A 声级	dB(A)	60（昼间）	（GB 12348-2008） 2 类标准
			50（夜间）	

### 3、固废

本项目产生的固体废弃物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76 号）中的有关规定要求。一般工业固体废物执行《宁波市一般工业固体废物污染防治管理办法（试行）》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其相应标准修改单中规定。

## 表二 工程建设内容

### 1、项目基本概况

宁波市中隆包装制品有限公司租赁郭梁波个人位于宁海县深甬镇长洋村 953 号的空置厂房作为生产用房，建筑面积约 2000 平方米，由营业执照可知其经营范围包括包装制品、塑料制品、工艺品制造、加工；真空镀膜加工；反光材料、保温材料、五金产品、电子产品批发、零售。项目总投资 50 万元，主要购置 PET 膜，通过复卷、分切、镀膜等工艺，建成后形成年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜的生产能力。

企业于 2020 年 8 月委托宁波奇英环保技术咨询有限公司编制完成《宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目环境影响报告表》；2020 年 8 月 28 日，宁波市生态环境局以甬环宁建〔2020〕220 号文件对该项目予以批复。

本项目于 2020 年 8 月开工建设，环保设施于 2020 年 8 月竣工，目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

### 2、地理位置

宁海县东邻象山县，南接三门县，西界天台、新昌，北毗奉化，地理位置优越。象山港横贯东北，三门湾瀛环于东南，海岸线长达 176km<sup>2</sup>，港区开阔，水深浪静，不淤不冻。象山港插入县域内，全县拥有沿海码头 4 座，航运通达国内各沿海港口及长江中下游城市。34 省道（甬临线）、38 省道（象西线）和 74 省道（盛宁线）贯穿境内，甬台温高速公路和甬台温铁路由北向南穿过宁海县，交通便利，离杭州 261km，南距临海 76km，温州 282km。

宁波市中隆包装制品有限公司位于宁海县深甬镇长洋村 953 号。项目东侧为空置厂房；南侧为空置厂房；西侧为山林；北侧为空置厂房。厂区平面图详见图 2-1，地理位置图详见图 2-2。

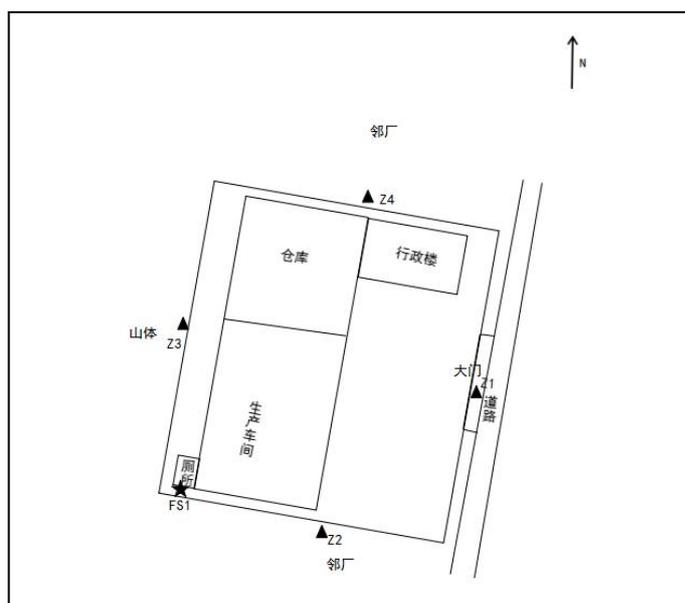


图 2-1 项目厂区平面图



图 2-2 项目地理位置图

### 3、建设内容和规模

本项目租用位于宁海县深甬镇长洋村 953 号已建成工业厂房，建筑面积约 2000m<sup>2</sup>，项目建成后形成年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目。项目生产内容与规模详见表 2-1。

表 2-1 项目生产内容与规模

产品名称	年产量	年运行时数
镀铝膜	500 吨	7200h
PET 膜	500 吨	7200h

### 4、主要生产设备详见表 2-2，主要原辅材详见表 2-3。

表 2-2 主要生产设备一览表

序号	设备名称	环评审批数量	实际设备数量	备注
1	垃圾压缩机	2 台	2 台	-
2	真空镀铝机	1 台	1 台	-
3	气泵	1 台	1 台	-
4	收卷机	5 台	5 台	-
5	台钻	1 台	1 台	-
6	冷却塔	1 台	1 台	-
7	叉车	1 台	1 台	-

表 2-3 主要原辅材料消耗

序号	原辅材料名称	环评中年消耗量	实际年总消耗量	备注
1	PET 膜	1000t/a	1000t/a	-
2	铝丝	4t/a	4t/a	-

### 5、主要生产流程图详见图 2-3~4。




图 2-3 镀铝膜生产工艺流程图

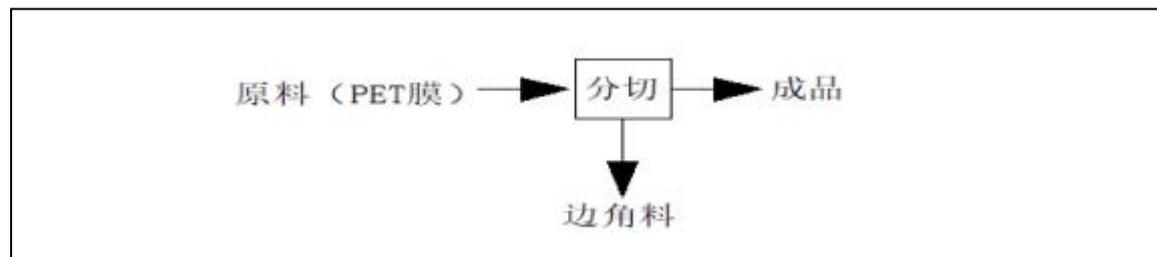


图 2-4 PET 膜生产工艺流程图

生产工艺说明:

#### 镀铝膜:

本项目部分 PET 通过放卷、镀铝、分切、收卷等工艺变成产品。本项目采用铝丝作为镀铝的原料,镀铝过程中最高温度可达 1400°C,真空镀铝阶段采用冷却水冷却。真空镀铝的原理是将卷筒状的待镀薄膜 PET 膜装在真空蒸镀机的放卷站上,将薄膜穿过冷却辊(蒸镀辊、水冷却)卷绕在收卷站上,用真空泵抽真空,使蒸镀室内的真空度达到  $4 \times 10^{-2} \text{pa}$  以上,加热蒸发舟使高纯度的铝丝在 1300-1400°C 的温度下熔化并蒸发成气态铝。启动薄膜卷绕系统,当薄膜速度运行到一定速度以后,打开挡板使气态铝微粒在移动的薄膜基材表面沉淀,冷却即形成一层连续而光亮的金属铝层。通过控制金属铝的蒸发速度、PET 膜的移动速度以及蒸镀室内的真空度来控制铝层的厚度,一般镀铝层的厚度在 250-500A。

铝丝气化后,自然沉淀到薄膜上面,这是一个物理过程,整个蒸镀室为真空密闭,不会有废气产生。PET 薄膜耐高温(180°C 左右),且卷绕在蒸镀辊上(用水冷却),也不会有废气产生。

#### PET 膜:

本项目部分 PET 仅需按照客户提供的尺寸进行分切,即可得到产品,分切过程中会产生边角料。

### 6、主要产污环节

- (1) 废水:主要为生活污水。
- (2) 噪声:主要来自真空镀铝机、收卷机等机械噪声。
- (3) 固废:主要为废包装材料、边角料、生活垃圾。

### 7、项目变动情况

本项目实际建设内容、生产规模、生产工艺、污染防治措施与环评批复基本一致,故本项目无重大变动情况。

表 三 主要污染源、污染物处理和排放流程

**1、废水**

本项目废水主要为生活污水。冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理后纳管排放。废水来源及处理方式见表 3-1，废水处理工艺流程详见图 3-1。

表 3-1 废水来源及处理方式一览表

污水来源	污染物	排放方式	处理设施	排放去向
生活污水	pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油	间歇	化粪池	纳管




图 3-1 废水处理工艺流程图

**2、噪声**

本项目噪声主要来自真空镀铝机、收卷机等生产设备生产运行时产生的噪声，通过关闭门窗，安装减震垫等方式来达到减震降噪效果。

**3、固体废物**

本项目的固体废物主要来源产生情况见表 3-2：

表 3-2 固体废弃物产生及排放情况

序号	种类（名称）	产生工序	属性	实际全年产生量 （吨/年）	实际情况
					利用处置方式及去向
1	废包装材料	材料包装	一般固废	0.012	由资源公司回收利用
2	边角料	分切	一般固废	4.0	
3	生活垃圾	生活	一般固废	1.5	环卫部门定期清运

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

**1、建设项目环境影响报告表**

废水：生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网，最终纳管至宁海县深甬镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。

固废：废包装材料、边角料由资源回收公司回收利用；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

噪声：在选购设备时，应优先考虑低耗、低噪声设备；合理布局各机械设备，设备摆放尽量往车间中央靠；在布置设备时，在设备底部安装减震垫；生产时尽量保证车间门关闭；加强设备设施的维护和保养，确保设备设施的正常运行。

**2、关于《宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目》的审查意见 甬环宁建（2020）220 号**

同意你单位在宁海县深甬镇长洋村 953 号的闲置厂房内年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目。该项目总投资 50 万元，其中环保投资 2 万元，建筑面积 2000 平方米。《环评报告表》经审查后可作为该项目日常运行管理的环境保护依据。

该项目冷却水循环使用，不外排；生活废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，经宁海县深甬污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。

加强内部管理，合理布局厂房，选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

该项目产生的一般固废按资源化、无害化处置。

该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按规定开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入生产。

**3、本项目三同时落实情况**

环评批复及审批意见及实际落实情况详见表 4-1：

表 4-1 环评批复及实际情况对照表

环评批复情况	实际落实情况
<p>同意你单位在宁海县深甬镇长洋村 953 号的闲置厂房内年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目。该项目总投资 50 万元，其中环保投资 2 万元，建筑面积 2000 平方米。</p>	<p>宁波市中隆包装制品有限公司租赁郭梁波个人位于宁海县深甬镇长洋村 953 号的空置厂房作为生产用房，建筑面积约 2000 平方米，项目总投资 50 万元，建成后形成年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜的生产能力。</p>

续表 4-1 环评批复及实际情况对照表

环评批复情况	实际落实情况
<p>该项目冷却水循环使用，不外排；生活废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，经宁海县深甌污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。</p>	<p>本项目废水为生活污水。冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理后纳管排放。生活污水排放口符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，其中氨氮、总磷排放符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准。</p>
<p>加强内部管理，合理布局厂房，选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。</p>	<p>厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准。</p>
<p>该项目产生的一般固废按资源化、无害化处置。</p>	<p>废包装材料、边角料由资源回收公司回收利用；生活垃圾委托环卫部门定期清运。</p>

表五 验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析方法

表 5-1 监测分析方法一览表

类别	项目名称	方法依据
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986
	悬浮物	水质 悬浮物测定 重量法 GB/T 11901-1989
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

2、质量控制与质量保证

(1) 环保设施竣工验收现场监测，按规定满足相应的工况条件，否则负责验收监测的单位立即停止现场采样和测试。

(2) 现场采样和测试严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因予以详细说明。

(3) 环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

(4) 环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。

(5) 参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

(6) 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进现场前对气体分析、采样器流量计等进行校核。

(7) 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期的声级计。

(8) 验收监测的采样记录及分析测试结果，按照国家标准和技术规范有关要求进行处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

表六 验收监测内容

1、废水

项目废水监测内容及频次见表 6-1。

表 6-1 废水监测内容及频次

监测点位	污染物名称	监测频次
生活污水排放口	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油	4 次/天，共 2 天


2、厂界噪声监测

在厂界布设 4 个监测点位，在厂界围墙外 1 米处，传声器位置高于墙体并指向声源处，监测 2 天，昼夜各 1 次。噪声监测内容见表 6-2。

表 6-2 监测内容及监测频次

污染物名称	监测点位	监测频次
厂界噪声	厂界四周各设 1 个监测点位	昼夜各 1 次，共 2 天

3、监测点位布置图

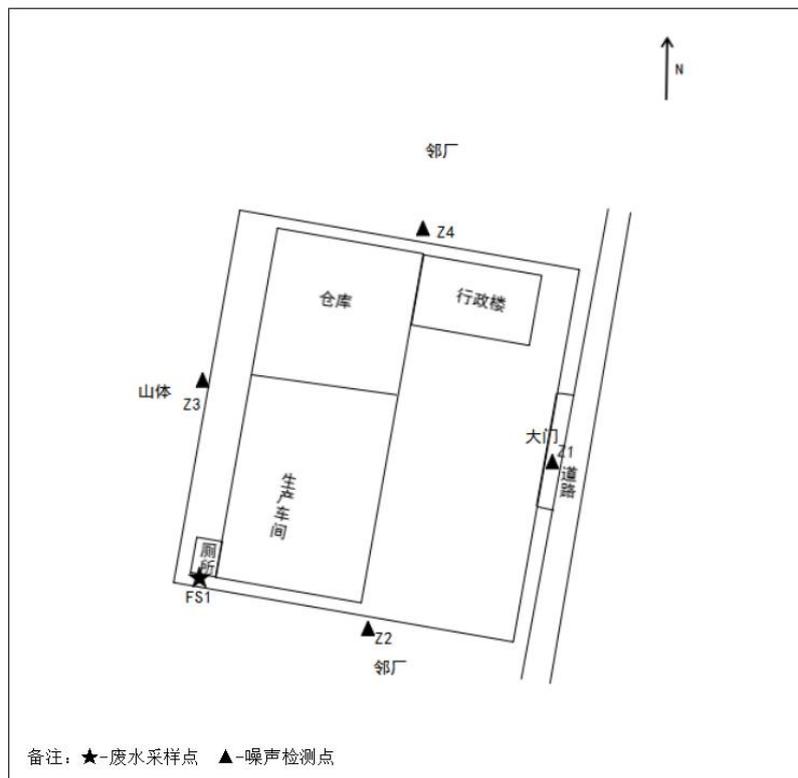

表七 生产工况及验收监测结果

1、生产工况

验收监测期间，依据建设项目相应产品在监测期间实际产量的工况记录方法，宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目的实际运行工况正常，且各项环保设施运行正常，具体生产工况情况如表 7-1 所示。

表 7-1 建设项目生产工况情况表

序号	产品名称	监测期间产量				设计年产量 (吨/年)
		2020.08.29		2020.08.30		
		产量 (吨)	负荷 (%)	产量 (吨)	负荷 (%)	
1	镀铝膜	1.62	97.2	1.56	93.6	500
2	PET 膜	1.58	94.8	1.60	96.0	500

注：日设计产量等于全年设计产量除以全年工作天数，年工作时间 300 天。

验收监测结果：

1、废水监测

验收监测期间，本项目生活污水排放口污染物 pH 值（范围）、悬浮物、化学需氧量、动植物油排放浓度最大日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷排放浓度最大日均值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准。具体监测结果见表 7-2。

表 7-2 生活污水监测结果（单位：除 pH 值无量纲，其余为 mg/L）

监测点位	监测日期	监测频次	监测项目					
			pH 值	悬浮物	化学需氧量	氨氮	总磷	动植物油
生活污水总排放口 FS1	2020.08.29	1	7.46	164	317	9.26	4.92	18.3
		2	7.22	168	314	7.82	5.69	19.2
		3	7.31	114	246	9.76	5.60	16.0
		4	7.57	186	245	8.29	4.78	16.6
	日均值（范围）		<b>7.22-7.57</b>	<b>158</b>	<b>280</b>	<b>8.78</b>	<b>5.25</b>	<b>17.5</b>
	2020.08.30	1	7.41	184	324	8.84	4.59	16.4
		2	7.12	144	292	9.46	5.15	18.5
		3	7.18	194	308	9.19	5.16	16.5
		4	7.12	186	337	9.95	5.78	16.8
	日均值（范围）		<b>7.12-7.41</b>	<b>177</b>	<b>315</b>	<b>9.36</b>	<b>5.17</b>	<b>17.0</b>
	最大日均值（范围）		<b>7.12~7.57</b>	<b>177</b>	<b>315</b>	<b>9.36</b>	<b>5.25</b>	<b>17.5</b>
	标准限值		<b>6~9</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>100</b>
	是否符合		符合	符合	符合	符合	符合	符合

执行标准：《污水排放综合标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准。

## 2、噪声检测

验收监测期间，本项目厂界四周昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体监测结果见表 7-3。

表 7-3 厂界噪声监测结果

监测日期	监测点位	昼间 Leq dB (A)		夜间 Leq dB (A)	
		测量时间	测量结果	测量时间	测量结果
2020.08.29	厂界东侧 (Z1)	08:06-08:07	54.2	22:04-22:05	43.3
	厂界南侧 (Z2)	08:11-08:12	57.6	22:08-22:09	45.4
	厂界西侧 (Z3)	08:16-08:17	58.8	22:14-22:15	46.2
	厂界北侧 (Z4)	08:20-08:21	56.5	22:19-22:20	45.7
监测时气象条件		天气阴，风速≤5m/s			
2020.08.30	厂界东侧 (Z1)	08:02-08:03	55.1	22:10-22:11	42.5
	厂界南侧 (Z2)	08:07-08:08	58.2	22:15-22:16	44.7
	厂界西侧 (Z3)	08:13-08:14	58.1	22:21-22:22	45.8
	厂界北侧 (Z4)	08:18-08:19	55.6	22:26-22:27	45.2
监测时气象条件		天气晴，风速≤5m/s			
<b>2 类标准</b>		<b>60 dB (A)</b>		<b>50 dB (A)</b>	
执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准。					

注：表 7-2~3 中监测数据引自检测报告（YLE20200317）。

## 3、总量控制要求

本项目批复中无总量控制要求。

表八 验收监测结论及建议

## 1、结论

### (1) 废水监测结果及达标排放情况

验收监测期间，本项目生活污水排放口污染物 pH 值（范围）、悬浮物、化学需氧量、动植物油排放浓度最大日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷排放浓度最大日均值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准。

### (2) 厂界噪声监测结果及达标排放情况

验收监测期间，本项目厂界昼夜噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准。

### (3) 固体废物排放情况

废包装材料、边角料由资源回收公司回收利用；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

## 2、总结论

综上所述，宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目技改项目在建设中严格执行竣工环保“三同时”制度，验收资料齐全，环保污染防治措施基本落实，监测报告中各项污染物指标均达到相应的排放标准及相关环境标准，符合竣工环境保护验收的相关要求。

## 3、建议

加强车间管理，减少噪声的排放。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称		宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目				项目代码		-		建设地点		宁海县深甽镇长洋村 953 号				
	行业类别（分类管理名录）		C2921 塑料薄膜制造				建设性质		<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造								
	设计生产能力		年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜				实际生产能力		同设计能力		环评单位		宁波奇英环保技术咨询有限公司				
	环评文件审批机关		宁波市生态环境局				审批文号		甬环宁建〔2020〕220 号		环评文件类型		报告表				
	开工日期		2020.08				竣工日期		2020.08		排污许可证申领时间		-				
	环保设施设计单位		-				环保设施施工单位		-		本工程排污许可证编号		-				
	验收单位		宁波市中隆包装制品有限公司				环保设施监测单位		宁波市甬蓝检测有限公司		验收监测时工况		正常				
	投资总概算（万元）		50				环保投资总概算（万元）		2		所占比例（%）		4				
	实际总投资（万元）		50				实际环保投资（万元）		2		所占比例（%）		4				
	废水治理（万元）		0.5	废气治理（万元）		0.5	噪声治理（万元）		0.5	固体废物治理（万元）		0.5	绿化及生态（万元）		0	其他（万元）	
新增废水处理设施能力		-				新增废气处理设施能力		-		年平均工作时		7200h					
运营单位		宁波市中隆包装制品有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）			-		验收时间		2020.09				
污染物排放达 标与总量控制 （工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)				
	废水																
	化学需氧量																
	氨氮																
	石油类																
	废气																
	二氧化硫																
	烟尘																
	工业粉尘																
	氮氧化物																
	工业固体废物																
	与项目有关的其他特征污染物																

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9) = (4)-(5)-(8)- (11) + (1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# 宁波市生态环境局文件

甬环宁建〔2020〕220 号

## 关于《宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜 500 吨 PET 膜建设项目 环境影响报告表》的审查意见

宁波市中隆包装制品有限公司：

你单位报送的《年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目环境影响报告表》（以下简称《环评报告表》）收悉。经研究，现将审查意见函告如下：

一、根据你单位委托宁波奇英环保技术咨询有限公司编制的《环评报告表》结论，同意你单位在宁海县深圳镇长洋村 953 号的闲置厂房内建设年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜项目。该项目总投资 50 万元，其中环保投资 2 万元，建筑面积 2000 平方米。《环评报告表》经审查后可作为该项目

— 1 —

日常运行管理的环境保护依据。

二、项目建设应落实以下环保措施：

1、该项目冷却水循环使用，不外排。生活废水经预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准后纳入市政污水管网，经宁海县深圳污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的A级标准后排放。

2、加强内部管理，合理布局厂房，选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值。

3、该项目产生的一般固废按资源化、无害化处置。

三、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报审项目环评文件。项目建设、运行过程中产生不符合经报审的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，该项目方可正式投入生产。



## 工况证明

我公司委托宁波市甬蓝检测有限公司对本项目年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目进行验收监测，本公司实行 24 小时工作制，一年共生产 300 天，实际年生产镀铝膜 500 吨、PET 膜 500 吨。

监测期间（2020 年 8 月 29 日），我公司共生产镀铝膜（当日产量）1.62 吨，共生产 PET 膜（当日产量）1.58 吨，监测期间（2020 年 8 月 30 日），我公司共生产镀铝膜（当日产量）1.56 吨，共生产 PET 膜（当日产量）1.60 吨。符合工况监测要求。

公司名称：



（盖章）

日期：

2020 年 8 月 31 日

宁波市中隆包装制品有限公司

年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目验收监测方案



一、生活污水

1.1 执行标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准。

1.2 监测内容：

监测点位	污染物名称	监测频次
生活污水排放口	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油	3 次/天，共 2 天

二、厂界噪声

2.1 执行标准：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准。

2.2 监测内容：

污染物名称	监测点位	监测频次
厂界噪声	厂界东侧、南侧、西侧和北侧各设 1 个监测点位	昼夜各 1 次，共 2 天

注：监测时应符合竣工验收监测工况要求。



宁波市甬蓝检测有限公司

# 检测报告

## TEST REPORT

(甬蓝检测) 第 YLE20200317 号

项目名称: 宁波市中隆包装制品有限公司废水、噪声检测

委托单位: 宁波市中隆包装制品有限公司

报告编制 陈丹莹

审核人 张瑜

批准人 周路路 (授权签字人)

报告日期 2020-09-01

检测单位盖章)



## 说 明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖宁波市甬蓝检测有限公司红色检测报告专用章及其骑缝章均无效；

二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖宁波市甬蓝检测有限公司红色检测报告专用章均无效；

三、未经同意本报告不得用于广告宣传；

四、由委托方采样送检的样品，本报告仅对来样负责；

五、本报告正文共 3 页，一式 2 份，发出报告与留存报告的正文一致；

六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向宁波市甬蓝检测有限公司提出。

地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道堤树路 9 号

邮编：315600

电话：0574-65358650

传真：0574-65358650

样品类别 废水、噪声

委托单位及地址 宁波市中隆包装制品有限公司(宁海县深甬镇长洋村 953 号)

受检单位及地址 宁波市中隆包装制品有限公司(宁海县深甬镇长洋村 953 号)

采样地点 宁海县深甬镇长洋村 953 号(宁波市中隆包装制品有限公司)

采样日期 2020 年 8 月 29 日-8 月 30 日

检测单位 宁波市甬蓝检测有限公司(浙江省宁波市宁海县桃源街道堤树路 9 号)

检测日期 2020 年 8 月 29 日-9 月 1 日

检测方法 pH 值: 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986

悬浮物: 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989

化学需氧量: 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

氨氮: 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

总磷: 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989

动植物油: 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018

工业企业厂界环境噪声: 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

评价标准 /

\*\*\*此页以下空白\*\*\*

## 检测结果

表1 生活污水检测结果 (单位: 除 pH 值无量纲, 其余为 mg/L)


采样 点位	采样 日期	采样 频次	采样点位 坐标	样品性状	检测项目						
					pH 值	悬浮物	化学需 氧量	氨氮	总磷	动植 物油	
生活污 水排放 口 FS1	2020. 08.29	1	纬度: 29°27'58" 经度: 121°21'13"	微黄微浊	7.46	164	317	9.26	4.92	18.3	
		2		微黄微浊	7.22	168	314	7.82	5.69	19.2	
		3		微黄微浊	7.31	114	246	9.76	5.60	16.0	
		4		微黄微浊	7.57	186	245	8.29	4.78	16.6	
	日均值 (范围)				-	7.22-7.57	158	280	8.78	5.25	17.5
	2020. 08.30	1	纬度: 29°27'58" 经度: 121°21'13"	微黄微浊	7.41	184	324	8.84	4.59	16.4	
		2		微黄微浊	7.12	144	292	9.46	5.15	18.5	
		3		微黄微浊	7.18	194	308	9.19	5.16	16.5	
		4		微黄微浊	7.12	186	337	9.95	5.78	16.8	
	日均值 (范围)				-	7.12-7.41	177	315	9.36	5.17	17.0

表2 厂界噪声检测结果

检测点位	检测日期	检测点位坐标	昼间 Leq dB (A)		夜间 Leq dB (A)	
			测量时间	测量结果	测量时间	测量结果
厂界东侧 (Z1)	2020.08.29	纬度: 29°27'58" 经度: 121°21'13"	08:06-08:07	54.2	22:04-22:05	43.3
厂界南侧 (Z2)			08:11-08:12	57.6	22:08-22:09	45.4
厂界西侧 (Z3)			08:16-08:17	58.8	22:14-22:15	46.2
厂界北侧 (Z4)			08:20-08:21	56.5	22:19-22:20	45.7
检测时气象条件		天气阴, 风速≤5m/s				
厂界东侧 (Z1)	2020.08.30	纬度: 29°27'58" 经度: 121°21'13"	08:02-08:03	55.1	22:10-22:11	42.5
厂界南侧 (Z2)			08:07-08:08	58.2	22:15-22:16	44.7
厂界西侧 (Z3)			08:13-08:14	58.1	22:21-22:22	45.8
厂界北侧 (Z4)			08:18-08:19	55.6	22:26-22:27	45.2
检测时气象条件		天气晴, 风速≤5m/s				

\*\*\*此页以下空白\*\*\*

### 测点示意图

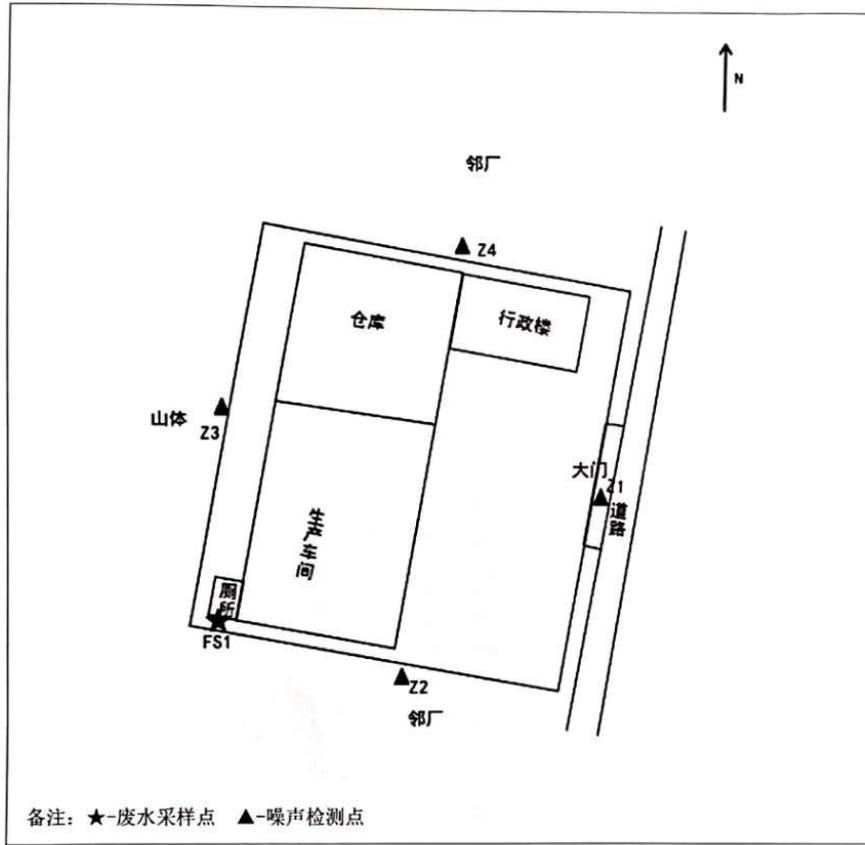

END

## 第二部分 宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目竣工环境保护验收意见

### 宁波市中隆包装制品有限公司 年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目 竣工环境保护验收意见

2020 年 9 月 2 日，宁波市中隆包装制品有限公司根据《年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目竣工环境保护验收报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

#### 一、工程建设基本情况

##### （一）建设地点、规模、主要建设内容

宁波市中隆包装制品有限公司位于宁波市宁海县深甽镇长洋工业区 952 号，建筑面积约 2000m<sup>2</sup>。主要有垃圾压缩机 2 台、真空镀铝机 1 台、收卷机 5 台等生产设备，项目建成后实现年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜生产规模。项目实际建设地点、建设内容与环评批复基本一致。

##### （二）建设过程及环保审批情况

企业于 2020 年 8 月委托宁波奇英环保技术咨询有限公司编制了《宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目环境影响报告表》；宁波市生态环境局以“甬环宁建（2020）220 号”对该项目予以批复。本项目于 2020 年 8 月开工建设，环保设施于 2020 年 8 月竣工，并于 2020 年 8 月底进行调试。

##### （三）投资情况

本项目实际总投资约 50 万元，其中环保投资约 2 万元，占投资总额的 4%。

##### （四）验收范围

本次验收的范围为宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目，为项目整体验收。

#### 二、工程变动情况

经现场核查，项目实际建设内容、生产规模、生产工艺、污染防治措施与环评批复基本一致，本项目无重大变动情况。

### 三、环境保护设施建设情况

#### （一）废水

主要为生活污水。

本项目冷水循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理后纳管排放。

#### （二）废气

本项目无生产废气产生。

#### （三）噪声

项目的噪声污染主要来源于各类设备的机械噪声。项目采用合理布局，加装减震垫，选用低噪声设备等措施进行降噪。

#### （四）固体废物

本项目废包装材料、边角料由资源回收公司回收利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。

#### （五）总量控制

本项目无总量控制要求。

### 四、环境保护设施调试效果

#### （一）污染物排放情况

##### 1.废水

监测期间（2020年8月29日~8月30日），本项目生活污水排放口污染物pH值（范围）、悬浮物、化学需氧量、动植物油排放浓度最大日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷排放浓度最大日均值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。

## 2.厂界噪声

监测期间（2020年8月29日~8月30日），本项目厂界噪声昼夜监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

## 五、工程建设对环境的影响

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环境保护设施均能正常运行。项目竣工验收废水、废气、噪声监测数据基本能达到相关排放标准；项目基本落实了各类固废的分类处置途径，基本实现了固废的无害化处置；项目污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

## 六、验收结论

经现场查验，宁波市中隆包装制品有限公司年产500吨镀铝膜、500吨PET膜建设项目履行了环境影响评价制度，项目建设过程中执行了环境保护“三同时”制度，总体落实了环评报告表及其批复提出的各项环境保护措施，满足竣工环境保护验收条件，经审议验收组结论：项目整体竣工环境保护验收合格。

## 七、后续要求

1、严格遵守环保法律法规，完善各项环境保护管理和监测制度，强化从事环保工作人员业务培训，加强车间管理，减少无组织废气的排放。

2、按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》相关要求，完善验收监测报告内容。完善竣工环保验收的相关手续，按规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

七、验收组成员信息表

参会人员名单				
	姓名	单位	职称	电话
组长	董进龙	宁波市中隆包装制品有限公司	总经理	
其他成员	陈丹荣	宁波市南益拾捌有限公司	-	



### 第三部分 宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目其他需要说明的事项

#### 1. 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

##### 1.1 设计简况

建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

##### 1.2 施工简况

环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

##### 1.3 验收过程简况

宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目环保设施于 2020 年 8 月竣工。宁波市中隆包装制品有限公司委托宁波市甬蓝检测有限公司对宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目进行验收监测工作。按照检测委托合同，宁波市甬蓝检测有限公司提供废水、噪声项目的监测服务。2020 年 9 月，宁波市甬蓝检测有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》以及宁波市甬蓝检测有限公司出具“YLE20200317”检测报告，编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告；2020 年 9 月 2 日，宁波市中隆包装制品有限公司组织成立本项目竣工环境保护验收工作组，验收工作组踏勘企业生产现场后，经认真讨论和审查，形成了如下验收意见：经现场查验，《宁波市中隆包装制品有限公司宁波市中隆包装制品有限公司年产 500 吨镀铝膜、500 吨 PET 膜建设项目》环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，项目建设内容与项目环境影响报告表、及其批复基本一致，已落实了环保“三同时”和环境影响报告表及批复的各项环保要求，竣工环保验收条件基本具备。验收资料完整齐全，污

染物达标排放、环保设施有效运行、验收监测结论明确合理。验收工作组结论：该项目竣工环境保护验收合格。

## 2. 其他环境保护措施的实施情况

### 2.1 制度措施落实情况

#### (1) 环保组织机构及规章制度

本建设项目运营期污染物为废水、一般固废、生活垃圾，企业已设有环保组织机构，完善环境管理台账记录。

#### (2) 环境风险防范措施

本建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定未要求制定环境风险应急预案，因此本项目未制定环境风险应急预案。

#### (3) 环境监测计划

本建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定未要求制定环境监测计划，因此本项目未制定环境监测计划。

### 2.2 配套措施落实情况

#### (1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施，无需说明。

## 3. 整改工作意见

根据验收意见，本建设项目竣工验收合格，各项环保设施已基本落实到位，无相应整改。

宁波市中隆包装制品有限公司

2020 年 9 月 2 日
