



**宁海县兴得包装有限公司**  
**年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50**  
**万个摇窗器生产项目**  
**竣工环境保护验收报告**

建设单位:宁海县兴得包装有限公司

二〇二一年十一月

建设单位法定代表人:\*\*\*

编制单位法定代表人:\*\*\*

项目负责人:\*\*\*

报告审核人:\*\*\*

填表人:\*\*\*

建设单位: 宁海县兴得包装有限公司 (盖章)

电话: 135\*\*\*\*7399

邮编: 315600

地址: 宁海县桥头胡工业区久安南路 5-1—5-25 号

编制单位: 宁波市甬蓝检测有限公司 (盖章)

电话: 0574-65358650

邮编: 315600

地址: 宁海县桃源街道堤树路 9 号

# 目 录

第一部分 宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目竣工环境保护验收监测报告表.....	1
表一 项目基本情况 .....	1
表二 工程建设内容.....	4
表三 主要污染源、污染物处理和排放流程.....	9
表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定.....	11
表五 验收监测质量保证及质量控制.....	15
表六 验收监测内容.....	16
表七 生产工况及验收监测结果.....	17
表八 验收监测结论及建议.....	21
附件 1.宁海县兴得包装有限公司环评批复“甬环宁建〔2020〕305 号” ..	23
附件 2.宁海县兴得包装有限公司监测期间生产工况.....	26
附件 3.宁海县兴得包装有限公司监测方案.....	27
附件 4.宁海县兴得包装有限公司检测报告.....	28
附件 5.宁海县兴得包装有限公司危险固废处置协议及危险固废仓库.....	35
附件 6.宁海县兴得包装有限公司生产设备图.....	40
第二部分 宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目竣工环境保护验收意见.....	41
第三部分 宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目其他需要说明的事项.....	45

**第一部分 宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目竣工环境保护验收监测报告表**

表一 项目基本情况

建设项目名称	年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目				
建设单位名称	宁海县兴得包装有限公司				
建设项目性质	新建√ 改扩建 技改 迁建				
建设地点	宁海县桥头胡工业区久安南路 5-1—5-25 号				
主要产品名称	彩卡、彩盒、摇窗器				
设计生产能力	年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器				
实际生产能力	年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器				
建设项目环评时间	2020.10	开工建设时间	2020.11		
调试时间	2021.06-2021.11	验收现场监测时间	2021.10.30-2021.10.31		
环评报告表审批部门	宁波市生态环境局	环评报告表编制单位	宁波奇英环保技术咨询有限公司		
环保设施设计单位	-	环保设施施工单位	-		
投资总概算	500 万元	环保投资总概算	10 万元	比例	2%
实际总概算	500 万元	环保投资	10 万元	比例	2%
验收监测依据	<p>1、国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》；</p> <p>2、国家生态环境部 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告 2018 年 第 9 号）；</p> <p>3、浙江省人民政府令第 364 号《浙江省人民政府关于修改&lt;浙江省建设项目环境保护管理办法&gt;的决定》；</p> <p>4、浙江省环境保护厅办公室《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发〔2009〕76 号）；</p> <p>5、国环规环评〔2017〕4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；</p> <p>6、宁波奇英环保技术咨询有限公司《宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目环境影响报告表》；</p> <p>7、宁波市生态环境局《关于&lt;宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目环境影响报告表&gt;的审查意见》（甬环宁建〔2020〕305 号）；</p> <p>8、宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目验收监测方案。</p>				

验收监测评价标准、标号、级别、限值

### 1、废水

本项目废水为生活污水。制版过程中产生少量洗版废液，收集后委托宁波大地环工环保有限公司处置；生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终至宁海县城北污水处理厂处理。生活污水排放口污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，其中氨氮、总磷排放均执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准。具体详见表 1-1。

表 1-1 污水污染物排放标准 （单位：mg/L，pH 值无量纲）

污染物		pH 值	悬浮物	化学需氧量	氨氮	总磷	动植物油
废水排放标准	GB 8978-1996	6-9	400	500	-	-	100
	GB/T31962-2015	-	-	-	45	8	-

### 2、废气

本项目废气为印刷废气、移印油墨废气、胶水废气。印刷废气经集气罩顶吸+车间整体密闭收集后通过二级活性炭装置处理后通过 15 米高排气筒排放；移印油墨废气、胶水废气经车间机械通风排放。印刷废气排放口污染物非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表 2 新污染源二级标准；厂界无组织废气污染物非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表 2 无组织排放监控浓度限值，厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCs 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值。具体详见表 1-2~3。

表 1-2 废气污染物排放标准

污染物	排放标准	最高允许排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	最高允许排放速率(kg/h)	无组织排放监控浓度限值 (mg/m <sup>3</sup> )
非甲烷总烃	GB 16297-1996	120	10 (15m)	4.0

表 1-3 废气污染物排放标准

污染物	排放标准	厂区内 VOCs 无组织特别排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )
非甲烷总烃	GB 37822-2019	6 (监控点处 1h 平均浓度值)

### 3、噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类标准。具体详见表 1-4。

表 1-4 厂界噪声执行标准

监测对象	项目	单位	限值	引用标准
厂界噪声	等效 A 声级	dB(A)	60 (昼间)	(GB 12348-2008) 2 类标准

#### 4、固废

本项目产生的固体废弃物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发〔2019〕76号）中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般工业固体废物执行《宁波市一般工业固体废物污染防治管理办法（试行）》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中规定。





图 2-2 项目地理位置图

### 3、建设内容和规模

本项目租用位于宁海县桥头胡工业区长安南路 5-1—5-25 号已建成工业厂房，建筑面积约 2136.6m<sup>2</sup>，项目建成后形成年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器的生产规模。项目生产内容与规模详见表 2-1。

表 2-1 项目生产内容与规模

产品名称	年产量	年运行时数
彩卡	800 万张	2400h
彩盒	1200 万个	2400h
摇窗器	50 万个	2400h

### 4、主要生产设备详见表 2-2，主要原辅材详见表 2-3。

表 2-2 主要生产设备一览表

序号	设备名称	环评审批数量	实际设备数量	备注
1	切纸机	1 台	1 台	-
2	压痕机	5 台	5 台	-
3	四色印刷机	1 台	1 台	-
4	高频机	1 台	1 台	-
5	打包机	4 台	4 台	-
6	糊盒机	1 台	1 台	-
7	移印机	1 台	1 台	-
8	洗版机	2 台	2 台	-
9	晒版机	1 台	1 台	-
10	打孔机	4 台	4 台	-
11	攻丝机	4 台	4 台	-
12	冲床	5 台	5 台	-
13	台钻	2 台	2 台	-
14	空压机	1 台	1 台	-
15	风机	1 台	1 台	-

表 2-3 主要原辅材料消耗

序号	原辅材料名称	环评中年消耗量	实际年总消耗量	备注
1	白板纸	125 吨/年	125 吨/年	-
2	灰卡纸	100 吨/年	100 吨/年	-
3	瓦楞纸	50 吨/年	50 吨/年	-
4	油墨	4.0 吨/年	4.0 吨/年	-
5	润版液	1.0 吨/年	1.0 吨/年	-

续表 2-3 主要原辅材料消耗

序号	原辅材料名称	环评中年消耗量	实际年总消耗量	备注
6	环保洗车水	0.5 吨/年	0.5 吨/年	-
7	白乳胶	0.3 吨/年	0.3 吨/年	-
8	橡皮布	0.2 吨/年	0.2 吨/年	-
9	洗版液	0.045 吨/年	0.045 吨/年	-
10	毛坯件	50 万只/年	50 万只/年	-
11	移印油墨	0.001 吨/年	0.001 吨/年	-
12	慢干水	0.003 吨/年	0.003 吨/年	-

5、主要生产流程图详见图 2-3~5。

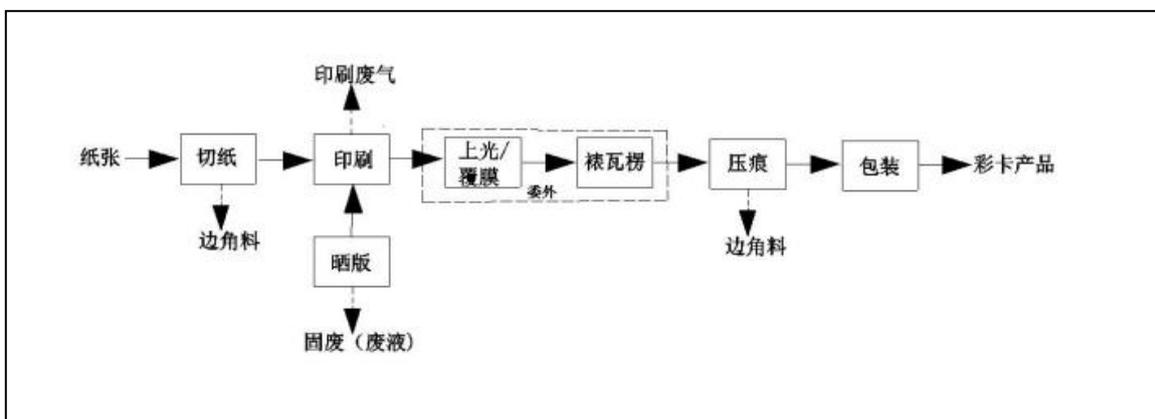


图 2-3 彩卡生产工艺流程图

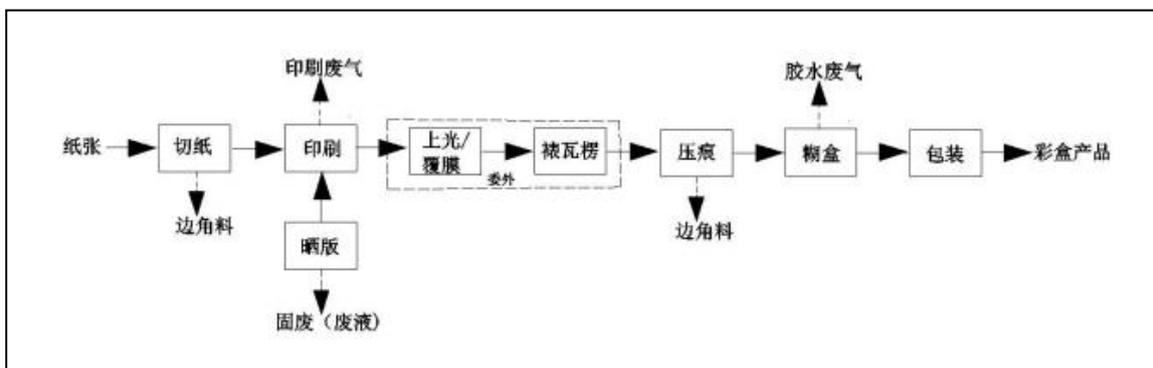


图 2-4 彩盒生产工艺流程图

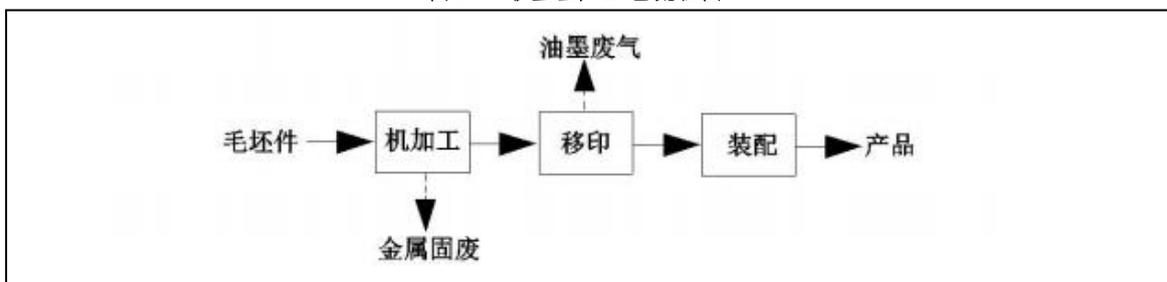


图 2-5 摇窗器生产工艺流程图

生产工艺说明:

一、彩卡生产工艺说明:

①切纸: 使用切纸机对纸质原料进行切纸, 有边角料产生。

②晒版: 按客户要求要求进行电脑排版, 用晒版机对 PS 版进行显影、定影, 过程中使用到洗版液。洗版液主要成分为氢氧化钠、硫代硫酸钠、对苯二酚、少量助剂等, 其中有机物成分对苯二酚含量占比平均约为 1.4%, 占比小且溶于水、不易挥发, 且洗版液用量少, 有机废气可忽略不计。洗版液循环使用, 每月更换一次, 有少量废液产生, 收集后作为危废委托宁波大地化工环保有限公司处置。

③印刷: 印刷使用红、蓝、黄、黑四种油墨, 油墨为即用型油墨不需稀释。彩印印刷室保持  $25\pm 3^{\circ}\text{C}$  恒温, 印刷在常温下速干。换版时印刷版需要用使用洗车水清洗, 使用橡皮布擦干净。

④上光或覆膜: 在印刷品表面涂上(或喷、印)一层光油(无色透明涂料), 或根据需求者覆上一层薄膜, 保护及增加印刷品光泽, 本工序委外加工。

⑤裱瓦楞: 将彩纸和瓦楞纸用淀粉粘合剂糊裱在一起, 本工序委外加工。

⑥压痕: 使用压痕机对纸卡进行压痕切割即可得到纸卡。

二、彩盒生产工艺说明(糊盒工艺, 其他与纸卡相同):

糊盒: 使用糊盒机对纸卡进行糊盒后即可得到纸盒, 用白乳胶糊盒, 有胶水废气产生。

三、摇窗器生产工艺说明:

①机加工: 对毛坯件进行冲压、钻孔、攻丝等机加工, 过程中会产生少量金属固废。

②移印: 采用移印机将标识印制产品上, 过程中会产生少量油墨挥发的废气, 移印油墨需要用慢干水稀释使用。

③装配: 将加工后的配件进行组装包装后即得到产品。

## 6、主要产污环节

(1) 废水: 主要为生活污水。

(2) 废气: 主要为印刷废气、移印油墨废气、胶水废气。

(3) 噪声: 主要来自印刷机、切纸机等机械运行时产生的噪声。

(4) 固废: 主要为纸板边角料、一般包装材料、金属固废、废活性炭、废包装桶、废橡皮布、洗版废液、废洗车水、生活垃圾。

## 7、项目变动情况

本项目实际建设内容、生产规模、生产工艺、污染防治措施与环评批复基本一致, 故本项目无重大变动情况。

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

1、废水

本项目废水主要为生活污水。制版过程中产生少量洗版废液，收集后委托宁波大地环工环保有限公司处置；生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终至宁海县城北污水处理厂处理。废水来源及处理方式见表 3-1，废水处理工艺流程详见图 3-1。

表 3-1 废水来源及处理方式一览表

污水来源	污染物	排放方式	处理设施	排放去向
生活污水	pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油	间歇	化粪池	纳管




图 3-1 废水处理工艺流程图

2、废气

本项目废气主要为印刷废气、移印油墨废气、胶水废气。印刷废气经集气罩顶吸+车间整体密闭收集后通过二级活性炭装置处理后通过 15 米高排气筒排放；油墨废气、胶水废气经车间机械通风排放。废气来源及处理方式见表 3-2，废气处理工艺流程图见图 3-2，废气处理设施图见图 3-3。

表 3-2 废气产生情况汇总

废气来源	废气污染物	排放方式	处理设施	排放去向
印刷废气	非甲烷总烃	间歇	二级活性炭吸附	大气
移印油墨废气	非甲烷总烃	间歇	-	大气
胶水废气	非甲烷总烃	间歇	-	大气



图 3-2 废气处理工艺流程图（◎有组织废气监测点位）



图 3-3 废气处理设施图

### 3、噪声

本项目噪声主要来自印刷机、切纸机等生产设备生产运行时产生的噪声，通过关闭门窗，安装减震垫等方式来达到减震降噪效果。

### 4、固体废物

本项目的固体废物主要来源产生情况见表 3-3。

表 3-3 固体废弃物产生及排放情况

序号	种类（名称）	产生工序	属性	实际全年产生量 （吨/年）	实际情况
					利用处置方式及去向
1	纸板边角料	切纸、压痕	一般固废	2.75	由资源回收公司回收利用
2	一般包装材料	原材料包装	一般固废	0.1	
3	金属固废	机加工	一般固废	1.25	
4	废橡皮布	印刷	危险固废	0.3	委托宁波大地环工环保 有限公司处置
5	废包装桶	原材料包装	危险固废	0.127	
6	废活性炭	废气处理	危险固废	10.158	
7	洗版废液	晒版	危险固废	0.015	
8	废洗车水	洗版	危险固废	0.35	
9	生活垃圾	生活	一般固废	2.7	委托环卫部门清运

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

**1、建设项目环境影响报告表**

废水：生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，纳管至宁海县城北污水处理厂处理达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。

废气：印刷废气对印刷车间进行区域隔离封闭，整体密闭收集后通过二级活性炭吸收处理后通过 15m 高排气筒排放，废气收集效率 95%，处理效率 90%以上；移印油墨废气、胶水废气加强车间通风换气。

固废：纸板边角料、一般废包装材料、金属固废由资源回收公司回收利用；废活性炭、废包装桶、废橡皮布、洗版废液、废洗车水委托有资质单位处理；生活垃圾环卫部门定期清运。

噪声：在选购设备时，应优先考虑低耗、低噪声设备；合理布局各机械设备，设备摆放尽量往车间中央靠；在布置设备时，在设备底部安装减震垫；车间尽量使用隔声门窗，生产时尽量保证车间门关闭；加强设备设施的维护和保养，确保设备设施的正常运行。

**2、关于《宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目环境影响报告表》的审查意见 甬环宁建（2020）305 号**

根据你单位委托宁波奇英环保技术咨询有限公司编制的《环评报告表》结论，以及该项目环评行政许可公示情况，在项目符合产业政策、产业发展规划，选址符合主体功能区规划、城乡规划、土地利用总体规划等前提下，原则同意项目《环评报告表》结论。《环评报告表》经审查后可作为该项目日常运行管理的环境保护依据。

该项目选址在宁海县桥头胡工业区久安南路 5-1—5-25 号，总投资 500 万元，其中环保投资 10 万元，建筑面积 2136.6 平方米，项目建成后，产能为年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器。

该项目印刷废气须密闭收集处理，胶水废气、移印油墨废气、印刷废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值，厂区内挥发性有机物无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。

生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后排入市政污水管网，经宁海县城北污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。

废活性炭、废包装桶、废橡皮布、洗版废液、废洗车水等属于危险废物，危险废物暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求落实防腐、防渗、防雨等措施，并按《危险废物转移联单管理办法》送有资质单位处置；一般固废按资源化、

无害化处置。

加强内部管理，合理布局厂房，选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

该项目实施后核定污染物排放总量为：VOCs0.23吨/年。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定开展竣工环境保护验收。验收合格后，该项目方可正式投入生产。

### 3、本项目三同时落实情况

环评批复及审查意见及实际落实情况详见表 4-1：

表 4-1 环评批复及实际情况对照表

环评批复情况	实际落实情况
该项目选址在宁海县桥头胡工业区久安南路 5-1—5-25 号，总投资 500 万元，其中环保投资 10 万元，建筑面积 2136.6 平方米，项目建成后，产能为年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器。	宁海县兴得包装有限公司租赁宁海县远大电子工具厂位于宁海县桥头胡工业区久安南路 5-1—5-25 号的工业厂房作为生产厂房，建筑面积约 2136.6m <sup>2</sup> ，项目总投资 500 万元，项目建成后形成年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器的生产规模。
生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后排入市政污水管网，经宁海县城北污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。	本项目废水为生活污水。制版过程中产生少量洗版废液，收集后委托宁波大地环工环保有限公司处置；生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终至宁海县城北污水处理厂处理。验收监测期间，生活污水排放口污染物排放符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，其中氨氮、总磷排放均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）B 级标准。

续表 4-1 环评批复及实际情况对照表

环评批复情况	实际落实情况
<p>该项目印刷废气须密闭收集处理，胶水废气、移印油墨废气、印刷废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值，厂区内挥发性有机物无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。</p>	<p>本项目废气为印刷废气、移印油墨废气、胶水废气。印刷废气经集气罩顶吸+车间整体密闭收集后通过二级活性炭装置处理后通过 15 米高排气筒排放；移印油墨废气、胶水废气经车间机械通风排放。验收监测期间，印刷废气排放口污染物非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表 2 新污染源二级标准；厂界无组织废气污染物非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表 2 无组织排放监控浓度限值，厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOC<sub>S</sub> 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值。</p>
<p>废活性炭、废包装桶、废橡皮布、洗版废液、废洗车水等属于危险废物，危险废物暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求落实防腐、防渗、防雨等措施，并按《危险废物转移联单管理办法》送有资质单位处置；一般固废按资源化、无害化处置。</p>	<p>纸板边角料、一般废包装材料、金属固废由资源回收公司回收利用；废活性炭、废包装桶、废橡皮布、洗版废液、废洗车水委托宁波大地环工环保有限公司处置；生活垃圾环卫部门定期清运。</p>
<p>加强内部管理，合理布局厂房，选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。</p>	<p>验收监测期间，厂界四周噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准。</p>
<p>该项目实施后核定污染物排放总量为：VOCs0.23 吨/年。</p>	<p>本项目实施后 VOC<sub>S</sub> 实际排放总量为 0.180 吨/年。</p>

续表 4-1 环评批复及实际情况对照表

环评批复情况	实际落实情况
<p>根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。</p>	<p>项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施未发生重大变化。</p>

表五 验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析方法

表 5-1 监测分析方法一览表

类别	项目名称	方法依据
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	悬浮物	水质 悬浮物测定 重量法 GB/T 11901-1989
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

2、质量控制与质量保证

(1) 环保设施竣工验收现场监测，按规定满足相应的工况条件，否则负责验收监测的单位立即停止现场采样和测试。

(2) 现场采样和测试严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因予以详细说明。

(3) 环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

(4) 环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。

(5) 参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

(6) 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进现场前对气体分析、采样器流量计等进行校核。

(7) 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期的声级计。

(8) 验收监测的采样记录及分析测试结果，按照国家标准和技术规范有关要求进行处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

## 表六 验收监测内容

### 1、废水

项目废水监测内容及频次见表 6-1。

表 6-1 废水监测内容及频次

监测点位	污染物名称	监测频次
生活污水排放口	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油	4 次/天，共 2 天

### 2、废气

有组织废气监测内容频次详见表 6-2，无组织废气监测内容频次详见表 6-3。

表 6-2 有组织废气监测内容及频次

污染物名称	监测点位	监测因子	监测频次
印刷废气	处理设施进出口	非甲烷总烃	3 次/天，共 2 天

表 6-3 无组织废气监测内容及频次

废气名称	监测点位	监测因子	监测频次
印刷废气、移印油墨废气、胶水废气	企业厂界四周各设置 1 个监测点位	非甲烷总烃	3 次/天，共 2 天
印刷废气	厂区内车间外设置 1 个监测点位	非甲烷总烃	


### 3、厂界噪声监测

在厂界布设 4 个监测点位，在厂界围墙外 1 米处，传声器位置高于墙体并指向声源处，监测 2 天，昼间 1 次。噪声监测内容见表 6-4。

表 6-4 监测内容及监测频次

污染物名称	监测点位	监测频次
厂界噪声	厂界四周各设 1 个监测点位	昼间 1 次，共 2 天

### 4、监测点位布置图

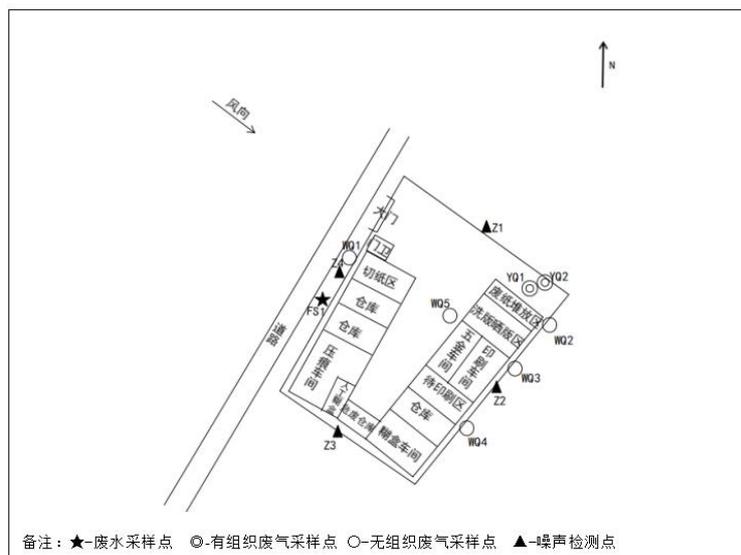

表七 生产工况及验收监测结果

1、生产工况

验收监测期间，依据建设项目相应产品在监测期间实际产量的工况记录方法，宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目的实际运行工况正常，且各项环保设施运行正常，具体生产工况情况如表 7-1 所示。

表 7-1 建设项目生产工况情况表

序号	产品名称	监测期间产量				设计年产量
		2021.10.30		2021.10.31		
		产量	负荷	产量	负荷	
1	彩卡	2.4 万张	90.0%	2.2 万张	82.5%	800 万张
2	彩盒	3.5 万个	87.5%	3.6 万个	90.0%	1200 万个
3	摇窗器	0.14 万个	84.0%	0.15 万个	90.0%	50 万个

注：日设计产量等于全年设计产量除以全年工作天数，年工作时间 300 天。

验收监测结果：

2、废水监测

验收监测期间，本项目生活污水排放口污染物 pH 值（范围）、悬浮物、化学需氧量、动植物油排放浓度最大日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷排放浓度最大日均值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）B 级标准。具体监测结果见表 7-2。

表 7-2 生活污水监测结果（单位：除 pH 值无量纲，其余为 mg/L）

监测点位	监测日期	监测频次	监测项目					
			pH 值	悬浮物	化学需氧量	氨氮	总磷	动植物油
生活污水排放口 FS1	2021.10.30	1	7.1	116	166	6.98	5.02	8.21
		2	6.8	132	196	7.66	5.32	7.03
		3	6.9	144	186	6.27	4.79	9.14
		4	6.9	109	222	6.76	5.16	6.66
	日均值（范围）		<b>6.8~7.1</b>	<b>125</b>	<b>192</b>	<b>6.92</b>	<b>5.07</b>	<b>7.76</b>
	2021.10.31	1	6.9	124	168	7.92	5.30	5.59
		2	7.0	101	157	7.21	5.04	6.94
		3	6.9	99	192	6.53	5.52	7.28
		4	6.8	119	187	6.93	4.86	8.01
	日均值（范围）		<b>6.8~7.0</b>	<b>111</b>	<b>176</b>	<b>7.15</b>	<b>5.18</b>	<b>6.96</b>
	最大日均值（范围）		<b>6.8~7.1</b>	<b>125</b>	<b>192</b>	<b>7.15</b>	<b>5.18</b>	<b>7.76</b>
	标准限值		<b>6~9</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>100</b>
	是否符合		<b>符合</b>	<b>符合</b>	<b>符合</b>	<b>符合</b>	<b>符合</b>	<b>符合</b>

执行标准：《污水排放综合标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）B 级标准。

### 3、废气监测

#### 3.1 有组织废气检测

验收监测期间，印刷废气处理设施排放口污染物非甲烷总烃排放最大值符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 新污染源二级标准。具体监测结果见表 7-3。

表 7-3 有组织废气监测结果

监测点位	监测日期	监测频次	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	非甲烷总烃	
				排放浓度(mg/m <sup>3</sup> )	排放速率(kg/h)
印刷废气处理 设施进口 YQ1	2021.10.30	1	3.59×10 <sup>3</sup>	55.7	0.200
		2	3.44×10 <sup>3</sup>	59.8	0.206
		3	3.53×10 <sup>3</sup>	57.2	0.202
	2021.10.31	1	3.51×10 <sup>3</sup>	57.4	0.201
		2	3.65×10 <sup>3</sup>	55.6	0.203
		3	3.61×10 <sup>3</sup>	56.5	0.204
印刷废气处理 设施出口 YQ2 (15m)	2021.10.30	1	4.35×10 <sup>3</sup>	17.3	7.53×10 <sup>-2</sup>
		2	4.18×10 <sup>3</sup>	18.0	7.52×10 <sup>-2</sup>
		3	4.40×10 <sup>3</sup>	17.8	7.83×10 <sup>-2</sup>
	2021.10.31	1	4.11×10 <sup>3</sup>	16.9	6.95×10 <sup>-2</sup>
		2	4.20×10 <sup>3</sup>	18.1	7.60×10 <sup>-2</sup>
		3	4.32×10 <sup>3</sup>	17.8	7.69×10 <sup>-2</sup>
<b>最大值</b>			-	<b>18.1</b>	<b>7.83×10<sup>-2</sup></b>
<b>标准限值</b>			-	<b>120</b>	<b>10</b>
<b>是否符合</b>			-	<b>符合</b>	<b>符合</b>

执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 新污染源二级标准。

#### 2.2 无组织废气检测

验收监测期间，厂界无组织废气污染物非甲烷总烃排放浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值；厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放浓度最大值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCS 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值，具体监测结果见表 7-4~5，监测期间气象参数见表 7-6。

表 7-4 无组织废气检测结果

监测点位	监测日期	监测频次	监测结果
			非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )
上风向 WQ1	2021.10.30	1	0.86
		2	0.82
		3	0.74
	2021.10.31	1	0.74
		2	0.80
		3	0.86

续表 7-4 无组织废气检测结果

监测点位	监测日期	监测频次	监测结果
			非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )
下风向 WQ2	2021.10.30	1	2.85
		2	2.94
		3	3.04
	2021.10.31	1	2.96
		2	3.04
		3	2.99
下风向 WQ3	2021.10.30	1	3.25
		2	3.50
		3	2.96
	2021.10.31	1	3.24
		2	2.92
		3	3.30
下风向 WQ4	2021.10.30	1	3.09
		2	3.16
		3	2.88
	2021.10.31	1	3.12
		2	3.45
		3	3.34
最大值			3.50
标准限值			4.0
是否符合			符合

执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。

表 7-5 无组织废气监测结果

监测点位	监测日期	监测频次	监测结果
			非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )
厂区内车间外 WQ5	2021.10.30	1	4.75
		2	4.68
		3	4.94
	2021.10.31	1	4.97
		2	4.85
		3	5.14
最大值			5.14
标准限值			6
是否符合			符合

执行标准：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCS 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值。

表 7-6 监测期间气象参数

日期	采样频次	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气情况
2021.10.30	1	16.6	102.1	1.4	西北	晴
	2	22.1	101.8	1.2	西北	晴
	3	22.1	102.2	1.5	西北	晴
2021.10.31	1	17.7	102.2	1.3	西北	阴
	2	23.2	101.9	1.3	西北	阴
	3	23.3	101.9	1.6	西北	阴

#### 4、噪声检测

验收监测期间，本项目厂界四周昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体监测结果见表 7-7。

表 7-7 厂界噪声监测结果

监测日期	监测点位	昼间 Leq dB (A)	
		测量时间	测量结果
2021.10.30	厂界东侧 (Z1)	08:34-08:35	54.7
	厂界南侧 (Z2)	08:40-08:41	57.5
	厂界西侧 (Z3)	08:45-08:46	56.2
	厂界北侧 (Z4)	08:51-08:52	52.4
监测时气象条件		天气晴，风速≤5m/s	
2021.10.31	厂界东侧 (Z1)	08:39-08:40	55.2
	厂界南侧 (Z2)	08:44-08:45	58.1
	厂界西侧 (Z3)	08:50-08:51	57.5
	厂界北侧 (Z4)	08:56-08:57	53.2
监测时气象条件		天气阴，风速≤5m/s	
<b>2类标准</b>		<b>60 dB (A)</b>	
执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。			

注：表 7-2~7 中监测数据引自检测报告（YLE20210722）。

#### 5、总量控制要求

企业主要污染物 VOC<sub>s</sub> 环评批复中规定的总量控制指标为 0.23t/a，根据验收监测期间监测结果核算，生产时间按 300 天核算，企业印刷废气 VOC<sub>s</sub> 排放量为 0.180t/a（工作时间按 8 小时/天计），符合环评批复中规定的总量控制指标要求。

表八 验收监测结论及建议

## 1、结论

### (1) 废水监测结果及达标排放情况

验收监测期间，本项目生活污水排放口污染物 pH 值（范围）、悬浮物、化学需氧量、动植物油排放浓度最大日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷排放浓度最大日均值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准。

### (2) 废气监测结果及达标排放情况

验收监测期间，印刷废气处理设施排放口污染物非甲烷总烃排放最大值符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 新污染源二级标准。

验收监测期间，厂界无组织废气污染物非甲烷总烃排放浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值；厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放浓度最大值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCs 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值。

### (3) 厂界噪声监测结果及达标排放情况

验收监测期间，本项目厂界四周昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

### (4) 固体废物排放情况

本项目纸板边角料、一般废包装材料、金属固废由资源回收公司回收利用；废活性炭、废包装桶、废橡皮布、洗版废液、废洗车水委托宁波大地化工环保有限公司处置；生活垃圾环卫部门定期清运。

## 2、总结论

综上所述，宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目在建设中严格执行竣工环保“三同时”制度，验收资料齐全，环保污染防治措施基本落实，监测报告中各项污染物指标均达到相应的排放标准及相关环境标准，符合竣工环境保护验收的相关要求。

## 3、建议

加强环保设施的运行管理，确保污染物稳定达标。进一步落实环境风险防范措施，开展环境应急演练，确保环境安全。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目				项目代码	-			建设地点	宁海县桥头胡工业区久安南路 5-1—5-25 号		
	行业类别（分类管理名录）	C2320 装订及印刷相关服务 C3351 建筑家具用金属配件制造				建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造						
	设计生产能力	年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器				实际生产能力	同设计生产能力		环评单位	宁波奇英环保技术咨询有限公司			
	环评文件审批机关	宁波市生态环境局				审批文号	甬环宁建〔2020〕305 号		环评文件类型	报告表			
	开工日期	2020.11				竣工日期	2021.06		排污许可证申领时间	-			
	环保设施设计单位	-				环保设施施工单位	-		本工程排污许可证编号	-			
	验收单位	宁海县兴得包装有限公司				环保设施监测单位	宁波市甬蓝检测有限公司		验收监测时工况	正常			
	投资总概算（万元）	500				环保投资总概算（万元）	10		所占比例（%）	2			
	实际总投资（万元）	500				实际环保投资（万元）	10		所占比例（%）	2			
	废水治理（万元）	3	废气治理（万元）	4	噪声治理（万元）	2	固体废物治理（万元）	1		绿化及生态（万元）	0	其他（万元）	0
新增废水处理设施能力	-				新增废气处理设施能力	-		年平均工作时	2400h				
运营单位	宁海县兴得包装有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）				-		验收时间	2021.11	
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
	废水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	化学需氧量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	氨氮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	石油类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	废气	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	二氧化硫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	烟尘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	工业粉尘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	氮氧化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	工业固体废物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	与项目有关的其他特征污染物	VOCs	-	-	-	-	-	0.180	0.23	-	0.180	0.23	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# 宁波市生态环境局文件

甬环宁建〔2020〕305 号

## 关于《宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目环境影响报告表》的审查意见

宁海县兴得包装有限公司：

你单位报送的《关于要求对宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目审查的申请报告》以及随文附送的《年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器环境影响报告表》（以下简称《环评报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关环保法律法规，经研究，现将审查意见函告如下：

一、根据你单位委托宁波奇英环保技术咨询有限公司

编制的《环评报告表》结论，以及该项目环评行政许可公示情况，在项目符合产业政策、产业发展规划，选址符合主体功能区规划、城乡规划、土地利用总体规划等前提下，原则同意项目《环评报告表》结论。《环评报告表》经审查后可作为该项目日常运行管理的环境保护依据。

二、该项目选址在宁海县桥头胡工业区久安南路 5-1—5-25 号，总投资 500 万元，其中环保投资 10 万元，建筑面积 2136.6 平方米，项目建成后，产能为年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器。

三、项目建设应落实以下环保措施：

1、该项目印刷废气须密闭收集处理，胶水废气、移印油墨废气、印刷废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值，厂区内挥发性有机物无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。

2、生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后排入市政污水管网，经宁海县城北污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。

3、废活性炭、废包装桶、废橡皮布、洗版废液、废洗车水等属于危险废物，危险废物暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求落实防腐、

防渗、防雨等措施，并按《危险废物转移联单管理办法》送有资质单位处置；一般固废按资源化、无害化处置。

4、加强内部管理，合理布局厂房，选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、该项目实施后核定污染物排放总量为：VOCs0.23吨/年。

四、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报审项目环评文件。项目建设、运行过程中产生不符合经报审的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，该项目方可正式投入生产。



## 工况证明

我公司委托宁波市甬蓝检测有限公司对本项目年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目进行验收监测，本公司实行 8 小时工作制，一年共生产 300 天，实际年生产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器。

监测期间（2021 年 10 月 30 日），我公司共生产彩卡（当日产量）2.4 万张，共生产彩盒（当日产量）3.5 万个，共生产摇窗器（当日产量）0.14 万个，监测期间（2021 年 10 月 31 日），我公司共生产彩卡（当日产量）2.2 万张，共生产彩盒（当日产量）3.6 万个，共生产摇窗器（当日产量）0.15 万个。符合监测工况要求。

公司名称：  (盖章)

日期： 2021 年 10 月 31 日

附件 3. 宁海县兴得包装有限公司监测方案

## 宁海县兴得包装有限公司

# 年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产 项目验收监测方案

### 一、有组织废气

1.1 执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表 2 新污染源二级标准。

#### 1.2 监测内容：

监测对象	废气名称	监测点位	监测因子	监测频次
有组织废气	印刷废气	处理设施进出口	非甲烷总烃	3 次/天，共 2 天
备注：同步记录排气筒高度				

### 二、无组织废气

2.1 执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表 2 无组织监控浓度限值，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCS 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值。

#### 2.2 监测内容：

监测对象	废气名称	监测点位	监测因子	监测频次
无组织废气	印刷废气、移印油墨 废气、胶水废气	企业厂界四周各设 置 1 个监测点位	非甲烷总烃	3 次/天，共 2 天
	印刷废气	厂区内车间外设置 1 个监测点位	非甲烷总烃	
备注：同步记录气象参数				

### 三、生活污水

3.1 执行标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准。

#### 3.2 监测内容：

监测点位	污染物名称	监测频次
生活污水排放口	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油	4 次/天，共 2 天

### 三、厂界噪声

3.1 执行标准：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准。

#### 3.2 监测内容：

污染物名称	监测点位	监测频次
厂界噪声	厂界东侧、南侧、西侧和北侧各设 1 个监测点位	昼间 1 次，共 2 天

**注：监测时应符合竣工验收监测工况要求。**



191112052450

宁波市甬蓝检测有限公司

# 检 测 报 告

## TEST REPORT

(甬蓝检测) 第 YLE20210722 号

项目名称: 宁海县兴得包装有限公司废水、废气、噪声检测

委托单位: 宁海县兴得包装有限公司

报告编制 邬卡卡

审核人 张瑜

批准人 周晓敏 (授权签字人)

报告日期 2021-11-03



## 说 明

- 一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖宁波市甬蓝检测有限公司红色检测报告专用章及其骑缝章均无效；
- 二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖宁波市甬蓝检测有限公司红色检测报告专用章均无效；
- 三、未经同意本报告不得用于广告宣传；
- 四、由委托方采样送检的样品，本报告仅对来样负责；
- 五、本报告正文共 5 页，一式 3 份，发出报告与留存报告的正文一致；
- 六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向宁波市甬蓝检测有限公司提出。

地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道堤树路 9 号

邮编：315600

电话：0574-65358650

传真：0574-65358650

样品类别 废水、废气、噪声

委托单位及地址 宁海县兴得包装有限公司（宁海县桥头胡工业区久安南路 5-1-5-25 号）

受检单位及地址 宁海县兴得包装有限公司（宁海县桥头胡工业区久安南路 5-1-5-25 号）

采样地点 宁海县桥头胡工业区久安南路 5-1-5-25 号（宁海县兴得包装有限公司）

采样日期 2021 年 10 月 30 日-10 月 31 日

检测单位 宁波市甬蓝检测有限公司（浙江省宁波市宁海县桃源街道堤树路 9 号）

检测日期 2021 年 10 月 30 日-11 月 2 日

检测方法 pH 值：水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020

悬浮物：水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989

化学需氧量：水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

氨氮：水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

总磷：水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989

动植物油：水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018

非甲烷总烃：固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017

非甲烷总烃：环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017

工业企业厂界环境噪声：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

评价标准  /

\*\*\*此页以下空白\*\*\*

## 检测结果

**表 1 生活污水检测结果** (单位: 除 pH 值无量纲, 其余为 mg/L)

采样 点位	采样 日期	采样 频次	采样点位 坐标	样品 性状	检测项目						
					pH 值	悬浮物	化学需 氧量	氨氮	总磷	动植物 油	
生活 污水 排放 口 FS1	2021. 10.30	1	纬度: 29°22'39" 经度: 121°28'51"	微黄微浊	7.1	116	166	6.98	5.02	8.21	
		2		微黄微浊	6.8	132	196	7.66	5.32	7.03	
		3		微黄微浊	6.9	144	186	6.27	4.79	9.14	
		4		微黄微浊	6.9	109	222	6.76	5.16	6.66	
	日均值 (范围)				-	<b>6.8~7.1</b>	<b>125</b>	<b>192</b>	<b>6.92</b>	<b>5.07</b>	<b>7.76</b>
	2021. 10.31	1	纬度: 29°22'39" 经度: 121°28'51"	微黄微浊	6.9	124	168	7.92	5.30	5.59	
		2		微黄微浊	7.0	101	157	7.21	5.04	6.94	
		3		微黄微浊	6.9	99	192	6.53	5.52	7.28	
		4		微黄微浊	6.8	119	187	6.93	4.86	8.01	
	日均值 (范围)				-	<b>6.8~7.0</b>	<b>111</b>	<b>176</b>	<b>7.15</b>	<b>5.18</b>	<b>6.96</b>

**表 2 有组织废气检测结果**

采样 点位	采样 日期	采样 频次	采样点位 坐标	标干流量 (m³/h)	非甲烷总烃	
					排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
印刷废 气处理 设施进 口 YQ1	2021.10.30	1	纬度: 29°22'39" 经度: 121°28'51"	3.59×10³	55.7	0.200
		2		3.44×10³	59.8	0.206
		3		3.53×10³	57.2	0.202
	2021.10.31	1	纬度: 29°22'39" 经度: 121°28'51"	3.51×10³	57.4	0.201
		2		3.65×10³	55.6	0.203
		3		3.61×10³	56.5	0.204
印刷废 气处理 设施出 口 YQ2 (15m)	2021.10.30	1	纬度: 29°22'39" 经度: 121°28'51"	4.35×10³	17.3	7.53×10 <sup>-2</sup>
		2		4.18×10³	18.0	7.52×10 <sup>-2</sup>
		3		4.40×10³	17.8	7.83×10 <sup>-2</sup>
	2021.10.31	1	纬度: 29°22'39" 经度: 121°28'51"	4.11×10³	16.9	6.95×10 <sup>-2</sup>
		2		4.20×10³	18.1	7.60×10 <sup>-2</sup>
		3		4.32×10³	17.8	7.69×10 <sup>-2</sup>
最大值				-	<b>18.1</b>	<b>7.83×10<sup>-2</sup></b>

表 3 无组织废气检测结果

采样 点位	采样 日期	采样 频次	采样点位坐标	检测结果
				非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )
上风向 WQ1	2021.10.30	1	纬度: 29°22'39" 经度: 121°28'51"	3.19
		2		2.79
		3		2.74
	2021.10.31	1	纬度: 29°22'39" 经度: 121°28'51"	2.49
		2		2.66
		3		2.78
下风向 WQ2	2021.10.30	1	纬度: 29°22'39" 经度: 121°28'51"	2.85
		2		2.94
		3		3.04
	2021.10.31	1	纬度: 29°22'39" 经度: 121°28'51"	2.96
		2		3.04
		3		2.99
下风向 WQ3	2021.10.30	1	纬度: 29°22'39" 经度: 121°28'51"	3.25
		2		3.50
		3		2.96
	2021.10.31	1	纬度: 29°22'39" 经度: 121°28'51"	3.24
		2		2.92
		3		3.30
下风向 WQ4	2021.10.30	1	纬度: 29°22'39" 经度: 121°28'51"	3.09
		2		3.16
		3		2.88
	2021.10.31	1	纬度: 29°22'39" 经度: 121°28'51"	3.12
		2		3.45
		3		3.34
最大值				3.50

表 4 无组织废气检测结果

采样 点位	采样 日期	采样 频次	采样点位坐标	检测结果
				非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )
车间外 WQ5	2021.10.30	1	纬度: 29°22'39" 经度: 121°28'51"	4.75
		2		4.68
		3		4.94
	2021.10.31	1	纬度: 29°22'39" 经度: 121°28'51"	4.97
		2		4.85
		3		5.14
最大值				5.14


表 5 采样期间气象参数

采样日期	采样频次	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气情况
2021.10.30	1	16.6	102.1	1.4	西北	晴
	2	22.1	101.8	1.2	西北	晴
	3	22.1	102.2	1.5	西北	晴
2021.10.31	1	17.7	102.2	1.3	西北	阴
	2	23.2	101.9	1.3	西北	阴
	3	23.3	101.9	1.6	西北	阴

表 6 厂界噪声检测结果

检测点位	检测日期	检测点位坐标	昼间 Leq dB (A)	
			测量时间	测量结果
厂界东侧 Z1	2021.10.30	纬度: 29°22'39" 经度: 121°28'51"	08:34-08:35	54.7
厂界南侧 Z2			08:40-08:41	57.5
厂界西侧 Z3			08:45-08:46	56.2
厂界北侧 Z4			08:51-08:52	52.4
检测时气象条件			天气晴, 风速≤5m/s	
厂界东侧 Z1	2021.10.31	纬度: 29°22'39" 经度: 121°28'51"	08:39-08:40	55.2
厂界南侧 Z2			08:44-08:45	58.1
厂界西侧 Z3			08:50-08:51	57.5
厂界北侧 Z4			08:56-08:57	53.2
检测时气象条件			天气阴, 风速≤5m/s	

### 测点示意图

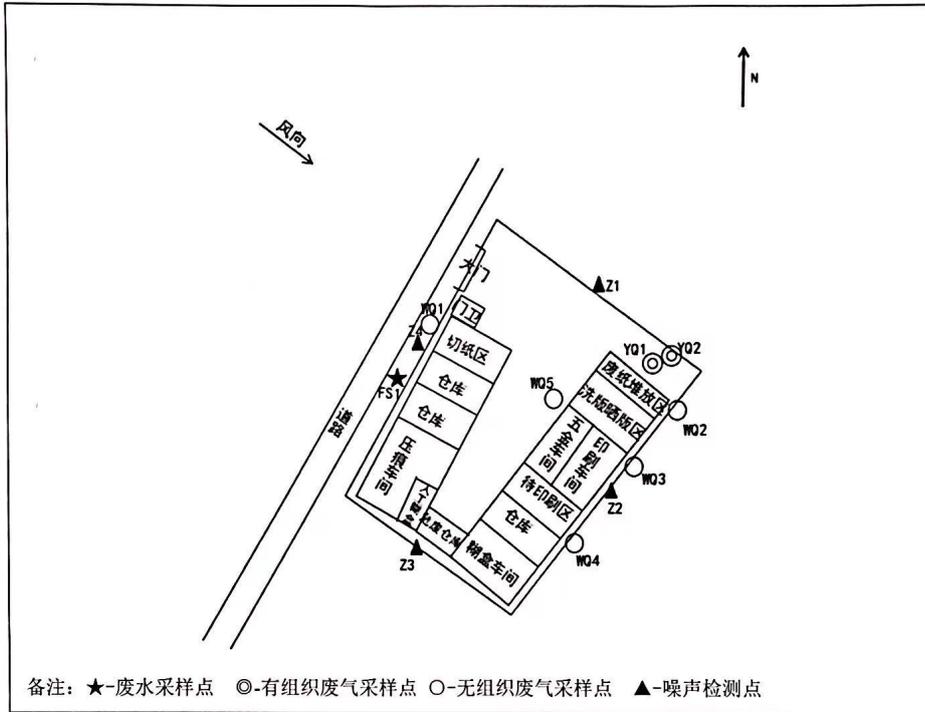

END



## 附件 5. 宁海县兴得包装有限公司危险固废处置协议及危险固废仓库

**委托处置服务协议书**

协议编号: KH202111112-N-Y

本协议于 [2021] 年 [11] 月 [17] 日由以下双方签署

(1) 甲方: 宁海县兴得包装有限公司  
地址: 宁波市宁海县桥头胡工业园区兴和东路 26 号  
电话: 13506887399  
传真: --  
联系人: 胡亚飞

(2) 乙方: 宁波大地化工环保有限公司  
地址: 宁波石化经济技术开发区(澥浦) 巴子山路 1 号  
电话: 18368212156  
传真: 0574-86504002  
联系人: 李宏洲

鉴于:

(1) 乙方为一家获政府有关部门批准的专业废物处置公司(危险废物经营许可证编号: 浙危废经第 3300000016 号), 具备提供处置危险废物服务的能力。

(2) 甲方在生产经营中将产生废包装桶、废活性炭、废抹布、洗版废液、废洗车水产生, 属危险废物。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定, 甲方愿意委托乙方代为处置上述废物, 双方就此委托服务达成如下一致意见, 以供双方共同遵守:

协议条款:

- 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关规定, 甲方应负责依法向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门进行相关危险废物转移的申请和危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料的申报, 经批准后始得进行废物转移。
- 甲方须按照乙方要求提供废物的相关资料, 并加盖公章, 以确保所提供资料的真实性、合法性(包括但不限于: 废物产生单位基本情况调查表、废物性状明细表、废物分析报告、废物中所含物质的 MSDS 等)。
- 甲方需明确向乙方指出废物中含有的危险性最大物质(如: 闪点最低、最不稳定、反应性、毒性、腐蚀性最强等); 废物具有多种危险特性时, 按危险特性列明危险性最大物质; 废物中含低闪点物质的, 必须有准确的物质名称、含量。乙方有权前往甲方废物产生点采样, 以便乙方对废物的性状、包装及运输条件进行评估, 并且确认是否有能力处置。
- 甲方有责任对在生产过程中产生的废物进行安全收集并分类暂存于乙方认可尺寸的封装容器内, 并有责任根据国家有关规定, 在废物的包装容器表面明显处张贴符合国家标准 GB18597《危险废物贮存污染控制标准》的标签, 标签上的废物名称同本协议附件所约定的废物名称。甲方的包装物和/或标签若不符合本协议要求、和/或废物标签名称与包装内废物不一致时, 乙方有权拒绝接收甲方废物或退回该批次废物, 所产生的相应运费由甲方承担, 包装容器甲方自备, 乙方视最终处置情况返还。(例如: 200L 大口塑料桶, 要求: 密封无泄漏、易处置)。
- 甲方应保证每批次处置的废物性状和所提供的资料基本相符, 其中: 闪点、PH、热值、硫、氯与甲方向乙方提供的资料、样品的数据偏差不得超过 15%, 超过 15% 的按协议第 7 条约定执行, 闪点在

第 1 页共 4 页

地址: 宁波石化经济技术开发区(澥浦) 巴子山路 1 号  
电话: 0574-86504001 传真: 0574-86504002

- 81℃以上的废物，上述数据偏差超过15%的，双方协商解决。
6. 甲方在处置时以包装为单位向乙方提供分析报告和该批次废物的废物性状明细表。处置前乙方有权再次前往甲方现场采样，若检测结果与甲方提供的性状证明有较大差别时，乙方有权拒绝接收甲方废物；若该批次废物已运至乙方，乙方有权将该批次废物退回甲方，所产生的相应运费由甲方承担。
  7. 若甲方产生新的废物，或废物性状发生较大变化，甲方应及时通报乙方，并重新取样，重新确认废物名称、废物成分、包装容器、和处置费用等事项，经双方协商达成一致意见后，重新签订协议或签订补充协议。如果甲方未及时告知乙方：
    - 1) 视为甲方违约，乙方有权终止协议，并且不承担违约责任；
    - 2) 乙方有权拒绝接收，并由甲方承担相应运费；
    - 3) 如因此导致该批次废物在收集、运输、储存、处置等全过程中产生不良影响或发生事故，或导致收集处置费用增加的，甲方应承担因此产生的损害责任和额外费用。乙方有权向甲方提出追加处置费用和相应赔偿的要求。
  8. 甲方不得在处置废物时夹带剧毒品、易爆类物质、含磷元素、溴元素、氟元素等特殊元素的物质（合同另有约定的除外），乙方有权将夹带剧毒品、易爆类物质、含磷元素、溴元素、氟元素等特殊元素的物质的废物退回给甲方，因此产生的运输费用由甲方承担。由于甲方隐瞒或夹带导致发生事故的，甲方应承担全部责任并全额赔偿，乙方有权向甲方追加相应处置费用。
  9. 废物的运输须按国家有关危险废物的运输规定执行，甲方须提前填写随车联单并盖章以传真或扫描邮件的方式给乙方，作为提出运输申请的依据，乙方根据排车情况及自身处置能力安排运输服务，在运输过程中甲方应提供进出厂区的方便，甲方负责对废物按乙方要求装车，并提供叉车及人工等装卸协助。
  10. 由乙方运输，乙方委托第三方有资质单位运输。甲方提出废物运输申请，乙方在确认具备收货条件后的十五个工作日内，乙方根据运输车辆安排，及时为甲方提供运输，如遇管制、限行等交通管理情况，甲方负责办理运输车辆的相关通行证件，车辆到达管制区域边界时，甲方需将相关通行证件提供运输车辆驾驶员，并全程陪同，确保安全运输。若由于甲方原因，导致车辆无法进行清运，所产生的相应运费由甲方承担。
  11. 运输由乙方负责，乙方承诺废物自甲方场地运出起，其运输、处置过程均遵照国家有关规定执行，并承担由此带来的风险和责任，国家法律另有规定者除外。
  12. 乙方负责按照国家有关规定和标准对甲方委托的废物进行安全处置，并按照国家有关规定承担违规处置的相应责任。
  13. 费用及支付方式：
    - 1) 废物种类、代码、包装方式、处置费：见合同附件（附：委托处置废物明细表）。
    - 2) 计量：甲方如具备计量条件双方可当场计量，否则以乙方的计量为准，若发生争议，双方协商解决。
  14. 支付方式：超出部分处置费甲方须在接收到乙方开具的增值税专用发票后的一周内将所有费用转账至乙方账户。  
银行信息：  
甲方：户名：宁海县兴得包装有限公司  
税号：91330226MA281NPW74  
地址：宁波市宁海县桥头胡工业园区兴和东路26号  
电话：13906603553  
开户行：宁波宁海农村商业银行桥头胡支行  
账号：201000152311962

第2页共4页

地址：宁波石化经济技术开发区（渐浦）巴子山路1号  
电话：0574-86504001 传真：0574-86504002

乙方：户名：宁波大地化工环保有限公司固体废物集中处置费代征专户  
帐号：81014601302178136  
开户行：宁波鄞州农村商业银行城西支行  
行号：402332010463

15. 甲方需及时在全国固体废物和化学品管理信息系统统一登录门户进行企业信息注册、完成管理计划申报等工作，完成后及时以传真或邮件形式通知乙方。全国固体废物和化学品管理信息系统统一登录门户网址：<https://gfmh.meesc.cn/solidPortal/#/>
16. 若因甲方未及时处理上述手续或未及时通知乙方，导致相关审批、转移手续无法完成，所产生的责任、费用全部由甲方承担。
17. 如果甲方未按双方协议约定如期支付处置费，乙方有权暂停甲方废物收集，直至费用付清为止。
18. 在乙方焚烧炉检修期间，乙方不保证及时收集甲方的废物。
19. 本协议有效期自2021年11月17日至2022年12月31日止。
20. 协议期内如因法令变更、许可证变更、主管机关要求、或其它不可抗力等原因，导致乙方无法收集或处置某类废物时，乙方可停止该类废物的收集和处置业务，并且不承担由此带来的一切责任。
21. 本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
22. 本协议经双方签字盖章后生效。

甲方：宁海县兴得包装有限公司

代表：

年

月

日

电话：13906603553

乙方：宁波大地化工环保有限公司

代表：

年

月

日

电话：0574-86504001

第3页共4页

地址：宁波石化经济技术开发区（潮涌）巴子山路1号  
电话：0574-86504001 传真：0574-86504002

## 附：委托处置废物明细表

产废单位		宁海县兴得包装有限公司		协议编号: KH202111112-N-Y		协议有效期		2021年11月17日至2022年12月31日止	
编号	废物名称	废物代码	产生量 (吨/年)	废物产生工艺	主要有害成分	包装方式	处置单价 (含增值税)		
1	废塑料桶	900-041-49	0.5	原料使用产生	报废原料	编织袋	3860元/吨		
2	废活性炭	900-041-49	0.5	废气吸附产生	有机物等	编织袋	4560元/吨		
3	废抹布	900-041-49	0.1	设备保养产生	废油	编织袋	3860元/吨		
4	洗版废液	231-002-16	0.1	机械加工产生	废水	小桶	4560元/吨		
5	废洗车水	900-007-09	0.1	机械加工产生	废水	小桶	4560元/吨		

运输费：1600元/车次（含增值税）。若乙方应甲方要求专程送包装容器给甲方，甲方需按本条款规定的运输费标准另行支付乙方运输费。

备注：双方协议签订时，甲方当即支付年处置费（包含手续费、废物检测等费用）人民币叁仟元整（¥3000.00）（包含运输壹车次，超出部分按协议计算。危险废物转移须在协议有效期内完成，年处置费仅在协议有效期内有效。协议到期后，未使用完部分不续用，不退还）。

危险废物仓库



附件 6. 宁海县兴得包装有限公司生产设备图



印刷机

## 第二部分 宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目竣工环境保护验收意见

### 宁海县兴得包装有限公司 年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生 产项目竣工环境保护验收意见

2021 年 11 月 18 日，宁海县兴得包装有限公司根据《年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

#### 一、工程建设基本情况

##### （一）建设地点、规模、主要建设内容

宁海县兴得包装有限公司位于宁波市宁海县桥头胡工业区久安南路 5-1—5-25 号，建筑面积约 2136.6m<sup>2</sup>。主要有四色印刷机 1 台、移印机 1 台、晒版机 1 台等生产设备，项目建成后实现年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器的生产规模。项目实际建设地点、建设内容与环评批复基本一致。

##### （二）建设过程及环保审批情况

企业于 2020 年 10 月委托宁波奇英环保技术咨询有限公司编制了《宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目环境影响报告表》；宁波市生态环境局以“甬环宁建（2020）305 号”文件对该项目予以批复。本项目于 2020 年 11 月开工建设，环保设施于 2021 年 6 月竣工，并于 2021 年 6 月至 11 月进行调试。

##### （三）投资情况

本项目实际总投资约 500 万元，其中环保投资约 10 万元，占投资总额的 2%。

##### （四）验收范围

本次验收的范围为宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目，为项目整体验收。

#### 二、工程变动情况

经现场核查，项目实际建设内容、生产规模、生产工艺、污染防治措施与环评批复基本一致，本项目无重大变动情况。

#### 三、环境保护设施建设情况

#### (一) 废水

主要为生活污水。

本项目制版过程中产生少量洗版废液，收集后委托宁波大地环工环保有限公司处置；生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终至宁海县城北污水处理厂处理。

#### (二) 废气

主要为印刷废气、移印油墨废气、胶水废气。

本项目印刷废气经集气罩顶吸+车间整体密闭收集后通过二级活性炭装置处理后通过 15 米高排气筒排放。

本项目移印油墨废气经车间机械通风排放。

本项目胶水废气经车间机械通风排放。

#### (三) 噪声

项目的噪声源主要来源于印刷机、切纸机等设备运行时产生的机械噪声。项目采用合理布局，选用低噪声设备，安装减震垫等措施进行降噪。

#### (四) 固体废物

本项目纸板边角料、一般废包装材料、金属固废由资源回收公司回收利用；废活性炭、废包装桶、废橡皮布、洗版废液、废洗车水委托宁波大地环工环保有限公司处置；生活垃圾环卫部门定期清运。

#### (五) 总量控制

本项目根据检测结果和实际生产工况核算，项目废气 VOC<sub>s</sub> 排放总量未超过环评批复中要求控制值，符合总量控制要求。

### 四、环境保护设施调试效果

#### (一) 污染物排放情况

##### 1. 废水

监测期间（2021 年 10 月 30 日~10 月 31 日），本项目生活污水排放口污染物 pH 值（范围）、悬浮物、化学需氧量、动植物油排放浓度最大日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷排放浓度最大日均值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）B 级标准。

##### 2. 废气

监测期间（2021年10月30日~10月31日），本项目印刷废气排放口污染物非甲烷总烃排放最大值符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源二级标准。

监测期间（2021年10月30日~10月31日），本项目厂界无组织废气污染物中非甲烷总烃排放浓度最大值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放浓度最大值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”中的监控点处1h平均浓度值。

### 3.厂界噪声

监测期间（2021年10月30日~10月31日），本项目厂界噪声昼间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

## 五、工程建设对环境的影响

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环境保护设施均能正常运行。项目竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准；项目落实了各类固废的分类处置途径，实现了固废的无害化处置；项目污染治理措施及排放落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

## 六、验收结论

本项目环保手续基本完备，已取得排污登记许可（登记号：91330226MA281NPW74001Y）。经现场查验，宁海县兴得包装有限公司年产800万张彩卡、1200万个彩盒、50万个摇窗器生产项目履行了环境影响评价制度，项目建设过程中执行了环境保护“三同时”制度，总体落实了环评报告表及其批复提出的各项环境保护措施，满足竣工环境保护验收条件，经审议验收组结论：项目整体竣工环境保护验收合格。

## 七、后续要求

1、严格遵守环保法律法规，完善各项环境保护管理和监测制度，强化从事环保工作人员业务培训，重点加强对废气治理设施的维护、管理及正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》相关要求，完善验收监测报告内容。完善竣工环保验收的相关手续，按规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

八、验收组成员信息表

参会人员名单				
	姓名	单位	身份证号码	电话
组长	胡如凡	宁海县兴得包装有限公司	33022619711123	1887399
专家成员	王可勤	宁波市东钱湖旅游度假区	33022619711123	1887399
其他成员	陈丹华	宁波市东钱湖旅游度假区	33022619711123	1887399

宁海县兴得包装有限公司  
 2021年 11月 18日  


### 第三部分 宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目其他需要说明的事项

#### 1. 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

##### 1.1 设计简况

建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

##### 1.2 施工简况

环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

##### 1.3 验收过程简况

宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目环保设施于 2021 年 6 月竣工。宁海县兴得包装有限公司委托宁波市甬蓝检测有限公司对宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目进行验收监测工作。按照检测委托合同，宁波市甬蓝检测有限公司提供废水、废气、噪声项目的监测服务。2021 年 11 月，宁波市甬蓝检测有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》以及宁波市甬蓝检测有限公司出具

“YLE20210722”检测报告，编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告；2021 年 11 月 18 日，宁海县兴得包装有限公司组织成立本项目竣工环境保护验收工作组，验收工作组踏勘企业生产现场后，经认真讨论和审查，形成了如下验收意见：经现场查验，《宁海县兴得包装有限公司年产 800 万张彩卡、1200 万个彩盒、50 万个摇窗器生产项目》环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，项目建设内容与项目环境影响报告表、及其批复基本一致，已落实了环保“三同时”和环境影响报告表及批复的各项环保要求，竣工环保验收条件基本具备。验

收资料完整齐全，污染物达标排放、环保设施有效运行、验收监测结论明确合理。  
验收工作组结论：该项目竣工环境保护验收合格。

## 2. 其他环境保护措施的实施情况

### 2.1 制度措施落实情况

#### (1) 环保组织机构及规章制度

本建设项目运营期污染物为废水、废气、一般固废、危险固废、生活垃圾，企业已设有环保组织机构，完善环境管理台账记录。

#### (2) 环境风险防范措施

本建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定未要求制定环境风险应急预案，因此本项目未制定环境风险应急预案。

#### (3) 环境监测计划

本建设项目环境影响报告表已制定环境监测计划。

### 2.2 配套措施落实情况

#### (1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施，无需说明。

## 3. 整改工作意见

根据验收意见，本建设项目竣工验收合格，各项环保设施已基本落实到位，无相应整改。

宁海县兴得包装有限公司

2021年11月18日
