



宁海县文丰轴承有限公司
年产 1000 万个小微轴承建设项目
竣工环境保护验收报告

建设单位:宁海县文丰轴承有限公司

二〇二一年一月

建设单位法定代表人:***

编制单位法定代表人:***

项目负责人:***

填表人:***

建设单位: 宁海县文丰轴承有限公司

电话: 159****0292

邮编: 315600

地址: 宁海县大佳何镇望海路 9 号

编制单位: 宁波市甬蓝检测有限公司

电话: 0574-65358650

邮编: 315600

地址: 宁海县桃源街道堤树路 9 号

目 录

第一部分 宁海县文丰轴承有限公司年产 1000 万个小微轴承建设项目竣工环境保护验收监测报告表.....	1
表一 项目基本情况.....	1
表二 工程建设内容.....	4
表三 主要污染源、污染物处理和排放流程.....	9
表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定.....	11
表五 验收监测质量保证及质量控制.....	14
表六 验收监测内容.....	15
表七 生产工况及验收监测结果.....	16
表八 验收监测结论及建议.....	20
附件 1.宁海县文丰轴承有限公司环评批复“甬环宁建（2020）335 号” ..	22
附件 2.宁海县文丰轴承有限公司监测期间生产工况.....	25
附件 3.宁海县文丰轴承有限公司检测报告.....	26
附件 4.宁海县文丰轴承有限公司监测方案.....	32
附件 5.宁海县文丰轴承有限公司危废处置协议与危废仓库图.....	33
第二部分 宁海县文丰轴承有限公司年产 1000 万个小微轴承建设项目竣工环境保护验收意见.....	38
第三部分 宁海县文丰轴承有限公司年产 1000 万个小微轴承建设项目其他需要说明的事项.....	42

第一部分 宁海县文丰轴承有限公司年产 1000 万个小微轴承建设项目竣工环境保护验收监测报告表

表一 项目基本情况

建设项目名称	年产 1000 万个小微轴承建设项目				
建设单位名称	宁海县文丰轴承有限公司				
建设项目性质	新建√ 改扩建 技改 迁建				
建设地点	宁海县大佳何镇望海路 9 号				
主要产品名称	小微轴承				
设计生产能力	年产 1000 万个小微轴承				
实际生产能力	年产 1000 万个小微轴承				
建设项目环评时间	2020.11	开工建设时间	2020.12		
调试时间	2020.12	验收现场监测时间	2020.12.24-2020.12.25		
环评报告表审批部门	宁波市生态环境局	环评报告表编制单位	宁波奇英环保技术咨询有限公司		
环保设施设计单位	-	环保设施施工单位	-		
投资总概算	500 万元	环保投资总概算	4 万元	比例	0.8%
实际总概算	500 万元	环保投资	4 万元	比例	0.8%
验收监测依据	<p>1、国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》；</p> <p>2、国家生态环境部 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告 2018 年 第 9 号）；</p> <p>3、浙江省人民政府令第 364 号《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》；</p> <p>4、浙江省环境保护厅办公室《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发〔2009〕76 号）；</p> <p>5、国环规环评〔2017〕4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；</p> <p>6、宁波奇英环保技术咨询有限公司《宁海县文丰轴承有限公司年产 1000 万个小微轴承建设项目环境影响报告表》；</p> <p>7、宁波市生态环境局《关于<宁海县文丰轴承有限公司年产 1000 万个小微轴承建设项目环境影响报告表>的审批意见》（甬环宁建〔2020〕335 号）；</p> <p>8、宁海县文丰轴承有限公司年产 1000 万个小微轴承建设项目验收监测方案。</p>				

验收监测评价
标准、标号、
级别、限值

1、废水

本项目废水为生活污水。清洗废水通过厂内循环系统套用于磨床工艺，磨加工用水大部分在工艺过程中蒸发，少部分随磨屑蒸发损耗，亚硝酸钠浸渍废水定期添加补充，不排放；生活污水经化粪池预处理后纳入大佳何泵站提升至宁海县城北污水处理厂处理。生活污水排放口污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，其中氨氮、总磷排放均执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准。具体详见表 1-1。

表 1-1 污水污染物排放标准 （单位：mg/L，pH 值无量纲）

污染物		pH 值	悬浮物	化学需氧量	氨氮	总磷	动植物油
废水排放标准	GB 8978-1996	6-9	400	500	-	-	100
	GB/T 31962-2015	-	-	-	45	8	-

2、废气

本项目废气为油品挥发废气。油品挥发废气通过车间机械通风排放。厂界无组织废气污染物非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值，厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCs 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值。具体详见表 1-2~3。

表 1-2 废气污染物排放标准

污染物	排放标准	无组织排放监控浓度限值（mg/m ³ ）
非甲烷总烃	GB 16297-1996	4.0

表 1-3 废气污染物排放标准

污染物	排放标准	厂区内 VOCs 无组织特别排放限值（mg/m ³ ）
非甲烷总烃	GB 37822-2019	6（监控点处 1h 平均浓度值）

3、噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 3 类标准。具体详见表 1-4。

表 1-4 厂界噪声执行标准

监测对象	项目	单位	限值	引用标准
厂界噪声	等效 A 声级	dB(A)	65（昼间）	（GB 12348-2008） 3 类标准

4、固废

本项目产生的固体废弃物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发〔2009〕76号）中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）；一般工业固体废物执行《宁波市一般工业固体废物污染防治管理办法（试行）》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其相应标准修改单中规定。

表二 工程建设内容

1、项目基本情况

宁海县文丰轴承有限公司位于宁海县大佳何镇望海路9号，厂区建筑面积约为3200平方米。项目总投资500万元，主要生产轴承，其主要原材料为毛坯件和钢珠，主要工艺为下料、机械加工、精加工、合套、清洗、注油、压盖和包装等，建设完成后形成年产1000万个小微轴承的生产能力。

企业于2020年11月委托宁波奇英环技术咨询有限公司编制完成《宁海县文丰轴承有限公司年产1000万个小微轴承建设项目建设项目环境影响报告表》；2020年12月8日，宁波市生态环境局以甬环宁建〔2020〕335号文件对该项目予以批复。

目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

2、地理位置

宁海县东邻象山县，南接三门县，西界天台、新昌，北毗奉化，地理位置优越。象山港横贯东北，三门湾瀛环于东南，海岸线长达176km²，港区开阔，水深浪静，不淤不冻。象山港插入县境内，全县拥有沿海码头4座，航运通达国内各沿海港口及长江中下游城市。34省道（甬临线）、38省道（象西线）和74省道（盛宁线）贯穿境内，甬台温高速公路和甬台温铁路由北向南穿过宁海县，交通便利，离杭州261km，南距临海76km，温州282km。

宁海县文丰轴承有限公司位于宁海县大佳何镇望海路9号。项目东侧为宁波杰升电气有限公司；南侧为逸达电器；西侧为宁海县坚胜轴承厂；北侧为小路，隔路为宁波科强电池有限公司。厂区平面图详见图2-1，地理位置图详见图2-2。

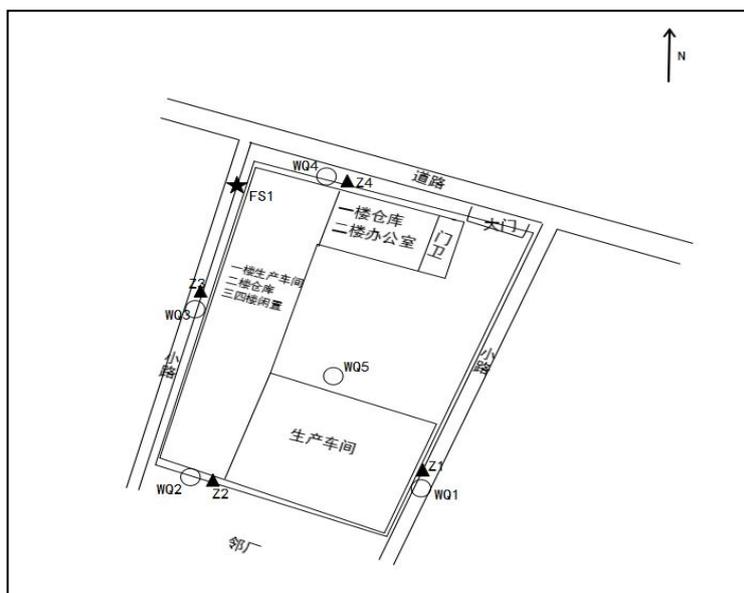


图 2-1 项目厂区平面图



图 2-2 项目地理位置图

3、建设内容和规模

本项目利用自有位于宁海县大佳何镇望海路9号的空置厂房作为生产用房，建筑面积约3200m²，建成后形成年产1000万个小微轴承的生产规模。项目生产内容与规模详见表2-1。

表 2-1 项目生产内容与规模

产品名称	年产量	年运行时数
小微轴承	1000 万个	2400h

4、主要生产设备详见表 2-2，主要原辅材详见表 2-3。

表 2-2 主要生产设备一览表

序号	设备名称	环评审批数量	实际设备数量	备注
1	自动车床	18 台	18 台	-
2	仪表车床	4 台	4 台	-
3	平面磨	2 台	2 台	-
4	无心磨	3 台	3 台	-
5	143 自动磨床	10 台	8 台	-
6	131 自动磨床	8 台	8 台	-
7	201 自动磨床	3 台	3 台	-
8	自动超精车	18 台	18 台	-
9	合套机	8 台	7 台	-
10	小清洗机	1 台	1 台	-
11	大清洗机	1 台	1 台	-
12	挑洗机	2 台	2 台	-
13	压盖机	4 台	4 台	-
14	注油机	4 台	4 台	-
15	砂轮机	2 台	2 台	-
16	退磁机	1 台	1 台	-
17	沉淀池	1 个	1 个	-

表 2-3 主要原辅材料消耗

序号	原辅材料名称	环评中年消耗量	实际年总消耗量	备注
1	毛坯件	1000 万套/年	1000 万套/年	-
2	刚珠	14 吨/年	14 吨/年	-

续表 2-3 主要原辅材料消耗

序号	原辅材料名称	环评中年消耗量	实际年总消耗量	备注
3	液压油	1.7 吨/年	1.7 吨/年	-
4	白油	1.7 吨/年	1.7 吨/年	-
5	无味煤油	5.1 吨/年	5.1 吨/年	-
6	润滑油脂	1.36 吨/年	1.36 吨/年	-
7	防锈清洗剂	0.8 吨/年	0.8 吨/年	-
8	亚硝酸钠	0.3 吨/年	0.3 吨/年	-
9	小砂轮	1 万片/年	1 万片/年	-
10	大砂轮	60 片/年	60 片/年	-

5、主要生产流程图详见图 2-3~5。

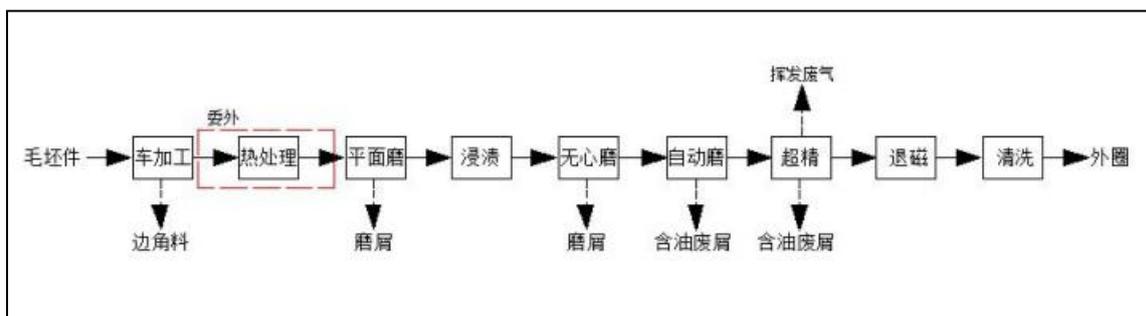


图 2-3 外圈加工工艺流程图

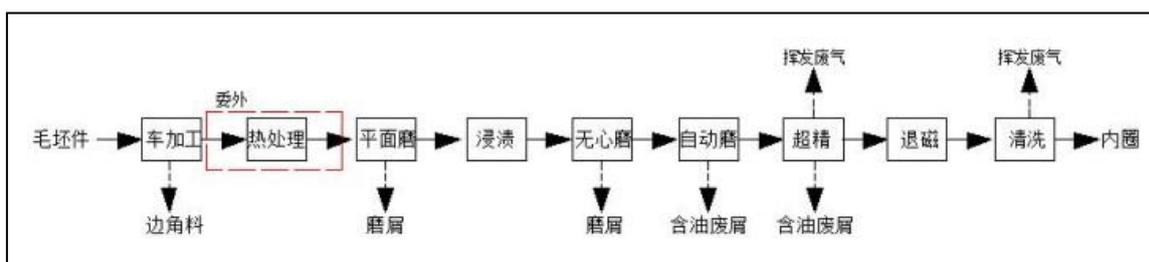


图 2-4 内圈加工工艺流程图




图 2-5 组合工艺流程图

工艺说明：

1) 外圈加工

①车加工、平面磨、浸渍、无心磨：外购的毛坯件，在厂区内车加工处理，处理后的外圈，

委外热处理，之后在厂区通过平面磨，之后在亚硝酸钠溶液中浸渍处理，再用无心磨床进行加工，磨床使用水进行冷却，此过程会产生磨屑，其部分是工件掉落的金属颗粒物以及部分砂轮打磨产生的废砂轮灰。

②自动磨：再使用自动磨床（外圈）进行磨沟，自动磨床使用白油作为润滑和冷却，会产生废白油及含油磨屑。

③超精：加工后使用自动超精车（外圈）进一步精加工，此过程使用无味煤油作为润滑剂和冷却剂，超精的主要作用是提高产品的亮度，此过程会产生有机废气和含油废屑，其主要成分是砂轮灰和金属颗粒物。

④退磁：将轴承剩磁降低到规定的残磁技术要求范围内。

⑤外圈清洗：外圈清洗采用防锈清洗剂兑水作为介质，使用挑洗机进行清洗。

2) 内圈加工

①车加工、平面磨、无心磨、自动磨、超精、退磁：外购的冷镦料首先使用自动车床进行加工，之后委外热处理，热处理后的工件再通过磨床、无心磨及自动磨床（内圈）进行加工；加工后使用自动超精车（内圈）进一步精加工，精加工后进行退磁处理。（其工艺与外圈加工工艺类似，故不再描述）

②内圈清洗：内圈清洗使用小清洗机，采用无味煤油作为介质，清洗后常温沥干，无味煤油循环使用，定期简单沉淀处理后可用于超精工艺。

3) 组装

内圈和外圈加工后，和钢珠进行合套，合套后使用防锈清洗剂兑水进行清洗，其中部分产品使用挑洗机初洗，部分产品直接使用大清洗机精洗，精洗烘干水分后使用注油机进行注油，通过密封细管将固态润滑油脂注入轴承内，后进行压盖包装即为成品。

6、主要产污环节

(1) 废水：主要为生活污水。

(2) 废气：主要为油品挥发废气。

(3) 噪声：主要来自自动车床、无心磨等设备生产运行时产生的噪声。

(4) 固废：主要为含油废屑、废白油、废煤油、边角料、磨屑、一般包装材料、废砂轮、生活垃圾。

7、项目变动情况

本项目实际建设内容、生产规模、生产工艺、污染防治措施与环评批复基本一致，无重大变动情况。

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

1、废水

本项目废水为生活污水。清洗废水通过厂内循环系统套用于磨床工艺，磨加工用水大部分在工艺过程中蒸发，少部分随磨屑蒸发损耗，亚硝酸钠浸渍废水定期添加补充，不排放；生活污水经化粪池预处理后纳入大佳何泵站提升至宁海县城北污水处理厂处理。废水来源及处理方式见表 3-1，废水处理工艺流程详见图 3-1。

表 3-1 废水来源及处理方式一览表

污水来源	污染物	排放方式	处理设施	排放去向
生活污水	pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油	间歇	化粪池	纳管




图 3-1 废水处理工艺流程图

2、废气

本项目废气主要为油品挥发废气。油品挥发废气通过车间机械通风排放。废气来源及处理方式见表 3-2。

表 3-2 废气产生情况汇总

废气来源	废气污染物	排放方式	处理设施	排放去向
油品挥发废气	非甲烷总烃	间歇	-	大气

3、噪声

本项目噪声主要来自自动车床、无心磨等生产设备生产运行时产生的噪声，通过关闭门窗、选用低噪声设备、安装减震垫等方式来达到减震降噪效果。

4、固体废物

本项目的固体废物主要来源产生情况见表 3-3。

表 3-3 固体废弃物产生及排放情况

序号	种类 (名称)	产生工序	属性	实际全年 产生量 (吨/年)	实际情况
					利用处置方式及去向
1	含油废屑	自动磨、超精	危险固废	3.0	委托宁波大地环工环保有限公司处置
2	废白油	自动磨	危险固废	0.5	
3	废煤油	超精	危险固废	0.388	
4	边角料	下料、车加工	一般固废	2.0	由资源回收公司回收利用
5	磨屑	平面磨、无心磨	一般固废	5.0	

续表 3-3 固体废弃物产生及排放情况

序号	种类 (名称)	产生工序	属性	实际全年 产生量 (吨/年)	实际情况
					利用处置方式及去向
6	一般包装材料	原料包装	一般固废	0.5	由资源回收公司回收利用
7	废砂轮	打磨	一般固废	0.04	
8	生活垃圾	员工生活	一般固废	3.75	委托环卫部门统一清运

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1、建设项目环境影响报告表

废水：生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经大佳何泵站提升送至宁海县城北污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。

废气：油品（白油、煤油）挥发废气产量较少，车间内无组织排放，加强车间通排风。

固废：含油废屑、废白油、废煤油委托具备相应危废资质的公司处置；边角料、磨屑、一般包装材料、废砂轮由资源回收公司回收利用；生活垃圾委托环卫部门清运。

噪声：企业在选购设备时，应优先考虑低耗、低噪声设备；合理布局各机械设备，高噪声设备摆放尽量往车间中央靠；在布置设备时，在设备底部安装减震垫；定期做好设备维护，使设备处于良好的运行状态。

2、关于《宁海县文丰轴承有限公司年产 1000 万个小微轴承建设项目》的审批意见 甬环宁建〔2020〕335 号

根据你单位委托宁波奇英环保技术咨询有限公司编制的《环评报告表》结论，以及该项目环评行政许可公示情况，在项目符合产业政策、产业发展规划，选址符合主体功能区规划、城乡规划、土地利用总体规划等前提下，原则同意项目《环评报告表》结论。《环评报告表》经审批后可作为该项目日常运行管理的环境保护依据。

该项目选址在宁海县大佳何镇望海路 9 号，总投资 500 万元，其中环保投资 4 万元，建筑面积 3200 平方米。项目建成后，产能为年产 1000 万个小微轴承。

该项目油品挥发废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 新污染源无组织排放监控浓度限值，厂区内挥发性有机物无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。

厂区需落实雨污分流，厂区内初期雨水收集后须达标后纳管排放；清洗废水经处理回用于平面磨、无心磨工序，不得外排；生产车间合理划分干湿区，地面做好硬化防渗措施；生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后纳管，由宁海县城北污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。

废白油、含油磨屑、废煤油等属于危险废物，危险废物暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求落实防腐、防渗、防雨等措施，并按《危险废物转移联单管理办法》送有资质单位处置；一般固废按资源化、无害化处置。

加强内部管理，合理布局厂房，选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，若项目的性质、规模、地点、采

用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按规定开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入生产。

3、本项目三同时落实情况

环评批复及审批意见及实际落实情况详见表 4-1：

表 4-1 环评批复及实际情况对照表

环评批复情况	实际落实情况
<p>该项目选址在宁海县大佳何镇望海路 9 号，总投资 500 万元，其中环保投资 4 万元，建筑面积 3200 平方米。项目建成后，产能为年产 1000 万个小微轴承。</p>	<p>宁海县文丰轴承有限公司位于宁海县大佳何镇望海路 9 号，厂区建筑面积约为 3200 平方米。项目总投资 500 万元，主要生产轴承，建设完成后形成年产 1000 万个小微轴承的生产能力。</p>
<p>该项目油品挥发废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 新污染源无组织排放监控浓度限值，厂区内挥发性有机物无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别排放限值。</p>	<p>本项目废气为油品挥发废气。油品挥发废气通过车间通风排放。验收监测期间，厂界无组织废气污染物非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值，厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录 A 表 A.1 “厂区内 VOC_s 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值。</p>
<p>厂区需落实雨污分流，厂区内初期雨水收集后须达标后纳管排放；清洗废水经处理回用于平面磨、无心磨工序，不得外排；生产车间合理划分干湿区，地面做好硬化防渗措施；生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的三级标准后纳管，由宁海县城北污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排放。</p>	<p>本项目废水为生活污水。清洗废水通过厂内循环系统套用于磨床工艺，磨加工用水大部分在工艺过程中蒸发，少部分随磨屑蒸发损耗，亚硝酸钠浸渍废水定期添加补充，不排放；生活污水经化粪池预处理后纳入大佳何泵站提升至宁海县城北污水处理厂处理。验收监测期间，生活污水排放口污染物排放符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 三级标准，其中氨氮、总磷排放均符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准。</p>

续表 4-1 环评批复及实际情况对照表

环评批复情况	实际落实情况
<p>加强内部管理，合理布局厂房，选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。</p>	<p>验收监测期间，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）3类标准。</p>
<p>废白油、含油磨屑、废煤油等属于危险废物，危险废物暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求落实防腐、防渗、防雨等措施，并按《危险废物转移联单管理办法》送有资质单位处置；一般固废按资源化、无害化处置。</p>	<p>本项目含油废屑、废白油、废煤油委托宁波大地化工环保有限公司处置；边角料、磨屑、一般包装材料、废砂轮由资源回收公司回收利用；生活垃圾委托环卫部门清运。</p>
<p>根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。</p>	<p>项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施未发生重大变化。</p>

表五 验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析方法

表 5-1 监测分析方法一览表

类别	项目名称	方法依据
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986
	悬浮物	水质 悬浮物测定 重量法 GB/T 11901-1989
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

2、质量控制与质量保证

(1) 环保设施竣工验收现场监测，按规定满足相应的工况条件，否则负责验收监测的单位立即停止现场采样和测试。

(2) 现场采样和测试严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因予以详细说明。

(3) 环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

(4) 环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。

(5) 参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

(6) 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进现场前对气体分析、采样器流量计等进行校核。

(7) 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期的声级计。

(8) 验收监测的采样记录及分析测试结果，按照国家标准和技术规范有关要求进行处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

表六 验收监测内容

1、废水

项目废水监测内容及频次见表 6-1。

表 6-1 废水监测内容及频次

监测点位	污染物名称	监测频次
生活污水排放口	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油	4 次/天，共 2 天

2、废气

无组织废气监测内容频次详见表 6-2。

表 6-2 无组织废气监测内容及频次

废气名称	监测点位	监测因子	监测频次
油品挥发废气	企业厂界四周各设置 1 个监测点位	非甲烷总烃	3 次/天，共 2 天
油品挥发废气	厂区内车间外设置 1 个监测点位	非甲烷总烃	3 次/天，共 2 天


3、厂界噪声监测

在厂界布设 4 个监测点位，在厂界围墙外 1 米处，传声器位置高于墙体并指向声源处，监测 2 天，昼间 1 次。噪声监测内容见表 6-3。

表 6-3 监测内容及监测频次

污染物名称	监测点位	监测频次
厂界噪声	厂界四周各设 1 个监测点位	昼间 1 次，共 2 天

4、监测点位布置图

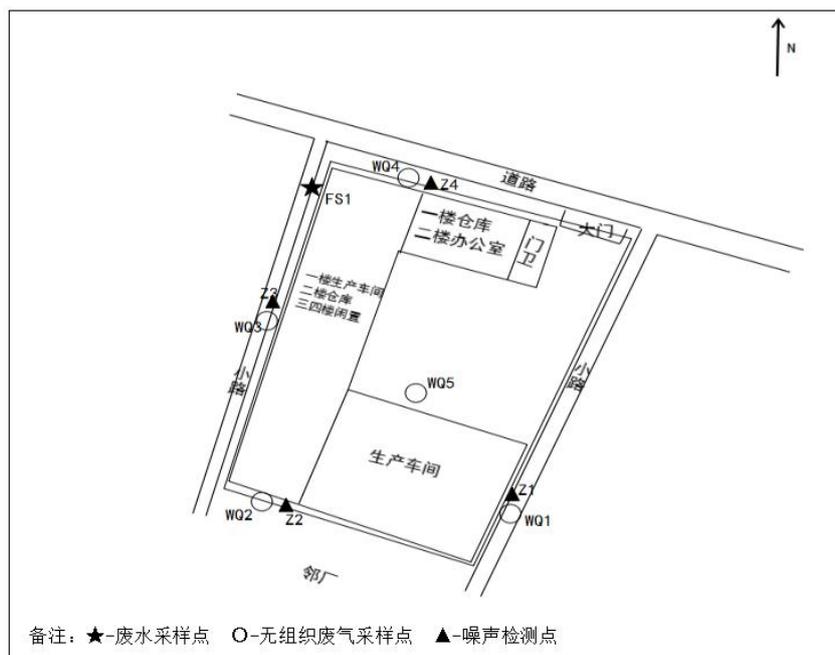

表七 生产工况及验收监测结果

1、生产工况

验收监测期间，依据建设项目相应产品在监测期间实际产量的工况记录方法，宁海县文丰轴承有限公司年产 1000 万个小微轴承建设项目的实际运行工况正常，且各项环保设施运行正常，具体生产工况情况如表 7-1 所示。

表 7-1 建设项目生产工况情况表

序号	产品名称	监测期间产量				设计年产量
		2020.12.24		2020.12.25		
		产量	负荷	产量	负荷	
1	小微轴承	3 万个	90.0%	2.9 万个	87.0%	1000 万个

注：日设计产量等于全年设计产量除以全年工作天数，年工作时间 300 天。

验收监测结果：

2、废水监测

验收监测期间，本项目生活污水排放口污染物 pH 值（范围）、悬浮物、化学需氧量、动植物油排放浓度最大日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷排放浓度最大日均值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准。具体监测结果见表 7-2。

表 7-2 生活污水监测结果（单位：除 pH 值无量纲，其余为 mg/L）

监测点位	监测日期	监测频次	监测项目					
			pH 值	悬浮物	化学需氧量	氨氮	总磷	动植物油
生活污水排放口 FS1	2020.12.24	1	7.18	172	324	5.52	6.18	9.34
		2	7.27	160	348	5.00	5.47	9.51
		3	7.64	102	360	4.98	6.38	9.27
		4	7.50	120	345	5.00	6.10	9.25
	日均值（范围）		7.18~7.64	138	344	5.12	6.03	9.34
	2020.12.25	1	7.15	124	319	5.38	6.04	9.31
		2	7.24	136	318	4.90	5.54	9.49
		3	7.60	124	327	4.96	6.43	9.25
		4	7.52	184	307	5.15	6.07	9.21
	日均值（范围）		7.15~7.60	142	318	5.10	6.02	9.32
	最大日均值（范围）		7.15~7.64	142	344	5.12	6.03	9.34
	标准限值		6~9	400	500	45	8	100
	是否符合		符合	符合	符合	符合	符合	符合

执行标准：《污水排放综合标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，其中氨氮、总磷均执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准。

3、废气监测

3.1 无组织废气监测

验收监测期间，厂界无组织废气污染物中非甲烷总烃排放浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值，厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放浓度最大值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOC_S 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值，具体监测结果见表 7-3~4，监测期间气象参数见表 7-5。

表 7-3 无组织废气监测结果

监测点位	监测日期	监测频次	监测结果
			非甲烷总烃（mg/m ³ ）
厂界东侧 WQ1	2020.12.24	1	0.78
		2	0.83
		3	0.94
	2020.12.25	1	0.74
		2	0.89
		3	0.82
厂界南侧 WQ2	2020.12.24	1	0.82
		2	0.83
		3	0.95
	2020.12.25	1	0.86
		2	0.84
		3	0.98
厂界西侧 WQ3	2020.12.24	1	0.85
		2	0.80
		3	0.76
	2020.12.25	1	0.80
		2	0.73
		3	0.80
厂界北侧 WQ4	2020.12.24	1	0.93
		2	0.87
		3	0.95
	2020.12.25	1	0.77
		2	0.74
		3	0.85
最大值			0.98
标准限值			4.0
是否符合			符合
执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。			

表 7-4 无组织废气监测结果

监测点位	监测日期	监测频次	监测结果 (mg/m ³)
			非甲烷总烃
厂区内车间外 WQ5	2020.12.24	1	1.52
		2	1.63
		3	1.66
	2020.12.25	1	1.54
		2	1.59
		3	1.49
最大值			1.66
标准限值			6
是否符合			符合
执行标准：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOC _S 无组织排放限值” 中的监控点处 1h 平均浓度值。			

表 7-5 监测期间气象参数

日期	频次	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气情况
2020.12.24	1	10.5	102.2	1.6	西北	晴
	2	13.7	102.0	1.4	北	晴
	3	12.6	102.1	1.7	北	晴
2020.12.25	1	7.3	102.8	1.5	西北	晴
	2	11.8	102.5	1.2	东北	晴
	3	9.4	102.7	1.8	东北	晴

4、噪声

验收监测期间，本项目厂界四周昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准，具体监测结果见表 7-6。

表 7-6 厂界噪声监测结果

监测日期	监测点位	昼间 Leq dB (A)	
		测量时间	测量结果
2020.12.24	厂界东侧 Z1	08:41-08:42	60.5
	厂界南侧 Z2	08:46-08:47	63.4
	厂界西侧 Z3	08:52-08:53	60.1
	厂界北侧 Z4	08:57-08:58	54.7
监测时气象条件		天气晴，风速≤5m/s	

续表 7-6 厂界噪声监测结果

监测日期	监测点位	昼间 Leq dB (A)	
		测量时间	测量结果
2020.12.25	厂界东侧 Z1	08:49-08:50	60.2
	厂界南侧 Z2	08:55-08:56	62.1
	厂界西侧 Z3	09:00-09:01	59.1
	厂界北侧 Z4	09:06-09:07	55.2
监测时气象条件		天气阴, 风速≤5m/s	
标准限值		65 dB (A)	
执行标准: 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类标准。			

注: 表 7-2~6 中监测数据引自检测报告 (YLE20200580)。

5、总量控制要求

本项目批复中无总量控制要求。

表八 验收监测结论及建议

1、结论

(1) 废水监测结果及达标排放情况

验收监测期间，本项目生活污水排放口污染物 pH 值（范围）、悬浮物、化学需氧量、动植物油排放浓度最大日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷排放浓度最大日均值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准。

(2) 废气监测结果及达标排放情况

验收监测期间，厂界无组织废气污染物非甲烷总烃排放浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值，厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放浓度最大值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCs 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值。

(3) 厂界噪声监测结果及达标排放情况

验收监测期间，本项目厂界四周昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。

(4) 固体废物排放情况

本项目含油废屑、废白油、废煤油委托宁波大地化工环保有限公司处置；边角料、磨屑、一般包装材料、废砂轮由资源回收公司回收利用；生活垃圾委托环卫部门清运。

2、总结论

综上所述，宁海县文丰轴承有限公司年产 1000 万个小微轴承建设项目在建设中严格执行竣工环保“三同时”制度，验收资料齐全，环保污染防治措施基本落实，监测报告中各项污染物指标均达到相应的排放标准及相关环境标准，符合竣工环境保护验收的相关要求。

3、建议

加强车间管理，减少无组织废气的排放。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	宁海县文丰轴承有限公司年产 1000 万个小微轴承建设项目				项目代码	-			建设地点	宁海县大佳何镇望海路 9 号		
	行业类别（分类管理名录）	C3452 滑动轴承制造				建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造						
	设计生产能力	年产 1000 万个小微轴承				实际生产能力	同设计能力			环评单位	宁波奇英环保技术咨询有限公司		
	环评文件审批机关	宁波市生态环境局				审批文号	甬环宁建〔2020〕335 号			环评文件类型	报告表		
	开工日期	2020.12				竣工日期	2020.12			排污许可证申领时间	-		
	环保设施设计单位	-				环保设施施工单位	-			本工程排污许可证编号	-		
	验收单位	宁海县文丰轴承有限公司				环保设施监测单位	宁波市甬蓝检测有限公司			验收监测时工况	正常		
	投资总概算（万元）	500				环保投资总概算（万元）	4			所占比例（%）	0.8		
	实际总投资（万元）	500				实际环保投资（万元）	4			所占比例（%）	0.8		
	废水治理（万元）	1	废气治理（万元）	1	噪声治理（万元）	1	固体废物治理（万元）	1		绿化及生态（万元）	0	其他（万元）	0
新增废水处理设施能力	-				新增废气处理设施能力	-			年平均工作时	2400h			
运营单位	宁海县文丰轴承有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）	-			验收时间	2021.01			
污染物排放与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
	废水												
	化学需氧量												
	氨氮												
	石油类												
	废气												
	二氧化硫												
	烟尘												
	工业粉尘												
	氮氧化物												
	工业固体废物												
	与项目有关的其他特征污染物												

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9) = (4)-(5)-(8)-(11) + (1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

宁波市生态环境局文件

甬环宁建（2020）335 号

关于《宁海县文丰轴承有限公司年产 1000 万个小微轴承建设项目环境 影响报告表》的审批意见

宁海县文丰轴承有限公司：

你单位报送的《关于要求对实施告知承诺制的年产 1000 万个小微轴承建设项目环境影响报告表进行审批的函》以及随文附送的《年产 1000 万个小微轴承建设项目环境影响报告表》（以下简称《环评报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关环保法律法规，经研究，现将审批意见函告如下：

一、根据你单位委托宁波奇英环保技术咨询有限公司编制的《环评报告表》结论，以及该项目环评行政许可公示

— 1 —

情况，在项目符合产业政策、产业发展规划，选址符合主体功能区规划、城乡规划、土地利用总体规划等前提下，原则同意项目《环评报告表》结论。《环评报告表》经审批后可作为该项目日常运行管理的环境保护依据。

二、该项目选址在宁海县大佳何镇望海路9号，总投资500万元，其中环保投资4万元，建筑面积3200平方米。项目建成后，产能为年产1000万个小微轴承。

三、项目建设应落实以下环保措施：

1、该项目油品挥发废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源无组织排放监控浓度限值，厂区内挥发性有机物无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别排放限值。

2、厂区需落实雨污分流，厂区内初期雨水收集后须达标后纳管排放；清洗废水经处理回用于平面磨、无心磨工序，不得外排；生产车间合理划分干湿区，地面做好硬化防渗措施；生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的三级标准后纳管，由宁海县城北污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。

3、废白油、含油磨屑、废煤油等属于危险废物，危险废物暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求落实防腐、防渗、防雨等措施

施，并按《危险废物转移联单管理办法》送有资质单位处置；一般固废按资源化、无害化处置。

4、加强内部管理，合理布局厂房，选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准。

四、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。项目建设、运行过程中产生不符合经报批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，该项目方可正式投入生产。

宁波市生态环境局

2020年12月8日



工况证明

我公司委托宁波市甬蓝检测有限公司对本项目年产 1000 万个小微轴承建设项目进行验收监测，本公司实行 8 小时工作制，一年共生产 300 天，计划年生产小微轴承 1000 万个。

监测期间（2020 年 12 月 24 日），我公司共生产小微轴承（当日产量）3 万个，监测期间（2020 年 12 月 25 日），我公司共生产小微轴承（当日产量）2.9 万个，符合工况监测要求。

公司名称： _____ (盖章)

日期： 2020 年 12 月 26 日





91112052450

宁波市甬蓝检测有限公司

检测报告

TEST REPORT

(甬蓝检测) 第 YLE20200580 号

项目名称: 宁海县文丰轴承有限公司废水、废气、噪声检测

委托单位: 宁海县文丰轴承有限公司

报告编制 陈丹莹

审核人 张瑜

批准人 周秋秋 (授权签字人)

报告日期 2021-01-01



说 明

- 一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖宁波市甬蓝检测有限公司红色检测报告专用章及其骑缝章均无效；
- 二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖宁波市甬蓝检测有限公司红色检测报告专用章均无效；
- 三、未经同意本报告不得用于广告宣传；
- 四、由委托方采样送检的样品，本报告仅对来样负责；
- 五、本报告正文共 4 页，一式 3 份，发出报告与留存报告的正文一致；
- 六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向宁波市甬蓝检测有限公司提出。

地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道堤树路 9 号

邮编：315600

电话：0574-65358650

传真：0574-65358650

宁波市甬蓝检测有限公司

宁海县文丰轴承有限公司废水、废气、噪声检测

(甬蓝检测) YLF20200580 号

样品类别 废水、废气、噪声

委托单位及地址 宁海县文丰轴承有限公司 (宁海县大佳何镇望海路9号)

受检单位及地址 宁海县文丰轴承有限公司 (宁海县大佳何镇望海路9号)

采样地点 宁海县大佳何镇望海路9号 (宁海县文丰轴承有限公司)

采样日期 2020年12月24日-12月25日

检测单位 宁波市甬蓝检测有限公司 (浙江省宁波市宁海县桃源街道堤树路9号)

检测日期 2020年12月24日-12月31日

检测方法 pH值: 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986

悬浮物: 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989

化学需氧量: 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

氨氮: 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

总磷: 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989

动植物油: 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018

非甲烷总烃: 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017

工业企业厂界环境噪声: 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

评价标准 /

此页以下空白

检测结果

表 1 生活污水检测结果 (单位: 除 pH 值无量纲, 其余为 mg/L)

采样 点位	采样 日期	采样 频次	采样点位 坐标	样品性状	检测项目						
					pH 值	悬浮物	化学需 氧量	氨氮	总磷	动植 物油	
生活污水 排放 口 FS1	2020. 12.24	1	纬度: 29°25'49" 经度: 121°32'39"	微黄微浊	7.18	172	324	5.52	6.18	9.34	
		2		微黄微浊	7.27	160	348	5.00	5.47	9.51	
		3		微黄微浊	7.64	102	360	4.98	6.38	9.27	
		4		微黄微浊	7.50	120	345	5.00	6.10	9.25	
	日均值 (范围)				-	7.18~7.64	138	344	5.12	6.03	9.34
	2020. 12.25	1	纬度: 29°25'49" 经度: 121°32'39"	微黄微浊	7.15	124	319	5.38	6.04	9.31	
		2		微黄微浊	7.24	136	318	4.90	5.54	9.49	
		3		微黄微浊	7.60	124	327	4.96	6.43	9.25	
		4		微黄微浊	7.52	184	307	5.15	6.07	9.21	
	日均值 (范围)				-	7.15~7.60	142	318	5.10	6.02	9.32

表 2 无组织废气检测结果

采样 点位	采样 日期	采样 频次	采样点位坐标	检测结果
				非甲烷总烃 (mg/m ³)
厂界东侧 WQ1	2020.12.24	1	纬度: 29°25'49" 经度: 121°32'39"	0.78
		2		0.83
		3		0.94
	2020.12.25	1	纬度: 29°25'49" 经度: 121°32'39"	0.74
		2		0.89
		3		0.82
厂界南侧 WQ2	2020.12.24	1	纬度: 29°25'49" 经度: 121°32'39"	0.82
		2		0.83
		3		0.95
	2020.12.25	1	纬度: 29°25'49" 经度: 121°32'39"	0.86
		2		0.84
		3		0.98
厂界西侧 WQ3	2020.12.24	1	纬度: 29°25'49" 经度: 121°32'39"	0.85
		2		0.80
		3		0.76

续表 2 无组织废气检测结果

采样 点位	采样 日期	采样 频次	采样点位坐标	检测结果
				非甲烷总烃 (mg/m ³)
厂界西侧 WQ3	2020.12.25	1	纬度: 29°25'49" 经度: 121°32'39"	0.80
		2		0.73
		3		0.80
厂界北侧 WQ4	2020.12.24	1	纬度: 29°25'49" 经度: 121°32'39"	0.93
		2		0.87
		3		0.95
	2020.12.25	1	纬度: 29°25'49" 经度: 121°32'39"	0.77
		2		0.74
		3		0.85
最大值				0.98

表 3 无组织废气检测结果

采样 点位	采样 日期	采样 频次	采样点位坐标	检测结果
				非甲烷总烃 (mg/m ³)
车间外 WQ5	2020.12.24	1	纬度: 29°25'49" 经度: 121°32'39"	1.52
		2		1.63
		3		1.66
	2020.12.25	1	纬度: 29°25'49" 经度: 121°32'39"	1.54
		2		1.59
		3		1.49
最大值				1.66


表 4 采样期间气象参数

采样日期	采样频次	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气情况
2020.12.24	1	10.5	102.2	1.6	西北	晴
	2	13.7	102.0	1.4	北	晴
	3	12.6	102.1	1.7	北	晴
2020.12.25	1	7.3	102.8	1.5	西北	晴
	2	11.8	102.5	1.2	东北	晴
	3	9.4	102.7	1.8	东北	晴

表 5 厂界噪声检测结果

检测点位	检测日期	检测点位坐标	昼间 Leq dB (A)	
			测量时间	测量结果
厂界东侧 (Z1)	2020.12.24	纬度: 29°25'49" 经度: 121°32'39"	08:41-08:42	60.5
厂界南侧 (Z2)			08:46-08:47	63.4
厂界西侧 (Z3)			08:52-08:53	60.1
厂界北侧 (Z4)			08:57-08:58	54.7
检测时气象条件		天气晴, 风速≤5m/s		
厂界东侧 (Z1)	2020.12.25	纬度: 29°25'49" 经度: 121°32'39"	08:49-08:50	60.2
厂界南侧 (Z2)			08:55-08:56	62.1
厂界西侧 (Z3)			09:00-09:01	59.1
厂界北侧 (Z4)			09:06-09:07	55.2
检测时气象条件		天气晴, 风速≤5m/s		

测点示意图

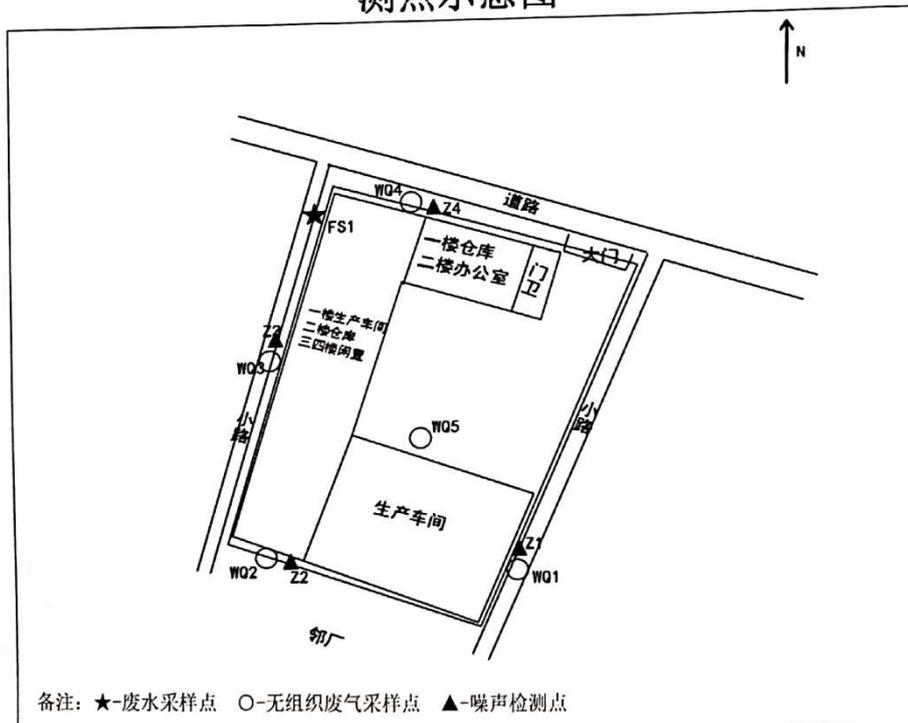

END

附件 4. 宁海县文丰轴承有限公司监测方案

宁海县文丰轴承有限公司
年产 1000 万个小微轴承建设项目
监测方案

一、无组织废气

1.1 执行标准：厂界无组织废气污染物中非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内VOCs无组织特别排放限值。

1.2 监测内容：

监测对象	监测点位	监测因子	监测频次	备注
无组织废气	企业厂界四周各设置 1 个监测点位	非甲烷总烃	3 次/天，共 2 天	同步记录气象参数
	厂区内车间外设置 1 个监测点位	非甲烷总烃	3 次/天，共 2 天	

二、生活污水

3.1 执行标准：《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准。

3.2 监测内容：

监测点位	污染物名称	监测频次
生活污水排放口	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油	4 次/天，共 2 天

三、厂界噪声

3.1 执行标准：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 3 类标准。

3.2 监测内容：

污染物名称	监测点位	监测频次
厂界噪声	厂界四周各设 1 个监测点位	昼间 1 次，共 2 天

注：监测时应符合竣工验收监测工况要求。

附件 5. 宁海县文丰轴承有限公司危废处置协议与危废仓库图

委托处置服务协议书

协议编号: KH202102026-N-Y

本协议于 [2021] 年 [01] 月 [01] 日由以下双方签署:

(1) 甲方: 宁海县文丰轴承有限公司
地址: 宁海县大佳何镇望海路 9 号
电话: 15957850292
传真: -
联系人: 胡伟锋

(2) 乙方: 宁波大地化工环保有限公司
地址: 宁波石化经济技术开发区(潮浦)巴子山路 1 号
电话: 0574-86504001-103 15924354958
传真: 0574-86504002
联系人: 叶晨

鉴于:

(1) 乙方为一家获政府有关部门批准的专业废物处置公司(危险废物经营许可证编号: 浙危废经第 3300000016 号), 具备提供处置危险废物服务的能力。

(2) 甲方在生产经营中将含有油废屑(0.02 吨)、废白油(0.01 吨)、废煤油(0.02 吨)产生, 属危险废物。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定, 甲方愿意委托乙方代为处置上述废物, 双方就此委托服务达成如下一致意见, 以供双方共同遵守:

协议条款:

1. 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关规定, 甲方应负责依法向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门进行相关危险废物转移的申请和危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料的申报, 经批准后始得进行废物转移。
2. 甲方须按照乙方要求提供废物的相关资料, 并加盖公章, 以确保所提供资料的真实性、合法性(包括但不限于: 废物产生单位基本情况调查表、废物性状明细表、废物分析报告、废物中所含物质的 MSDS 等)。
3. 甲方需明确向乙方指出废物中含有的危险性最大物质(如: 闪点最低、最不稳定、反应性、毒性、腐蚀性最强等); 废物具有多种危险特性时, 按危险特性列明危险性最大物质; 废物中含低闪点物质的, 必须有准确的物质名称、含量。乙方有权前往甲方废物产生点采样, 以便乙方对废物的性状、包装及运输条件进行评估, 并且确认是否有能力处置。
4. 甲方有责任对在生产过程中产生的废物进行安全收集并分类暂存于乙方认可尺寸的封装容器内, 并有责任根据国家有关规定, 在废物的包装容器表面明显处张贴符合国家标准 GB18597《危险废物贮存污染控制标准》的标签, 标签上的废物名称同本协议所约定的废物名称。甲方的包装物和/或标签若不符合本协议要求、和/或废物标签名称与包装内废物不一致时, 乙方有权拒绝接收甲方废物或退回该批次废物, 所产生的相应运费由甲方承担。包装容器甲方自备, 乙方视最终处置情况返还。(例如: 200L 大口塑料桶, 要求: 密封无泄漏、易处置)。
5. 甲方应保证每批次处置的废物性状和所提供的资料基本相符。其中: 闪点、PH、热值、硫、氯与

第 1 页共 4 页

地址: 宁波石化经济技术开发区(潮浦)巴子山路 1 号
电话: 0574-86504001 传真: 0574-86504002

- 甲方向乙方提供的资料、样品的数据偏差不超过 15%，超过 15%的按协议第 7 条约定执行。因点在 61℃ 以上的废物，上述数据偏差超过 15%的，双方协商解决。
6. 甲方在处置时以包装为单位向乙方提供分析报告和该批次废物的废物性状明细表。处置前乙方有权再次前往甲方现场采样。若检测结果与甲方提供的性状证明有较大差别时，乙方有权拒绝接收甲方废物；若该批次废物已运至乙方，乙方有权将该批次废物退回甲方，所产生的相应运费由甲方承担。
 7. 若甲方产生新的废物，或废物性状发生较大变化，甲方应及时通报乙方，并重新取样，重新确认废物名称、废物成分、包装容器、和处置费用等事项，经双方协商达成一致意见后，重新签订协议或签订补充协议。如果甲方未及时告知乙方：
 - 1) 视为甲方违约，乙方有权终止协议，并且不承担违约责任；
 - 2) 乙方有权拒绝接收，并由甲方承担相应运费；
 - 3) 如因此导致该批次废物在收集、运输、储存、处置等全过程中产生不良影响或发生事故、或导致收集处置费用增加的，甲方应承担因此产生的损害责任和额外费用。乙方有权向甲方提出追加处置费用和相应赔偿的要求。
 8. 甲方不得在处置废物当夹带剧毒品、易爆类物质、含碘元素、溴元素、氟元素等特殊元素的物质（合同另有约定的除外）。乙方有权将夹带剧毒品、易爆类物质、含碘元素、溴元素、氟元素等特殊元素的物质的废物退回给甲方，因此产生的运输费用由甲方承担。由于甲方隐瞒或夹带导致发生事故的，甲方应承担全部责任并全额赔偿，乙方有权向甲方追加相应处置费用。
 9. 废物的运输须按国家有关危险废物的运输规定执行。甲方须提前填写随车联单并盖章以传真或扫描邮件的方式给乙方，作为提出运输申请的依据，乙方根据排车情况及自身处置能力安排运输服务，在运输过程中甲方应提供进出厂区的方便。甲方负责对废物按乙方要求装车，并提供叉车及人工等装卸协助。
 10. 由乙方运输，乙方委托第三方有资质单位运输。甲方提出废物运输申请，乙方在确认具备收货条件后的十五个工作日内，乙方根据运输车辆安排，及时为甲方提供运输。如遇管制、限行等交通管理情况，甲方负责办理运输车辆的相关通行证件，车辆到达管制区域边界时，甲方需将相关通行证件提供运输车辆驾驶员，并全程陪同，确保安全运输。若由于甲方原因，导致车辆无法进行清运，所产生的相应运费由甲方承担。
 11. 运输由乙方负责，乙方承诺废物自甲方场地运出起，其运输、处置过程均遵照国家有关规定执行，并承担由此带来的风险和责任，除国家法律另有规定者外。
 12. 乙方负责按国家有关规定和标准对甲方委托的废物进行安全处置，并按照国家有关规定承担违规处置的相应责任。
 13. 费用及支付方式：
 - 1) 废物种类、代码、包装方式、处置费：见合同附件（附：委托处置废物明细表）。
 - 2) 计量：甲方如具备计量条件双方可当场计量，否则以乙方的计量为准，若发生争议，双方协商解决。
 14. 支付方式：超出部分处置费甲方须在接收到乙方开具的增值税专用发票后的一周内将所有费用转账至乙方账户。
银行信息：
甲方：名称：宁海县文丰轴承有限公司
税号：91330226MA2CKYJD02
地址：宁海县大佳何镇望海路 9 号
电话：13777038898
开户行：宁波宁海农村商业银行股份有限公司大佳何支行

第 2 页共 4 页

地址：宁波石化经济技术开发区（潮浦）巴子山路 1 号
电话：0574-86504001 传真：0574-86504002

账号：201000210740070

乙方：户名：宁波大地化工环保有限公司固体废物集中处置费代征专户
帐号：81014601302178136
开户行：宁波鄞州农村商业银行城西支行
行号：402332010463

15. 甲方需及时在宁波市环保局固废全过程综合监管平台进行企业信息注册、完成管理计划填报等工作，完成后及时以传真或邮件形式通知乙方。宁波市环保局固废全过程综合监管平台网址：
[Http://60.190.57.219/index.jsp](http://60.190.57.219/index.jsp)
16. 若因甲方未及时办理上述手续或未及时通知乙方，导致相关审批、转移手续无法完成，所产生的责任、费用全部由甲方承担。
17. 如果甲方未按双方协议约定如期支付处置费，乙方有权暂停甲方废物收集，直至费用付清为止。
18. 在乙方焚烧炉检修期间，乙方不保证及时收集甲方的废物。
19. 本协议有效期自 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日止。
20. 协议期内如因法令变更、许可证变更、主管机关要求、或其它不可抗力等原因，导致乙方无法收集或处置某类废物时，乙方可停止该类废物的收集和处置业务，并且不承担由此带来的一切责任。
21. 本协议一式伍份，甲方贰份，乙方叁份。
22. 本协议经双方签字盖章后生效。

甲方：宁海县文丰轴承有限公司

代表：

2021年 02 月 07 日

电话：15957850292

乙方：宁波大地化工环保有限公司

代表：

2021年 02 月 03 日

电话：0574-86504001

第 3 页共 4 页

地址：宁波石化经济技术开发区（澥浦）巴子山路 1 号
电话：0574-86504001 传真：0574-86504002

附：委托处置废物明细表

产废单位		宁海县文丰轴承有限公司		协议编号	KH202102026-	协议有效期	2021年01月01日至2021年12月31日止	
编号	废物名称	废物代码	产生量 (吨)	废物生产工艺	主要有害成分	包装方式	处置单价 (含增值税)	
1	含油废屑	900-200-08	0.02	机加工产生	油	200L桶	4560元/吨	
2	废白油	900-200-08	0.01	机加工产生	油	200L桶	3860元/吨	
3	废煤油	900-200-08	0.02	使用废弃产生	油	200L桶	3860元/吨	

1) 运输费：1600元/车次（含增值税）。若乙方应甲方要求专程送包装容器给甲方，甲方需按本条款规定的运输费标准另行支付乙方运输费。

2) 备注：双方协议签订时，甲方当即支付年处置费人民币叁仟元整（¥3000.00）（协议期内包含一年次运输，超出部分按协议价格结算，年处置费仅在协议有效期内有效。协议到期后，未使用完部分不续用，不退还）

危廢暫存庫



第二部分 宁海县文丰轴承有限公司年产 1000 万个小微轴承建设项目竣工环境保护验收意见

宁海县文丰轴承有限公司 年产 1000 万个小微轴承建设项目 竣工环境保护验收意见

2021 年 1 月 7 日，宁海县文丰轴承有限公司根据《年产 1000 万个小微轴承建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

宁海县文丰轴承有限公司位于宁波市宁海县大佳何镇望海路 9 号，建筑面积约 3200m²。主要有自动车床 18 台、自动磨床 21 台、清洗机 2 台等生产设备，项目建成后实现年产 1000 万个小微轴承的生产规模。项目实际建设地点、建设内容与环评批复基本一致。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于 2020 年 11 月委托宁波奇英环保技术咨询有限公司编制了《宁海县文丰轴承有限公司年产 1000 万个小微轴承建设项目环境影响报告表》；宁波市生态环境局以“甬环宁建（2020）335 号”文件对该项目予以批复。本项目于 2020 年 12 月开工建设，环保设施于 2020 年 12 月竣工，并于 2020 年 12 月进行调试。

（三）投资情况

本项目实际总投资约 500 万元，其中环保投资约 4 万元，占投资总额的 0.8%。

（四）验收范围

本次验收的范围为宁海县文丰轴承有限公司年产 1000 万个小微轴承建设项目，为项目整体验收。

二、工程变动情况

经现场核查，项目实际建设内容、生产规模、生产工艺、污染防治措施与环评批复基本一致，本项目无重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

主要为生活污水。

本项目清洗废水通过厂内循环系统套用于磨床工艺，磨加工用水大部分在工艺过程中蒸发，少部分随磨屑蒸发损耗，亚硝酸钠浸渍废水定期添加补充，不排放；生活污水经化粪池预处理后纳入大佳何泵站提升至宁海县城北污水处理厂处理。

(二) 废气

主要为油品挥发废气。

油品挥发废气通过车间机械通风排放。

(三) 噪声

项目的噪声源主要来源于自动车床、无心磨等设备运行时产生的机械噪声。项目采用合理布局，选用低噪声设备，安装减震垫等措施进行降噪。

(四) 固体废物

本项目含油废屑、废白油、废煤油委托宁波大地化工环保有限公司处置；边角料、磨屑、一般包装材料、废砂轮由资源回收公司回收利用；生活垃圾委托环卫部门清运。

(五) 总量控制

本项目无总量控制要求。

四、环境保护设施调试效果

(一) 污染物排放情况

1. 废水

监测期间（2020年12月24日~12月25日），本项目生活污水排放口污染物pH值（范围）、悬浮物、化学需氧量、动植物油排放浓度最大日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷排放浓度最大日均值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。

2. 废气

监测期间（2020年12月24日~12月25日），本项目厂界无组织废气污染物中非甲烷总烃排放浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》（GB

16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值,厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放浓度最大值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”中的监控点处1h平均浓度值。

3.厂界噪声

监测期间(2020年12月24日~12月25日),本项目厂界噪声昼间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

五、工程建设对环境的影响

根据试生产期间的调试运行情况,本项目环境保护设施均能正常运行。项目竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准;项目落实了各类固废的分类处置途径,实现了固废的无害化处置;项目污染治理措施及排放落实了环评及批复要求,对周边环境不会造成明显的影响。

六、验收结论

经现场查验,宁海县文丰轴承有限公司年产1000万个小微轴承建设项目履行了环境影响评价制度,项目建设过程中执行了环境保护“三同时”制度,总体落实了环评报告表及其批复提出的各项环境保护措施,满足竣工环境保护验收条件,经审议验收组结论:项目整体竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

1、严格遵守环保法律法规,完善各项环境保护管理和监测制度,强化从事环保工作人员业务培训,重点加强车间管理,减少无组织废气的排放。

2、按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》相关要求,完善验收监测报告内容。完善竣工环保验收的相关手续,按规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

八、验收组成员信息表

参会人员名单				
	姓名	单位	身份证号码	电话
组长	何文忠	宁海县文丰轴承有限公司		13 38898
专家成员	江	宁波市鄞州区科技局	江	130 2566
其他成员	陈村作	宁波市鄞州区科技局	-	181 7826



第三部分 宁海县文丰轴承有限公司年产 1000 万个小微轴承建设项目其他需要说明的事项

1. 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

宁海县文丰轴承有限公司年产 1000 万个小微轴承建设项目环保设施于 2020 年 12 月竣工。宁海县文丰轴承有限公司委托宁波市甬蓝检测有限公司对宁海县文丰轴承有限公司年产 1000 万个小微轴承建设项目进行验收监测工作。按照检测委托合同，宁波市甬蓝检测有限公司提供废水、废气、噪声项目的监测服务。2021 年 1 月，宁波市甬蓝检测有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》以及宁波市甬蓝检测有限公司出具“YLE20200580”检测报告，编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告；2021 年 1 月 7 日，宁海县文丰轴承有限公司组织成立本项目竣工环境保护验收工作组，验收工作组踏勘企业生产现场后，经认真讨论和审查，形成了如下验收意见：经现场查验，《宁海县文丰轴承有限公司年产 1000 万个小微轴承建设项目》环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，项目建设内容与项目环境影响报告表、及其批复基本一致，已落实了环保“三同时”和环境影响报告表及批复的各项环保要求，竣工环保验收条件基本具备。验收资料完整齐全，污染物达标排放、环保设施有效运行、验收监测结论明确合理。验收工作组结论：该项目竣工环境保护验收合格。

2. 其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

本建设项目运营期污染物为废水、废气、一般固废、危险固废、生活垃圾，企业已设有环保组织机构，完善环境管理台账记录。

(2) 环境风险防范措施

本建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定未要求制定环境风险应急预案，因此本项目未制定环境风险应急预案。

(3) 环境监测计划

本建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定未要求制定环境监测计划，因此本项目未制定环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施，无需说明。

3. 整改工作意见

根据验收意见，本建设项目竣工验收合格，各项环保设施已基本落实到位，无相应整改。

宁海县文丰轴承有限公司

2021年1月7日
