

宁波兴创户外用品有限公司
年产 300 万根碳纤维管生产项目（先行）
竣工环境保护验收报告

建设单位:宁波兴创户外用品有限公司

二〇二三年五月

建设单位法定代表人：郭 玮

编制单位法定代表人：郭 玮

项目 负责人：郭 玮

建设单位：宁波兴创户外用品有限公司（盖章） 编制单位：宁波兴创户外用品有限公司（盖章）

电话：15168516008

电话：15168516008

邮编：315600

邮编：315600

地址：宁海县深叻镇长洋村 977 号

地址：宁海县深叻镇长洋村 977 号

目 录

第一部分 宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目（先行） 竣工环境保护验收监测报告表	1
表一 项目基本情况	1
表二 工程建设内容	4
表三 主要污染源、污染物处理和排放流程	10
表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	13
表五 验收监测质量保证及质量控制	17
表六 验收监测内容	18
表七 生产工况及验收监测结果	19
表八 验收监测结论及建议	25
附件 1.宁波兴创户外用品有限公司环评批复“甬环宁建〔2022〕96 号”	27
附件 2.宁波兴创户外用品有限公司监测期间生产工况	31
附件 3.宁波兴创户外用品有限公司监测方案	32
附件 4.宁波兴创户外用品有限公司检测报告	33
附件 5.宁波兴创户外用品有限公司危险固废处置协议与危废仓库图	41
附件 6.宁波兴创户外用品有限公司突发环境事件应急预案备案表	48
第二部分 宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目（先行） 竣工环境保护验收意见	49
第三部分 宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目（先行） 其他需要说明的事项	53

第一部分 宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目（先行）竣工环境保护验收监测报告表

表一 项目基本情况

建设项目名称	年产 300 万根碳纤维管生产项目（先行）				
建设单位名称	宁波兴创户外用品有限公司				
建设项目性质	新建（迁建）√ 改建 扩建 技改				
建设地点	宁海县深甽镇长洋村 977 号				
主要产品名称	碳纤维管				
设计生产能力	年产 300 万根碳纤维管				
实际生产能力	年产 100 万根碳纤维管				
建设项目环评时间	2022.06	开工建设时间	2022.07		
调试时间	2022.10-2023.02	验收现场监测时间	2023.01.12-2023.01.13		
环评报告表审批部门	宁波市生态环境局	环评报告表编制单位	宁波奇英环保技术咨询有限公司		
环保设施设计单位	-	环保设施施工单位	-		
投资总概算	1000 万元	环保投资总概算	30 万元	比例	3%
实际总概算	600 万元	环保投资	30 万元	比例	5%
验收监测依据	<p>1、国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》；</p> <p>2、国家生态环境部 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告 2018 年 第 9 号）；</p> <p>3、浙江省人民政府令第 364 号《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》；</p> <p>4、浙江省环境保护厅办公室《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发〔2009〕76 号）；</p> <p>5、国环规环评〔2017〕4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；</p> <p>6、国家生态环境部办公厅《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688 号；</p> <p>7、浙江省人民政府令第 388 号《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修正）；</p> <p>8、宁波奇英环保技术咨询有限公司《宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目环境影响报告表》；</p> <p>9、宁波市生态环境局《关于<宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目环境影响报告表>的审查意见》（甬环宁建〔2022〕96 号）；</p> <p>10、宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目（先行）验收监测方案。</p>				

验收监测评价标准、标号、级别、限值

1、废水

本项目废水为打磨废水和生活污水。打磨废水经混凝沉淀后回用于生产（或排放）；生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网后排放。生活污水排放口隐埋于地下无法监测。打磨废水处理设施出口污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，其中氨氮、总磷排放均执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放限值。具体详见表 1-1。

表 1-1 污水污染物排放标准 （单位：mg/L，pH 值无量纲）

污染物		pH 值	悬浮物	化学需氧量	石油类	阴离子表面活性剂	氨氮	总磷
废水排放标准	GB 8978-1996	6-9	400	500	20	20	-	-
	DB33/887-2013	-	-	-	-	-	35	8

2、废气

本项目废气为固化废气、拉漆、烘干废气和烫芯废气。拉漆、烘干废气污染物非甲烷总烃、乙酸丁酯、乙酸乙酯排放均执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 1 大气污染物排放限值，固化废气、烫芯废气污染物非甲烷总烃排放均执行《合成树脂工业污染物排放标准》

（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值；厂界无组织废气污染物非甲烷总烃排放均执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表 6 企业边界污染物浓度限值；厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1“厂区内 VOCs 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值。具体详见表 1-2~3。

表 1-2 废气污染物排放标准

污染物	排放标准	大气污染物排放限值 (mg/m ³)	企业边界大气污染物浓度限值 (mg/m ³)
非甲烷总烃	DB33/2146- 2018	80	4.0
乙酸乙酯		60*	-
乙酸丁酯			-
非甲烷总烃	GB31572-2015	60	4.0

*乙酸乙酯、乙酸丁酯以乙酸酯类计。

表 1-3 废气污染物排放标准

污染物	排放标准	厂区内 VOCs 无组织特别排放限值 (mg/m ³)
非甲烷总烃	GB 37822-2019	6（监控点处 1h 平均浓度值）

3、噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。具体详见表1-4。

表 1-4 厂界噪声执行标准

监测对象	项目	单位	限值	引用标准
厂界噪声	等效 A 声级	dB(A)	65（昼间）	（GB 12348-2008） 3类标准

4、固废

本项目产生的固体废弃物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发〔2019〕76号）中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）；一般工业固体废物执行《宁波市一般工业固体废物污染防治管理办法（试行）》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中规定。

表二 工程建设内容

1、项目基本概况

宁波兴创户外用品有限公司利用位于宁海县深甬镇长洋村 977 号的空置厂房作为生产用房，土地类型为工业用地，用地面积为 3000 平方米。项目总投资 1000 万元，主要生产碳纤维管，用于相机支架、渔具等用途。主要原材料为碳纤维布、玻纤布、BOPP 带、脱模剂、油性漆、水性漆、油性油墨，主要设备为裁布机、压布机、烫芯台、缠带机、固化炉、脱芯机、脱 BOPP 带机、无心磨床、自动研磨机、自动拉漆机、丝网印刷机等，生产工艺主要为裁布、烫芯、卷管、缠带、固化、脱模、裁切、抛光、打磨、拉漆、烘干、印刷等，建成后形成年产 300 万根碳纤维管的生产能力。

企业于 2022 年 6 月委托宁波奇英环保技术咨询有限公司编制完成《宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目环境影响报告表》；2022 年 6 月 28 日，宁波市生态环境局以甬环宁建〔2022〕96 号文件对该项目予以批复。

本项目于 2022 年 7 月开工建设，环保设施于 2022 年 10 月竣工，目前该工程项目年产 100 万根碳纤维管主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

2、地理位置

宁海县东邻象山县，南接三门县，西接天台、新昌，北毗奉化，地理位置优越。象山港横贯东北，三门湾瀛环于东南，海岸线长达 176km²，港区开阔，水深浪静，不淤不冻。象山港插入县境内，全县拥有沿海码头 4 座，航运通达国内各沿海港口及长江中下游城市。34 省道（甬临线）、38 省道（象西线）和 74 省道（盛宁线）贯穿境内，甬台温高速公路和甬台温铁路由北向南穿过宁海县，交通便利，离杭州 261km，南距临海 76km，温州 282km。

宁波兴创户外用品有限公司位于宁海县深甬镇长洋村 977 号。项目东侧为捷洋影视，南侧为山林，西侧为山林，北侧为宁海吉创橡塑科技有限公司。厂区平面图详见图 2-1，地理位置图详见图 2-2。

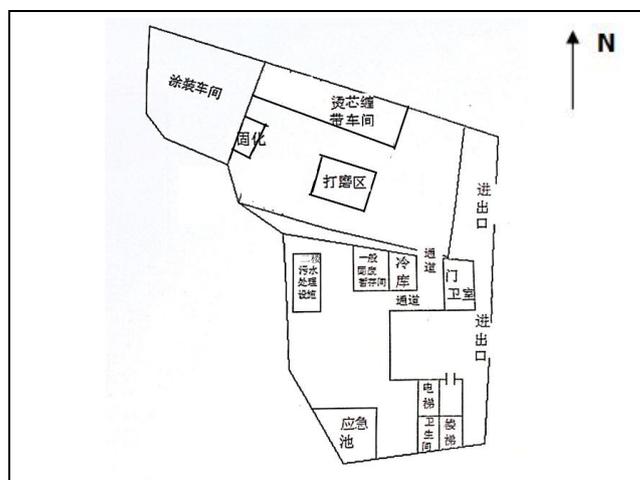


图 2-1 项目厂区平面图



图 2-2 项目地理位置图

3、建设内容和规模

本项目利用位于宁海县深甬镇长洋村 977 号已建工业厂房，厂房占地面积为 3000m²，建成后形成年产 300 万根碳纤维管生产项目（先行）。项目生产内容与规模详见表 2-1。

表 2-1 项目生产内容与规模

产品名称	计划年产量	实际年产量	年运行时数
碳纤维管	300 万根	100 万根	3000h

4、主要生产设备详见表 2-2，主要原辅材详见表 2-3。

表 2-2 主要生产设备一览表

序号	设备名称	环评审批数量	实际设备数量	备注
1	自动大张裁布机	3 台	1 台	-
2	拉刀式自动小张裁布机	3 台	1 台	-
3	手动烫芯台	6 台	2 台	-
4	双面压布机	3 台	1 台	-
5	滚珠丝杆卷管机	6 台	2 台	-
6	自动定心卧式立缠机	3 台	1 台	-
7	卧式数控缠带机	6 台	1 台	-
8	固化炉	6 台	2 台	-
9	脱芯机	6 台	2 台	-
10	精密半自动切断机	3 台	1 台	-
11	脱 BOPP 带机	3 台	1 台	-
12	自动无心磨床	6 台	2 台	-
13	单机自动研磨机	3 台	1 台	-
14	自动拉漆机	3 台	1 台	-
15	拉漆房（互相连通）	3 台	1 间	-
16	烘干房	2 台	1 间	-
17	丝网印刷机	2 台	0 台	-
18	气动印标机	3 台	0 台	-
19	空压机	2 台	2 台	-
20	水池	1 个	2 个	-
21	水泵	1 台	1 台	-
22	固化废气收集系统	1 台	0 台	-
23	活性炭吸附脱附催化燃烧设备	1 台	1 台	-
24	风机	2 台	1 台	-

表 2-3 主要原辅材料消耗

序号	原辅材料名称	环评中年消耗量	实际年总消耗量	备注
1	碳纤维布	100 万 m ² /a	33 万 m ² /a	-
2	玻纤布	50 万 m ² /a	17 万 m ² /a	-
3	BOPP 带	25 万 m ² /a	8.3 万 m ² /a	-
4	PU 漆	1.5t/a	0.50t/a	-
5	稀释剂	0.5t/a	0.17t/a	-
6	固化剂	1.0t/a	0.33t/a	-
7	水性漆	7.5t/a	2.48t/a	-
8	油墨	0.05t/a	0t/a	-
9	无味煤油	0.01t/a	0t/a	-
10	脱模剂	3t/a	1t/a	-
11	砂轮	100 个/a	33 个/a	-
12	砂带	2000 条/a	666 条/a	-

5、主要生产工艺流程图详见图 2-3。

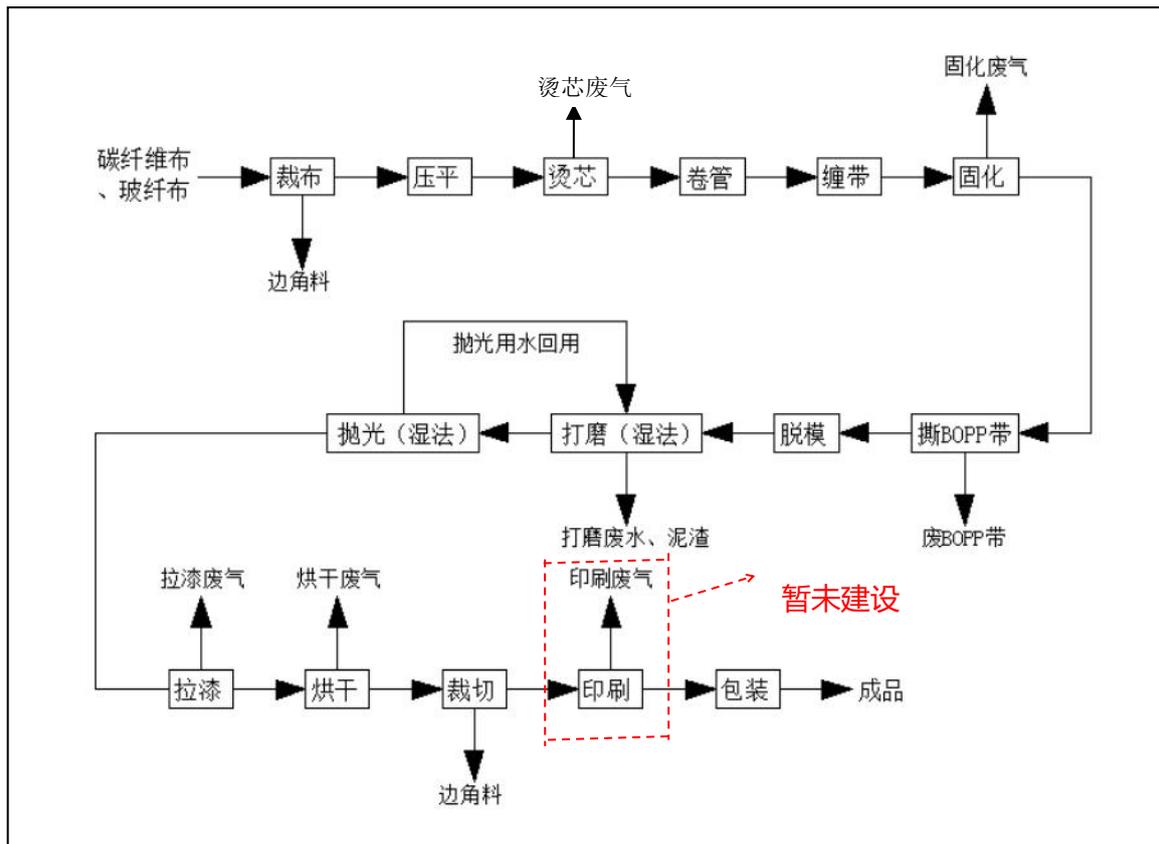


图 2-3 生产工艺流程图

生产工艺说明：

1) 裁布：按管材制作要求，对碳纤维布料等进行分割裁切，会产生边角料。

2) 压平、烫芯：先将多层碳纤维布、玻纤布压到一起，然后用加热的电烙铁（36V）将裁切好的碳纤维布料烫贴在涂有脱模剂的铁芯模具上，烫芯温度约 80~120℃，时间较短，烫 1~2 下即可，主要使布料具有黏性容易固定在管子上，方便卷管，产生废气极少。

3) 卷管：采用平板搓卷工艺，将贴好的碳纤维布料紧密平整的包卷在铁芯模具表面。

4) 缠带：采用缠绕方式将 BOPP 带按设定好的张力带距，紧密地缠绕在卷好的碳纤维布料表面。

5) 固化：将缠绕好的碳纤维布料连同铁芯模具，挂放在固化炉内，按相应的工艺分段控温，使树脂和碳纤维布料紧密融合在一起固化定型（碳纤维布中树脂为环氧树脂，是一种热固性树脂，在 120℃时可充分固化），固化温度约为 130℃，固化时间为 2~3h，由电提供热源，会产生少量有机废气。

6) 撕 BOPP 带：固化完成后将定型的 BOPP 带撕掉。

7) 脱模：固化好的碳纤维管材，通过液压拉拔的方式，将铁芯模具拔出，使铁芯模具和碳纤维管材分离。

8) 打磨、抛光：碳纤维管经过碳纤维布固化而来，固化前碳纤维布外形的不平整可能导致碳纤维管外形粗糙，影响进一步的拉漆作业，因此需要进行表面打磨预处理以及更精细的抛光预处理。碳纤维管先通过研磨机打磨进行粗磨加工，然后通过无心磨床进一步抛光进行精磨加工，均为湿法加工，抛光工序用水循环使用，定期更换作为打磨工序补充用水，打磨工序用水循环使用，定期经过隔油+混凝沉淀处理后暂时回用于生产。主要产污为泥渣。

9) 拉漆、烘干：通过抽拉的方式对碳纤维管材进行表面着色涂装，然后进入烘干房烘干，烘干温度为 60~80℃，烘干时间为 2~3h，由电提供热源。

10) 裁切：将拉漆、烘干好的碳纤维管材按要求尺寸进行定长裁断，会产生少量边角料。

11) 印刷：暂无印刷工序。

油漆方案：本项目使用 PU 漆和水性漆两种油漆，水性漆与水简单调配即可使用，调配比例为水性漆：水=1：0.1，PU 漆需要与稀释剂、固化剂进行调配，调配比例为油漆：稀释剂：固化剂=3：1：2。

6、主要产污环节

(1) 废水：主要为打磨废水和生活污水。

(2) 废气：主要为固化废气、拉漆、烘干废气和烫芯废气。

(3) 噪声：主要来自磨床、空压机等机械运行时产生的噪声。

(4) 固废：主要为一般废包装材料、其他废包装桶、边角料、废 BOPP 带、废打磨材料、泥渣、隔油浮渣、含油污泥、废催化剂、废油漆、废过滤棉、废活性炭、生活垃圾。

7、项目变动情况

根据环评材料及现场核实情况，本项目实际建设内容、生产规模，生产工艺、污染防治措施基本按照环评报告表及审查意见基本一致，印刷工序暂未建设，未产生印刷废气与无味煤油桶；打磨废水目前回用于生产，暂不外排。本项目环评中固化废气在固化炉尾气口直接收集后通过不低于 15m 高排气筒排放，印刷废气整体密闭收集，拉漆废气、烘干废气负压收集后，一起通过一套“长烟管道冷却+活性炭吸附脱附催化燃烧”装置处理后经 1 根不低于 15m 高排气筒排放，企业实际建设中固化废气、烫芯废气分别经收集后与拉漆、烘干废气经收集后一同通过干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理后由 15 米高排气筒排放，废气处理效率为 82.9%。对照《建设项目环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号）等有关规定，以上变动不属于重大变动。

8、水源及水平衡图

生活污水：本项目员工为 7 人，员工用水量按 50L/人·d 统计，生活用水量为 0.35m³/d(105m³/a)，排水量按用水量的 85%计，则生活污水产生量为 0.298m³/d（89m³/a）。

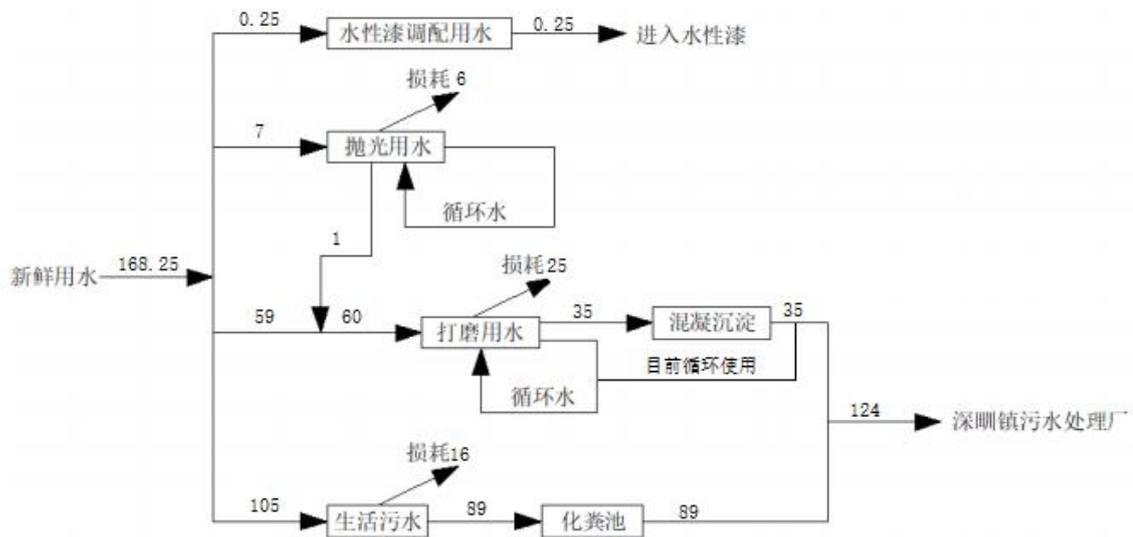


图 2-4 水平衡图

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

1、废水

本项目废水为打磨废水和生活污水。打磨废水经混凝沉淀后回用于生产（或排放）；生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网后排放。生活污水排放口隐埋于地下无法监测。废水来源及处理方式见表 3-1，打磨废水处理工艺流程图详见图 3-1；打磨废水处理设施图见图 3-2。

表 3-1 废水来源及处理方式一览表

污水来源	污染物	排放方式	处理设施	排放去向
打磨废水	pH 值、SS、CODcr、LAS、石油类、氨氮、总磷	间歇	厂区污水处理设施（混凝沉淀）	纳管




图 3-1 打磨废水处理工艺流程图（★-废水监测点）

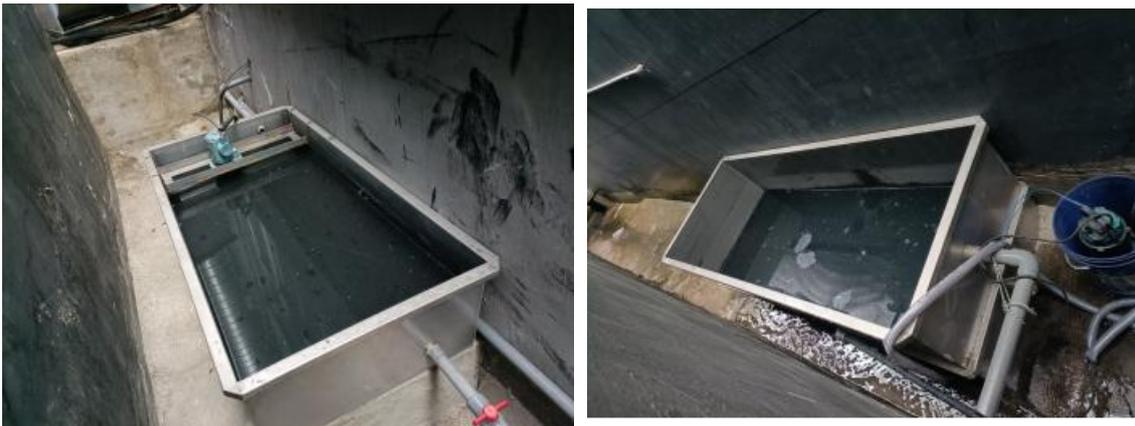


图 3-2 打磨废水处理设施图

2、废气

本项目废气主要为固化废气、拉漆、烘干废气和烫芯废气。固化废气、烫芯废气分别经收集后与拉漆、烘干废气经收集后一同通过干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理后由 15 米高排气筒排放。废气来源及处理方式见表 3-1；固化废气、拉漆、烘干废气和烫芯废气处理工艺流程图见图 3-3；固化废气、拉漆、烘干废气和烫芯废气处理设施图见图 3-4。

表 3-2 废气产生情况汇总

废气来源	废气污染物	排放方式	处理设施	排放去向
固化废气	非甲烷总烃	间歇	干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧	大气
拉漆、烘干废气	非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯	间歇		大气
烫芯废气	非甲烷总烃	间歇		大气




图 3-3 固化废气、拉漆、烘干废气和烫芯废气处理工艺流程图（◎有组织废气监测点位）



图 3-4 固化废气、拉漆、烘干废气和烫芯废气处理设施图

3、噪声

本项目噪声主要来自磨床、空压机等生产设备生产运行时产生的噪声，通过关闭门窗，安装减震垫等方式来达到减震降噪效果。

4、固体废物

本项目的固体废物主要来源产生情况见表 3-3。

表 3-3 固体废弃物产生及排放情况

序号	种类（名称）	产生工序	属性	实际全年产生量 （吨/年）	实际情况
					利用处置方式及去向
1	一般废包装材料	原料包装	一般固废	0.17	由资源回收公司回收
2	边角料	裁布、裁切	一般固废	1.32	
3	废 BOPP 带	撕 BOPP 带	一般固废	0.5	
4	废打磨材料	抛光、打磨	一般固废	0.23	
5	泥渣	自然沉淀	一般固废	0.77	
6	废催化剂	废气治理	一般固废	0.06t/2a	由原厂家回收利用
7	隔油浮渣	废水治理	危险固废	0.007	委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置
8	含油污泥	废水治理	危险固废	0.1	
9	废油漆	拉漆	危险固废	0.01	
10	废过滤棉	废气治理	危险固废	0.02	
11	废活性炭	废气治理	危险固废	0.5	
12	其他废包装桶	原料包装	危险固废	0.3	
13	生活垃圾	生活	一般固废	1.05	由环卫部门统一清运

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1、建设项目环境影响报告表

废水：生产废水经隔油+混凝沉淀处理、生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，一起纳管至宁海县深甬镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准排放。

废气：要求企业在固化炉尾气口直接收集后通过不低于 15m 高排气筒排放；印刷废气整体密闭收集，拉漆废气、烘干废气负压收集后，一起通过一套“长烟管道冷却+活性炭吸附脱附催化燃烧”装置处理，最终经 1 根不低于 15m 高排气筒排放。

固废：一般废包装材料、边角料、废 BOPP 带、废打磨材料、泥渣由资源回收公司回收利用；废催化剂由原厂家回收利用；废煤油桶、其他废包装桶、隔油浮渣、含油污泥、废油漆、废过滤棉、废活性炭属于危险废物，委托有资质单位处理；生活垃圾需分类收集，防风吹、雨淋和日晒，防止虫、蝇滋生，由环卫部门定期清运并统一集中处理。

噪声：在选购设备时，应优先考虑低耗、低噪声设备；合理布局各机械设备，高噪音设备摆放尽量往车间中央靠；在布置设备时，在设备底部安装减震垫，生产时尽量保证车间门关闭；定期做好设备维护，使设备处于良好的运行状态。

2、关于《宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目环境影响报告表》的审查意见 甬环宁建（2022）96 号

根据你单位委托宁波奇英环保技术咨询有限公司编制的《环评报告表》结论，以及该项目环评行政许可公示情况，原则同意项目《环评报告表》结论。《环评报告表》经审查后可作为该项目日常运行管理的环境保护依据。

建设项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求。

该项目选址在宁海县深甬镇长洋村 977 号，用地面积 3000 平方米，总投资 1000 万元，其中环保投资 30 万元。主要原材料为碳纤维布、玻纤布、BOPP 带、脱模剂、油性漆、水性漆、油性油墨，采用裁布、烫芯、卷管、缠带、固化、脱模、裁切、抛光、打磨、拉漆、烘干、印刷等工艺，项目建成后，产能为年产 300 万根碳纤维管。

拉漆工序须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》的水性涂料和溶剂型涂料，拉漆车间调漆、拉漆、烘干工艺须设置在密闭的一体化车间内，并保持微负压状态，采取吸附燃烧等高效治理措施，废气经收集后与印刷废气合并处理达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 1 大气污染物排放限值要求，并通过不低于 15 米排气筒高空排放。固化废气经集气罩收集，执行《合成树脂工业污染物排放标准》

（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值及表 9 企业边界大气污染物浓度限值，并通过不低于 15 米排气筒高空排放。厂区内挥发性有机物无组织废气排放执行《挥发性有机

物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。

生活污水经化粪池预处理、打磨废水经混凝沉淀处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 浓度限值，纳管至宁海县深甬镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后外排。

该项目产生的沾有油及有机物的废包装桶、隔油浮渣、废油漆、废过滤棉、废活性炭等属于危险废物，危险废物暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求落实防腐、防渗、防雨等措施，并按《危险废物转移联单管理办法》送有资质单位处置；废催化剂由原厂家回收，其它一般固废按资源化、无害化处置。

加强内部管理，合理布局厂房，选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值。

按照《环评报告表》结论，该项目污染物外排环境量控制为：VOCS≤0.5 吨/年，CODcr ≤0.005 吨/年。

制定突发环境事件应急预案，并在项目投运前报生态环境主管部门备案，定期开展应急演练。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报审项目环评文件。项目建设、运行过程中产生不符合经报审的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，该项目方可正式投入生产。

3、本项目三同时落实情况

环评批复及审查意见及实际落实情况详见表 4-1：

表 4-1 环评批复及实际情况对照表

环评批复情况	实际落实情况
该项目选址在宁海县深甬镇长洋村 977 号，用地面积 3000 平方米，总投资 1000 万元，其中环保投资 30 万元。主要原材料为碳纤维布、玻纤布、BOPP 带、脱模剂、油性漆、水性漆、油性油墨，采用裁布、烫芯、卷管、缠带、固化、脱模、裁切、抛光、打磨、拉漆、烘干、印刷等工艺，项目建成后，产能为年产 300 万根碳纤维管。	宁波兴创户外用品有限公司利用位于宁海县深甬镇长洋村 977 号的空置厂房作为生产用房，土地类型为工业用地，用地面积为 3000 平方米。项目总投资 600 万元，主要生产碳纤维管，用于相机支架、渔具等用途。建成后形成年产 100 万根碳纤维管的生产规模。

表 4-1 环评批复及实际情况对照表

环评批复情况	实际落实情况
<p>加强内部管理，合理布局厂房，选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值。</p>	<p>验收监测期间，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。</p>
<p>生活污水经化粪池预处理、打磨废水经混凝沉淀处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 浓度限值，纳管至宁海县深圳镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后外排。</p>	<p>本项目废水为打磨废水和生活污水。打磨废水冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网后排放。生活污水排放口隐埋于地下无法监测。验收监测期间，打磨废水处理设施出口污染物排放均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，其中氨氮、总磷排放均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放限值。</p>
<p>该项目产生的沾有油及有机物的废包装桶、隔油浮渣、废油漆、废过滤棉、废活性炭等属于危险废物，危险废物暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求落实防腐、防渗、防雨等措施，并按《危险废物转移联单管理办法》送有资质单位处置；废催化剂由原厂家回收，其它一般固废按资源化、无害化处置。</p>	<p>一般废包装材料、边角料、废 BOPP 带、废打磨材料、泥渣由资源回收公司回收利用；废催化剂由原厂家回收利用；其他废包装桶、隔油浮渣、含油污泥、废油漆、废过滤棉、废活性炭属于危险废物，委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门定时清运。</p>
<p>按照《环评报告表》结论，该项目污染物外排环境量控制为：VOC_s≤0.5 吨/年，COD_{cr}≤0.005 吨/年。</p>	<p>本项目打磨废水暂不外排；项目固化废气、拉漆、烘干废气、烫芯废气产生的 VOC_s 年排放量为 0.175 吨/年。</p>
<p>制定突发环境事件应急预案，并在项目投运前报生态环境主管部门备案，定期开展应急演练。</p>	<p>已制定突发环境事件应急预案，备案编号为：330226-2023-030-L。</p>

续表 4-1 环评批复及实际情况对照表

环评批复情况	实际落实情况
<p>拉漆工序须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》的水性涂料和溶剂型涂料，拉漆车间调漆、拉漆、烘干工艺须设置在密闭的一体化车间内，并保持微负压状态，采取吸附燃烧等高效治理措施，废气经收集后与印刷废气合并处理达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 1 大气污染物排放限值要求，并通过不低于 15 米排气筒高空排放。固化废气经集气罩收集，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值及表 9 企业边界大气污染物浓度限值，并通过不低于 15 米排气筒高空排放。厂区内挥发性有机物无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。</p>	<p>本项目拉漆工序已选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》的水性涂料和溶剂型涂料，拉漆车间调漆、拉漆、烘干工艺已设置在密闭的一体化车间内，并保持微负压状态。本项目废气为固化废气、拉漆、烘干废气和烫芯废气。固化废气、烫芯废气经收集与拉漆、烘干废气经收集后一同通过干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理后由 15 米高排气筒排放。验收监测期间，拉漆、烘干废气污染物非甲烷总烃、乙酸丁酯、乙酸乙酯排放均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 1 大气污染物排放限值；固化废气、烫芯废气污染物非甲烷总烃排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值；厂界无组织废气污染物非甲烷总烃排放均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 6 企业边界污染物浓度限值；厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCs 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值。</p>
<p>根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报审项目环评文件。项目建设、运行过程中产生不符合经报审的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。</p>	<p>项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施未发生重大变化。</p>

表五 验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析方法

表 5-1 监测分析方法一览表

类别	项目名称	方法依据
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	悬浮物	水质 悬浮物测定 重量法 GB/T 11901-1989
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
	乙酸乙酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014
	乙酸丁酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

2、质量控制与质量保证

(1) 环保设施竣工验收现场监测，按规定满足相应的工况条件，否则负责验收监测的单位立即停止现场采样和测试。

(2) 现场采样和测试严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因予以详细说明。

(3) 环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

(4) 环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。

(5) 参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

(6) 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进现场前对气体分析、采样器流量计等进行校核。

(7) 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期的声级计。

(8) 验收监测的采样记录及分析测试结果，按照国家标准和技术规范有关要求进行处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

表六 验收监测内容

1、废水

项目废水监测内容及频次见表 6-1。

表 6-1 废水监测内容及频次

监测点位	污染物名称	监测频次
打磨废水处理设施出口	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类	4 次/天，共 2 天

2、废气

有组织废气监测内容频次详见表 6-2，无组织废气监测内容频次详见表 6-3。

表 6-2 有组织废气监测内容及频次

污染物名称	监测点位	监测因子	监测频次
固化废气、拉漆、烘干废气和烫芯废气	处理设施进出口	非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯	3 次/天，共 2 天

表 6-3 无组织废气监测内容及频次

废气名称	监测点位	监测因子	监测频次
固化废气、拉漆、烘干废气和烫芯废气	企业厂界四周各设置 1 个监测点位	非甲烷总烃	3 次/天，共 2 天
	厂区内车间外设置 1 个监测点位	非甲烷总烃	

3、厂界噪声监测

在厂界布设 4 个监测点位，监测 2 天，昼间 1 次。噪声监测内容见表 6-4。

表 6-4 监测内容及监测频次

污染物名称	监测点位	监测频次
厂界噪声	厂界四周各设 1 个监测点位	昼间 1 次，共 2 天

4、监测点位布置图



表七 生产工况及验收监测结果

1、生产工况

验收监测期间，依据建设项目相应产品在监测期间实际产量的工况记录方法，宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目（先行）的实际运行工况正常，具体生产工况情况如表 7-1 所示。

表 7-1 建设项目生产工况情况表

序号	产品名称	监测期间产量				设计年产量	实际年产量
		2023.01.12		2023.01.13			
		产量	负荷	产量	负荷		
1	碳纤维管	0.29 万根	87.0%	0.28 万根	84.0%	300 万根/年	100 万根/年

注：日设计产量等于全年实际产量除以全年工作天数，年工作时间 300 天。

验收监测结果：

2、废水监测

验收监测期间，本项目打磨废水处理设施出口污染物 pH 值（范围）、悬浮物、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂排放浓度最大日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷排放浓度最大日均值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放限值。具体监测结果见表 7-2。

表 7-2 生产废水监测结果（单位：除 pH 值无量纲，其余为 mg/L）

监测点位	监测日期	监测频次	监测项目						
			pH 值	悬浮物	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类	阴离子表面活性剂
打磨废水处理设施进口 FS1	2023.01.12	1	7.2	344	304	1.43	0.26	0.06	0.246
		2	7.5	359	299	1.30	0.18	0.09	0.208
		3	6.8	341	310	1.55	0.22	0.06	0.237
		4	7.6	376	334	1.72	0.34	0.10	0.225
	日均值（范围）		6.8~7.6	355	312	1.50	0.25	0.08	0.229
	2022.01.13	1	6.7	367	307	1.62	0.16	0.12	0.218
		2	7.0	377	302	1.55	0.22	0.08	0.257
		3	7.3	348	316	1.27	0.30	0.10	0.230
		4	6.5	351	340	1.43	0.11	0.15	0.247
	日均值（范围）		6.5~7.3	361	316	1.47	0.20	0.11	0.238

续表 7-2 生产废水监测结果（单位：除 pH 值无量纲，其余为 mg/L）

监测点位	监测日期	监测频次	监测项目						
			pH 值	悬浮物	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类	阴离子表面活性剂
打磨废水处理设施出口 FS2	2023.01.12	1	6.9	58	131	0.519	0.12	<0.06	0.076
		2	6.6	46	111	0.496	0.24	<0.06	0.078
		3	7.1	55	102	0.634	0.18	<0.06	0.083
		4	7.5	51	114	0.402	0.22	<0.06	0.086
	日均值（范围）		6.6~7.5	52	114	0.513	0.19	<0.06	0.081
	2023.01.13	1	7.2	42	126	0.440	0.10	<0.06	0.098
		2	7.7	62	108	0.503	0.16	<0.06	0.093
		3	7.4	49	96	0.485	0.12	<0.06	0.081
		4	6.8	51	112	0.451	0.08	<0.06	0.086
	日均值（范围）		6.8~7.7	51	110	0.470	0.12	<0.06	0.090
最大日均值（范围）			6.6~7.7	52	114	0.513	0.19	<0.06	0.090
标准限值			6~9	400	500	35	8	20	20
是否符合			符合	符合	符合	符合	符合	符合	
执行标准：《污水排放综合标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放浓度限值。									

3、废气监测

3.1 有组织废气检测

验收监测期间，拉漆、烘干废气污染物非甲烷总烃、乙酸丁酯、乙酸乙酯排放浓度最大值均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 1 大气污染物排放限值；固化废气、烫芯废气污染物非甲烷总烃排放浓度最大值符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值。具体监测结果见表 7-3~4。

表 7-3 有组织废气监测结果

监测点位	监测日期	监测频次	标干流量 (m ³ /h)	乙酸丁酯	乙酸乙酯	乙酸丁酯	乙酸乙酯
				排放浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排放速率 (kg/h)
固化废气、拉漆、烘干废气、烫芯废气处理设施进口 YQ1	2023.01.12	1	8.57×10 ³	0.358	7.63	3.07×10 ⁻³	6.54×10 ⁻²
		2	8.54×10 ³	0.311	7.19	2.66×10 ⁻³	6.14×10 ⁻²
		3	8.75×10 ³	0.348	7.38	3.04×10 ⁻³	6.46×10 ⁻²
	2023.01.13	1	9.08×10 ³	0.421	7.41	3.82×10 ⁻³	6.73×10 ⁻²
		2	8.69×10 ³	0.366	7.20	3.18×10 ⁻³	6.26×10 ⁻²
		3	8.61×10 ³	0.402	7.49	3.46×10 ⁻³	6.45×10 ⁻²

续表 7-3 有组织废气监测结果

监测 点位	监测 日期	监测 频次	标干流量 (m ³ /h)	乙酸丁酯	乙酸乙酯	乙酸丁酯	乙酸乙酯
				排放浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排放速率 (kg/h)
固化废气、油漆、烫芯废气处理设施出口 YQ2 (15m)	2023.01.12	1	1.02×10 ⁴	0.047	0.639	4.79×10 ⁻⁴	6.52×10 ⁻³
		2	9.83×10 ³	0.019	0.624	1.87×10 ⁻⁴	6.13×10 ⁻³
		3	9.72×10 ³	0.033	0.645	3.21×10 ⁻⁴	6.27×10 ⁻³
	2023.01.13	1	1.00×10 ⁴	0.028	0.589	2.80×10 ⁻⁴	5.89×10 ⁻³
		2	1.03×10 ⁴	0.037	0.629	3.81×10 ⁻⁴	6.48×10 ⁻³
		3	1.01×10 ⁴	0.038	0.582	3.84×10 ⁻⁴	5.88×10 ⁻³
最大值			-	0.047	0.645	4.79×10⁻⁴	6.52×10⁻³
标准限值			-	60*		-	-
是否符合			-	符合		-	-

执行标准：《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 1 大气污染物排放限值。*乙酸乙酯、乙酸丁酯以乙酸酯类计。

表 7-4 有组织废气监测结果

监测 点位	监测 日期	监测 频次	标干流量 (m ³ /h)	非甲烷总烃	
				排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
固化废气、油漆、烫芯废气处理设施进口 YQ1	2023.01.12	1	8.57×10 ³	32.6	0.279
		2	8.54×10 ³	33.1	0.283
		3	8.75×10 ³	37.7	0.330
	2023.01.13	1	9.08×10 ³	29.0	0.263
		2	8.69×10 ³	35.5	0.308
		3	8.61×10 ³	36.1	0.311
固化废气、油漆、烫芯废气处理设施出口 YQ2 (15m)	2023.01.12	1	1.02×10 ⁴	4.93	5.03×10 ⁻²
		2	9.83×10 ³	5.27	5.18×10 ⁻²
		3	9.72×10 ³	6.20	6.03×10 ⁻²
	2023.01.13	1	1.00×10 ⁴	6.31	6.31×10 ⁻²
		2	1.03×10 ⁴	6.43	6.62×10 ⁻²
		3	1.01×10 ⁴	5.68	5.74×10 ⁻²
最大值			-	6.43	6.62×10⁻²
标准限值 (DB33/2146-2018)			-	80	-
标准限值 (GB31572-2015)			-	60	-
是否符合			-	符合	-

执行标准：《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 1 大气污染物排放限值，《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值。

3.2 无组织废气检测

验收监测期间，厂界无组织废气污染物非甲烷总烃排放浓度最大值均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表 6 企业边界污染物浓度限值；厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放浓度最大值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCs 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值，具体监测结果见表 7-5~6，监测期间气象参数见表 7-7。

表 7-5 无组织废气检测结果

监测点位	监测日期	监测频次	监测结果
			非甲烷总烃 (mg/m ³)
上风向 WQ1	2023.01.12	1	0.96
		2	0.91
		3	0.77
	2023.01.13	1	0.82
		2	0.82
		3	0.90
下风向 WQ2	2023.01.12	1	1.16
		2	1.46
		3	1.26
	2023.01.13	1	1.87
		2	1.76
		3	1.58
下风向 WQ3	2023.01.12	1	1.33
		2	1.24
		3	1.38
	2023.01.13	1	1.42
		2	1.38
		3	1.39
下风向 WQ4	2023.01.12	1	1.19
		2	1.40
		3	1.45
	2023.01.13	1	1.34
		2	1.36
		3	1.39
最大值			1.87
标准限值			4.0
是否符合			符合
执行标准：《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表 6 企业边界污染物浓度限值。			

表 7-6 无组织废气监测结果

监测点位	监测日期	监测频次	监测结果
			非甲烷总烃 (mg/m ³)
厂区内车间外 WQ5	2023.01.12	1	2.12
		2	1.93
		3	1.84
	2023.01.13	1	1.90
		2	2.66
		3	2.46
最大值			2.66
标准限值			6
是否符合			符合
执行标准：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCs 无组织排放限值” 中的监控点处 1h 平均浓度值。			

表 7-7 监测期间气象参数

日期	采样频次	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气情况
2023.01.12	1	14.4	101.6	1.6	东南	晴
	2	20.9	101.0	1.6	东南	晴
	3	18.7	101.1	1.7	东南	晴
2023.01.13	1	17.7	101.1	1.4	东南	阴
	2	19.2	100.7	1.3	东南	阴
	3	19.2	100.6	1.4	东南	阴

4、噪声检测

验收监测期间，本项目厂界四周昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，具体监测结果见表 7-8。

表 7-8 厂界噪声监测结果

监测日期	监测点位	昼间 Leq dB (A)			是否符合
		测量时间	测量结果	监测标准	
2023.01.12	厂界东侧 (Z1)	08:47-08:48	54.6	65	符合
	厂界南侧 (Z2)	08:53-08:54	53.4	65	符合
	厂界西侧 (Z3)	08:58-08:59	60.7	65	符合
	厂界北侧 (Z4)	09:04-09:05	57.1	65	符合
监测时气象条件		天气晴，风速≤5m/s			

续表 7-8 厂界噪声监测结果

监测日期	监测点位	昼间 Leq dB (A)			是否符合
		测量时间	测量结果	监测标准	
2023.01.13	厂界东侧 (Z1)	08:55-08:56	55.3	65	符合
	厂界南侧 (Z2)	09:01-09:02	52.8	65	符合
	厂界西侧 (Z3)	09:07-09:08	61.2	65	符合
	厂界北侧 (Z4)	09:13-09:14	56.5	65	符合
监测时气象条件		天气阴, 风速≤5m/s			
执行标准: 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类标准。					

注: 表 7-2~8 中监测数据引自检测报告 (YLE20230034)。

5、总量控制要求

该项目核定污染物排放总量为: 化学需氧量 0.005t/a, VOCs 0.5t/a, 本项目打磨废水循环使用, 暂不外排。根据验收监测期间监测结果核算, 生产时间按 300 天核算, 项目固化废气、拉漆、烘干废气、烫芯废气产生的 VOCs 年排放量为 0.175 吨/年 (工作时间按 10 小时/天计)。符合批复总量控制要求。

表八 验收监测结论及建议

1、结论

(1) 废水监测结果及达标排放情况

验收监测期间，本项目打磨废水出口污染物 pH 值（范围）、悬浮物、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂排放浓度最大日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷排放浓度最大日均值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放限值。

(2) 废气监测结果及达标排放情况

验收监测期间，拉漆、烘干废气污染物非甲烷总烃、乙酸丁酯、乙酸乙酯排放浓度最大值均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 1 大气污染物排放限值；固化废气、烫芯废气污染物非甲烷总烃排放浓度最大值符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值。

验收监测期间，厂界无组织废气污染物非甲烷总烃排放浓度最大值均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表 6 企业边界污染物浓度限值；厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放浓度最大值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCs 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值。

(3) 厂界噪声监测结果及达标排放情况

验收监测期间，本项目厂界昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。

(4) 固体废物排放情况

一般废包装材料、边角料、废 BOPP 带、废打磨材料、泥渣由资源回收公司回收利用；废催化剂由原厂家回收利用；其他废包装桶、隔油浮渣、含油污泥、废油漆、废过滤棉、废活性炭委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门定时清运。

2、总结论

综上所述，宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目（先行）在建设严格执行竣工环保“三同时”制度，验收资料齐全，环保污染防治措施基本落实，监测报告中各项污染物指标均达到相应的排放标准及相关环境标准，符合竣工环境保护验收的相关要求。

3、建议

重点完善车间的密闭性，减少废气的无组织排放，加强对废气治理设施的维护、管理及正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。进一步落实环境风险防范措施，开展环境应急演练，确保环境安全。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称		宁波兴创户外用品有限公司年产300万根碳纤维管生产项目（先行）				项目代码		-		建设地点		宁海县深甽镇长洋村977号				
	行业类别（分类管理名录）		C2449 其他体育用品制造； C3473 照相机及器材制造				建设性质		<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> （迁建） <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 技术改造								
	设计生产能力		年产300万根碳纤维管				实际生产能力		年产100万根碳纤维管		环评单位		宁波奇英环保技术咨询有限公司				
	环评文件审批机关		宁波市生态环境局				审批文号		甬环宁建〔2022〕96号		环评文件类型		报告表				
	开工日期		2022.07				竣工日期		2022.10		排污许可证申领时间		-				
	环保设施设计单位		-				环保设施施工单位		-		本工程排污许可证编号		91330226MA7C57PQ92001X				
	验收单位		宁波兴创户外用品有限公司				环保设施监测单位		宁波市甬蓝检测有限公司		验收监测时工况		正常				
	投资总概算（万元）		1000				环保投资总概算（万元）		30		所占比例（%）		3				
	实际总投资（万元）		600				实际环保投资（万元）		30		所占比例（%）		5				
	废水治理（万元）		1.5	废气治理（万元）		25	噪声治理（万元）		0.5	固体废物治理（万元）		3	绿化及生态（万元）		0	其他（万元）	
新增废水处理设施能力		-				新增废气处理设施能力		-		年平均工作时		3000h					
运营单位		宁波兴创户外用品有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）			-		验收时间		2023.03				
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物		原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)			
	废水																
	化学需氧量																
	氨氮																
	石油类																
	废气																
	二氧化硫																
	烟尘																
	工业粉尘																
	氮氧化物																
	工业固体废物																
	与项目有关的其他特征污染物		VOCs					0.175	0.5		0.175	0.5					

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

宁波市生态环境局文件

甬环宁建〔2022〕96 号

关于《宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目环境影响报告表》的 审查意见

宁波兴创户外用品有限公司：

你单位报送的《环评文件审批申请表》及随文附送的《年产 300 万根碳纤维管生产项目环境影响报告表》（以下简称《环评报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等相关环保法律法规，经研究，现将审查意见函告如下：

一、根据你单位委托宁波奇英环保技术咨询有限公司编制的《环评报告表》结论，以及该项目环评行政许可公示

— 1 —

情况，原则同意项目《环评报告表》结论。《环评报告表》经审查后可作为该项目日常运行管理的环境保护依据。

建设项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求。

二、该项目选址在宁海县深甌镇长洋村 977 号，用地面积 3000 平方米，总投资 1000 万元，其中环保投资 30 万元。主要原材料为碳纤维布、玻纤布、BOPP 带、脱模剂、油性漆、水性漆、油性油墨，采用裁布、烫芯、卷管、缠带、固化、脱模、裁切、抛光、打磨、拉漆、烘干、印刷等工艺，项目建成后，产能为年产 300 万根碳纤维管。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，实施清洁生产，减少各种污染物的产生量和排放量，重点落实以下环保措施：

1、拉漆工序须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》的水性涂料和溶剂型涂料，拉漆车间调漆、拉漆、烘干工艺须设置在密闭的一体化车间内，并保持微负压状态，采取吸附燃烧等高效治理措施，废气经收集后与印刷废气合并处理达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 1 大气污染物排放限值要求，并通过不低于 15 米排气筒高空排放。固化废气经集气罩收集，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值及表 9 企业边界大气污染物浓度限

值，并通过不低于 15 米排气筒高空排放。厂区内挥发性有机物无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。

2、生活污水经化粪池预处理、打磨废水经混凝沉淀处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 浓度限值，纳管至宁海县深圳镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后外排。

3、该项目产生的沾有油及有机物的废包装桶、隔油浮渣、废油漆、废过滤棉、废活性炭等属于危险废物，危险废物暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求落实防腐、防渗、防雨等措施，并按《危险废物转移联单管理办法》送有资质单位处置；废催化剂由原厂家回收，其它一般固废按资源化、无害化处置。

4、加强内部管理，合理布局厂房，选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值。

四、按照《环评报告表》结论，该项目污染物外排环境量控制为： $VOC_s \leq 0.5$ 吨/年， $COD_{Cr} \leq 0.005$ 吨/年。

五、制定突发环境事件应急预案，并在项目投运前报生

态环境主管部门备案，定期开展应急演练。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报审项目环评文件。项目建设、运行过程中产生不符合经报审的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

七、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，该项目方可正式投入生产。



附件 2. 宁波兴创户外用品有限公司监测期间生产工况

附件 2. 宁波兴创户外用品有限公司监测期间生产工况

工况证明

我公司委托宁波市甬蓝检测有限公司对本项目年产 300 万根碳纤维管生产项目（先行）进行验收监测，本公司实行 10 小时工作制，一年共生产 300 天，实际年生产 100 万根碳纤维管。

监测期间（2023 年 1 月 12 日），我公司共生产碳纤维管（当日产量）0.29 万根，监测期间（2023 年 1 月 13 日），我公司共生产碳纤维管（当日产量）0.28 万根。符合监测工况要求。

公司名称：_____

日期：_____

2023 年 1 月 13 日



附件 3. 宁波兴创户外用品有限公司监测方案

宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目（先行）验收监测方案

一、有组织废气

1.1 执行标准：本项目废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018），《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值。

1.2 监测内容：

监测对象	废气名称	监测点位	监测因子	监测频次
有组织废气	固化废气、拉漆、烘干废气和烫芯废气	处理设施进出口	非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯	3 次/天，共 2 天

二、无组织废气

2.1 执行标准：《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOC_s 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值。

2.2 监测内容：

监测对象	废气名称	监测点位	监测因子	监测频次
无组织废气	固化废气、拉漆、烘干废气和烫芯废气	企业厂界四周各设置 1 个监测点位	非甲烷总烃	3 次/天，共 2 天
		厂区内车间外设置 1 个监测点位	非甲烷总烃	

备注：同步记录气象参数

三、生产废水

3.1 执行标准：《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放限值。

3.2 监测内容：

监测点位	污染物名称	监测频次
打磨废水处理设施进出口	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、阴离子表面活性剂	4 次/天，共 2 天

四、厂界噪声

4.1 执行标准：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 3 类标准。

4.2 监测内容：

污染物名称	监测点位	监测频次
厂界噪声	厂界四周各设 1 个监测点位	昼间 1 次，共 2 天

注：监测时应符合竣工验收监测工况要求。

附件 4. 宁波兴创户外用品有限公司检测报告



宁波市甬蓝检测有限公司

检测报告

TEST REPORT

(甬蓝检测) 第 YLE20230034 号

项目名称: 宁波兴创户外用品有限公司废水、废气、噪声检测

委托单位: 宁波兴创户外用品有限公司

报告编制 李薇薇

审核人 何年平

批准人 周政政 (授权签字人)

报告日期 2023-01-31



说 明

- 一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖宁波市甬蓝检测有限公司红色检测报告专用章及其骑缝章均无效；
- 二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖宁波市甬蓝检测有限公司红色检测报告专用章均无效；
- 三、未经同意本报告不得用于广告宣传；
- 四、由委托方采样送检的样品，本报告仅对来样负责；
- 五、本报告正文共 6 页，一式 3 份，发出报告与留存报告的正文一致；
- 六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向宁波市甬蓝检测有限公司提出。

地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道堤树路 9 号

邮编：315600

电话：0574-65582860

传真：0574-65582860

委托方

样品类别 废水、废气、噪声

委托单位及地址 宁波兴创户外用品有限公司 (宁海县深甬镇长洋村 977 号)

受检单位及地址 宁波兴创户外用品有限公司 (宁海县深甬镇长洋村 977 号)

采样地点 宁海县深甬镇长洋村 977 号 (宁波兴创户外用品有限公司)

采样日期 2023 年 1 月 12 日-1 月 13 日

检测单位 宁波市甬蓝检测有限公司 (浙江省宁波市宁海县桃源街道堤树路 9 号)

检测日期 2023 年 1 月 12 日-1 月 17 日

检测方法 pH 值: 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020

悬浮物: 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989

化学需氧量: 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

氨氮: 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

总磷: 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989

石油类: 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018

阴离子表面活性剂: 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法

GB/T 7494-1987

非甲烷总烃: 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法

HJ 38-2017

乙酸乙酯: 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-

质谱法 HJ 734-2014

乙酸丁酯: 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-

质谱法 HJ 734-2014

非甲烷总烃: 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法

HJ 604-2017

工业企业厂界环境噪声: 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

评价标准 /

检测结果

表 1 生产废水检测结果 (单位: 除 pH 值无量纲, 其余为 mg/L)

采样 点位	采样 日期	采 样 频 次	样 品 性 状	检测项目						
				pH 值	悬浮物	化学需 氧量	氨氮	总磷	石油类	阴离子表面 活性剂
打磨废水 处理设施 进口 FS1	2023. 01.12	1	微灰微浊	7.2	344	304	1.43	0.26	0.06	0.246
		2	微灰微浊	7.5	359	299	1.30	0.18	0.09	0.208
		3	微灰微浊	6.8	341	310	1.55	0.22	0.06	0.237
		4	微灰微浊	7.6	376	334	1.72	0.34	0.10	0.225
	日均值 (范围)			6.8~7.6	355	312	1.50	0.25	0.08	0.229
	2023. 01.13	1	微灰微浊	6.7	367	307	1.62	0.16	0.12	0.218
		2	微灰微浊	7.0	377	302	1.55	0.22	0.08	0.257
		3	微灰微浊	7.3	348	316	1.27	0.30	0.10	0.230
		4	微灰微浊	6.5	351	340	1.43	0.11	0.15	0.247
	日均值 (范围)			6.5~7.3	361	316	1.47	0.20	0.11	0.238
打磨废水 处理设施 出口 FS2	2023. 01.12	1	无色透明	6.9	58	131	0.519	0.12	<0.06	0.076
		2	无色透明	6.6	46	111	0.496	0.24	<0.06	0.078
		3	无色透明	7.1	55	102	0.634	0.18	<0.06	0.083
		4	无色透明	7.5	51	114	0.402	0.22	<0.06	0.086
	日均值 (范围)			6.6~7.5	52	114	0.513	0.19	<0.06	0.081
	2023. 01.13	1	无色透明	7.2	42	126	0.440	0.10	<0.06	0.098
		2	无色透明	7.7	62	108	0.503	0.16	<0.06	0.093
		3	无色透明	7.4	49	96	0.485	0.12	<0.06	0.081
		4	无色透明	6.8	51	112	0.451	0.08	<0.06	0.086
	日均值 (范围)			6.8~7.7	51	110	0.470	0.12	<0.06	0.090

此页以下空白

表 2 有组织废气检测结果

采样点位	采样日期	采样频次	标干流量 (m³/h)	非甲烷总烃		乙酸丁酯*		乙酸乙酯*	
				排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
固化废气、油漆废气、滤芯废气处理设施进口 YQ1	2023.01.12	1	8.57×10³	32.6	0.279	0.358	3.07×10³	7.63	6.54×10²
		2	8.54×10³	33.1	0.283	0.311	2.66×10³	7.19	6.14×10²
		3	8.75×10³	37.7	0.330	0.348	3.04×10³	7.38	6.46×10²
	2023.01.13	1	9.08×10³	29.0	0.263	0.421	3.82×10³	7.41	6.73×10²
		2	8.69×10³	35.5	0.308	0.366	3.18×10³	7.20	6.26×10²
		3	8.61×10³	36.1	0.311	0.402	3.46×10³	7.49	6.45×10²
固化废气、油漆废气、滤芯废气处理设施出口 YQ2 (15m)	2023.01.12	1	1.02×10⁴	4.93	5.03×10⁻²	0.047	4.79×10⁴	0.639	6.52×10³
		2	9.83×10³	5.27	5.18×10⁻²	0.019	1.87×10⁴	0.624	6.13×10³
		3	9.72×10³	6.20	6.03×10⁻²	0.033	3.21×10⁴	0.645	6.27×10³
	2023.01.13	1	1.00×10⁴	6.31	6.31×10⁻²	0.028	2.80×10⁴	0.589	5.89×10³
		2	1.03×10⁴	6.43	6.62×10⁻²	0.037	3.81×10⁴	0.629	6.48×10³
		3	1.01×10⁴	5.68	5.74×10⁻²	0.038	3.84×10⁴	0.582	5.88×10³
最大值				6.43	6.62×10⁻²	0.047	4.79×10⁴	0.645	6.52×10³

备注：***乙酸乙酯、乙酸丁酯项目日本单位无资质，经客户允许分包给浙江中通检测科技有限公司，检测报告编号为：ZTE202300817，CMA 证书编号为 211121341561。

此页以下空白

1 10/10 10/10 10/10

表 3 无组织废气检测结果

采样点位	采样日期	采样频次	检测结果
			非甲烷总烃 (mg/m ³)
上风向 WQ1	2023.01.12	1	0.96
		2	0.91
		3	0.77
	2023.01.13	1	0.82
		2	0.82
		3	0.90
下风向 WQ2	2023.01.12	1	1.16
		2	1.46
		3	1.26
	2023.01.13	1	1.87
		2	1.76
		3	1.58
下风向 WQ3	2023.01.12	1	1.33
		2	1.24
		3	1.38
	2023.01.13	1	1.42
		2	1.38
		3	1.39
下风向 WQ4	2023.01.12	1	1.19
		2	1.40
		3	1.45
	2023.01.13	1	1.34
		2	1.36
		3	1.39
最大值			1.87

此页以下空白

表 4 无组织废气检测结果

采样点位	采样日期	采样频次	检测结果
			非甲烷总烃 (mg/m ³)
车间外 WQ5	2023.01.12	1	2.12
		2	1.93
		3	1.84
	2023.01.13	1	1.90
		2	2.66
		3	2.46
最大值			2.66

表 5 采样期间气象参数


采样日期	采样频次	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气情况
2023.01.12	1	14.4	101.6	1.6	东南	晴
	2	20.9	101.0	1.6	东南	晴
	3	18.7	101.1	1.7	东南	晴
2023.01.13	1	17.7	101.1	1.4	东南	阴
	2	19.2	100.7	1.3	东南	阴
	3	19.2	100.6	1.4	东南	阴

表 6 厂界噪声检测结果

检测点位	检测日期	昼间 Leq dB (A)	
		测量时间	测量结果
厂界东侧 Z1	2023.01.12	08:47-08:48	54.6
厂界南侧 Z2		08:53-08:54	53.4
厂界西侧 Z3		08:58-08:59	60.7
厂界北侧 Z4		09:04-09:05	57.1
检测时气象条件		天气晴, 风速≤5m/s	
厂界东侧 Z1	2023.01.13	08:55-08:56	55.3
厂界南侧 Z2		09:01-09:02	52.8
厂界西侧 Z3		09:07-09:08	61.2
厂界北侧 Z4		09:13-09:14	56.5
检测时气象条件		天气阴, 风速≤5m/s	


此页以下空白

测点示意图

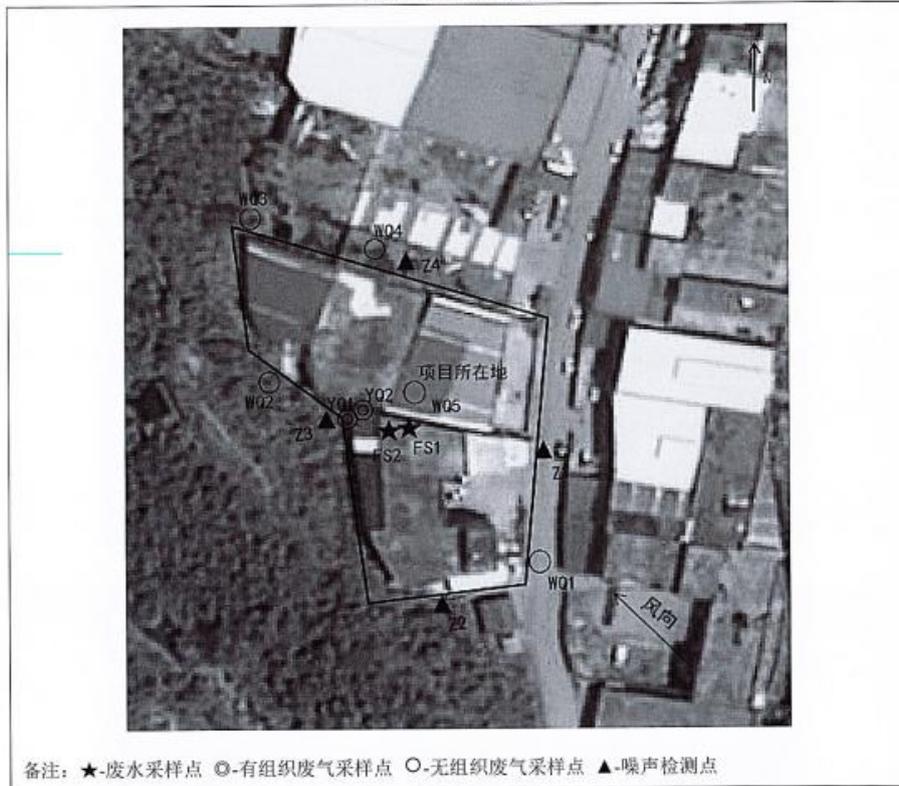

END

附件 5. 宁波兴创户外用品有限公司危险固废处置协议与危废仓库图





甲方：宁波兴创户外用品有限公司

乙方：宁波市北仑环保固废处置有限公司

依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及其他现行的有关法律、法规，遵循平等、公平和诚信的原则，甲方将其产生的工业废物委托乙方处置，为明确工业废物委托处置过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方协商，特订立本合同。

第一条 委托处置内容、收费和支付要求

1.1 本合同签订时，甲方需预缴纳处置费 1500 元（大写：壹仟伍佰元整），实际处置废物时，收费总额不超过 1500 元的，按 1500 元收费；超过 1500 元的，超过部分需另外缴费。

1.2 参照宁波市物价局制定的甬价费[2004]2 号文件收费标准，并根据不同废物的处置风险、难易程度和成本等情况，经双方协商，确定处置费（不含运输费）如下：

序号	废物名称	废物代码	处置方式	年产生量 (吨)	处置费(不含运 输费)(元/吨)
1	废煤油空桶	900-249-08	焚烧	0.01	4000
2	废包装空桶(沾染化 学品)	900-041-49	焚烧	0.5	4000
3	隔油浮渣	900-210-08	焚烧	0.02	3000
4	含油污泥	900-210-08	焚烧	0.3	3000
5	废油漆	900-299-12	焚烧	0.04	3000
6	废过滤棉	900-041-49	焚烧	0.07	3000
7	废活性炭	900-039-49	焚烧	0.5	4000
合计				1.44	

备注：以上价格为不含税价。

1.3 实际重量按转移联单中计量为准。

1.4 甲方应在开票后次月 25 日前结清当月处置费用。

第二条 双方权利与义务



2.1 甲方的权利与义务

2.1.1 甲方应为乙方的采样和处置提供必要的资料与便利,并分类报清废物成分和理化性质。乙方在废物处置过程中,由于甲方隐瞒废物成分或在废物包装中夹带易燃易爆品或剧毒化学品等而发生的事故,甲方应承担相应的责任,并赔偿事故所造成的损失。

2.1.2 如果甲方委托乙方处置的工业废物的种类、数量、成分、含量以及物理化学性质、毒性等发生变化,应及时向乙方提供书面说明,否则因此产生的一切责任由甲方承担。

2.1.3 合同生效后甲方应在全国固体废物和化学品管理信息系统(网址 <http://gfmh.meescc.cn/solidPortal/#/>)进行危废申报登记。

2.1.4 甲方有责任对废物进行分类并按环保规范进行包装,采取降低废物危害性的措施,并有责任根据环保法规要求,在废物的包装表面张贴符合标准的标签。甲方的包装和标签若不符合环保法规要求,乙方有权拒绝接收,并要求甲方赔偿误工损失200元/次。

2.1.5 甲方收到转移联单并在废物产生单位信息一栏盖章后,应在3日内将转移联单后三联快递寄回乙方,便于乙方按环保要求进行整理归档。

2.1.6 甲方需提前通知乙方运输的具体时间,且需委托具有资质的运输公司将废物运至乙方厂区指定位置,装车和运输过程的风险、责任由甲方承担。

2.2 乙方的权利与义务

乙方对甲方要求委托处置的工业废物,将严格按照工业废物处置的有关规定以及国家的相关法律、法规、标准进行处置,乙方化验单作为合同附件,实际接收时废物指标如变动超过20%,乙方有权要求变更合同或不予接收。

第三条 双方约定的其他事项

3.1 如果废物转移审批未获得环保部门的批准,本合同自动终止。

3.2 在乙方焚烧炉年度检修期间,乙方不能够保证及时接收甲方的废物。

3.3 合同执行期间,如因法规变更、许可证变更、主管机关要求或其他不可抗力等原因,导致乙方无法接收或处置某类废物时,乙方可停止该类废物的接收和处置工作。



并且不承担由此带来的一切责任。

3.4 如果甲方未按合同要求如期支付处置费，乙方有权暂停甲方废物接收。

3.5 甲乙双方均应遵守反商业贿赂条例，不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益。

3.6 甲方指定本公司人员郭玮为甲方的工作联系人，电话 15168516008；乙方指定本公司人员朱雅为乙方的工作联系人，电话 86784992，负责双方的联络协调工作。

3.7 本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。如协商不成时，双方同意由乙方所在地法院管辖处理。

3.8 未尽事宜，双方协商解决。

3.9 《废物运输安全管理协议》（附件 1）为本合同组成部分，具有和合同同等法律效力。本合同自双方签字或盖章之日起生效，合同有效期为壹年。壹式肆份，甲乙双方各贰份。

甲方：（签章）
宁波兴创户外用品
有限公司
住所：浙江省宁波市宁海县
深叻镇长洋村 977 号

法定代表人：郭玮
或授权委托人：

开户银行：中国农业银行宁海深叻支行
帐号：39757001040010491

纳税人税号：91330226MA7C57PQ92
邮编：315600

电话：15168516008

传真：

签订日期：2023 年 2 月 28 日

签订地点：浙江省宁波市

乙方：（签章）
宁波市北仑环保固废处置
有限公司

住所：宁波北仑郭巨长浦
(邮寄地址：北仑区灵江路 366 号门户商务大楼 10 楼 1021)

法定代表人：
或授权委托人：合同专用章

开户银行：宁波银行北仑支行
帐号：51010122000154983

纳税人税号：913302066655770663
邮编：315833

电话：0574-86784989

传真：0574-86785000



废物运输安全管理协议

甲方：宁波兴创户外用品有限公司

乙方：宁波市北仑环保固废处置有限公司

一、目的

依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及其他现行的有关法律、法规，遵循平等、公平和诚信的原则，为明确工业废物运输过程中的职责，加强废物运输安全管理，经双方协商，就主合同中废物运输有关事宜，订立本协议，本协议是主合同的补充，与主合同具有同等的法律效应，合同双方必须严格遵守。

二、双方职责

(一) 甲方职责

- 1、甲方需委托具有资质的运输公司将主合同中的废物运至乙方厂区指定位置，运输公司在乙方厂区内的所有责任都由甲方承担。
- 2、甲方必须对所委托的运输公司资质人员等进行审查，确保车辆及人员符合国家法律法规要求。
- 3、甲方必须做好运输公司的运输监管工作，对运输整个过程的安全环保等责任负总责。
- 4、甲方必须做好运输公司人员教育工作，督促其严格遵守并执行乙方的各项规章制度，杜绝违章、违规行为。
- 5、在运输时发生安全事故，均由甲方与运输公司自行协商并负责上报和善后处理，并承担一切的赔偿责任，如事故影响到乙方正常生产经营或者给乙方造成损失的（包括政府部门的罚款等），应由甲方负责赔偿乙方的损失。
- 6、在乙方厂区的甲方或运输公司人员，应严格遵守乙方各项规章制度，如有违反，乙方有权按相关考核规定对甲方予以处罚。

处罚明细表

序号	条款	处罚标准（元）	备注
----	----	---------	----



1	入厂未签订《废物运输车辆入厂告知书》的	200元/人次	
2	进入乙方卸货区不佩戴劳保用品的	100元/人次	
3	在乙方厂区内非指定吸烟点吸烟的	200元/人次	
4	擅自离开卸货区域的	500元/人次	
5	不服从乙方人员管理、指挥的	500-1000元/人次	
6	在乙方厂区因危废包装不符合要求造成泄漏的	1000-5000元/次	累计3次,取消车辆入厂资格
7	车辆超速、与其它车辆抢道、逆向行驶、违章停车的	200-500元/次	累计3次,取消车辆入厂资格
8	其它违反管理制度的行为	100-1000元/次	

备注：相关条款由乙方进行解释。


(二) 乙方职责

- 1、乙方有权对甲方的违规行为按照相关规定及本协议进行处罚。
- 2、乙方有权对甲方和运输公司进行监督、检查和指导，对发现的问题和隐患有权要求及时整改。
- 3、乙方管理人员进行监督和检查时，发现甲方和运输公司有不符合或违反《废物运输车辆入厂告知书》中规定的，有权进行纠正或制止，并视情节给予处以罚金。
- 4、甲方委托运输公司屡次违反乙方厂纪厂规或造成严重后果的，乙方有权禁止该运输公司进入乙方厂区作业。

三、其它

- (一) 此安全管理协议壹式肆份，甲乙双方各贰份。
- (二) 有效期与《工业废物委托处置合同》一致。
- (三) 其他未尽事宜，参照法律法规相关条款执行，并由乙方负责解释。

甲方：宁波兴创户外用品有限公司


法定代表人：(签章) 

或委托授权人： 

签订日期：2023年2月28日

乙方：宁波市北仑环保固废处置有限公司

法定代表人：(签章) 

或委托授权人： 

签订地点：浙江省宁波市


危废仓库暂存图



附件 6. 宁波兴创户外用品有限公司突发环境事件应急预案备案表

附件 2

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

备案意见	宁波兴创户外用品有限公司突发环境事件应急预案（简本）备案文件已于 2023 年 05 月 29 日收讫，经形式审查，文件齐全，予以备案。 		
备案编号	330226-2023-030-L		
受理部门 负责人		经办人	

注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般及较小 L、较大 M、重大 H）及跨区域（T）表征字母组成。例如，浙江省杭州市余杭区**重大环境风险非跨区域企业环境应急预案 2015 年备案，是余杭区环境保护局当年受理的第 25 个备案，则编号为：330110-2015-025-H；如果是跨区域企业，则编号为 330110-2015-025-HT。

第二部分 宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目（先行）竣工环境保护验收意见

宁波兴创户外用品有限公司 年产 300 万根碳纤维管生产项目（先行） 竣工环境保护验收意见

2023 年 2 月 21 日，宁波兴创户外用品有限公司根据《年产 300 万根碳纤维管生产项目（先行）竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

宁波兴创户外用品有限公司位于宁波市宁海县深甽镇长洋村 977 号，占地面积为 3000m²。本项目有固化炉 2 台、自动拉漆机 1 台、拉漆房 1 间、自动无心磨床 2 台、自动研磨机 1 台等生产设备，项目建成后实现全厂年产 100 万根碳纤维管的生产规模。项目实际建设地点、建设内容与环评批复基本一致。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于 2022 年 6 月委托宁波奇英环保技术咨询有限公司编制了《宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目环境影响报告表》；宁波市生态环境局以“甬环宁建（2022）96 号”文件对该项目予以批复。本项目于 2022 年 7 月开工建设，环保设施于 2022 年 10 月竣工，并于 2022 年 10 月至 2023 年 2 月进行调试。

（三）投资情况

本项目二阶段实际总投资约 600 万元，其中环保投资约 30 万元，占投资总额的 5%。

（四）验收范围

本次验收的范围为宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目已建部分，为项目部分竣工环境保护（先行）验收。

二、工程变动情况

经现场核查，项目实际建设内容、生产规模未超出环评范围，生产工艺、污染防治措施与环评批复基本一致，本项目无重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

主要为打磨废水和生活污水。

本项目打磨废水经厂区污水处理设施（混凝沉淀）处理后回用于生产（或排放）；生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网后排放。

（二）废气

主要为固化废气、拉漆、烘干废气和烫芯废气。

本项目固化废气、烫芯废气经收集与拉漆、烘干废气经收集后一同通过干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理后由15米高排气筒排放。

（三）噪声

项目的噪声污染主要来源于磨床、空压机等设备的机械噪声。项目采用合理布局，选用低噪声设备等措施进行降噪。

（四）固体废物

本项目一般废包装材料、边角料、废BOPP带、废打磨材料、泥渣由资源回收公司回收利用；废催化剂由原厂家回收利用；其他废包装桶、隔油浮渣、含油污泥、废油漆、废过滤棉、废活性炭委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门定时清运。

（五）总量控制

本项目根据检测结果和实际生产工况核算，项目废水不外排；废气VOC_s排放总量未超过环评批复中要求控制值，符合总量控制要求。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物排放情况

1.废水

监测期间（2023年1月12日~1月13日），本项目打磨废水处理设施出口污染物pH值（范围）、悬浮物、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂排放浓度最大日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷排放浓度最大日均值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放限值；

2.废气

监测期间（2023年1月12日~1月13日），本项目拉漆、烘干废气污染物非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯排放浓度最大值符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1大气污染物排放限值，固化废气、烫芯废气污染物非甲烷总烃排放最大值均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。

监测期间（2023年1月12日~1月13日），本项目厂界无组织废气污染物非甲烷总烃排放浓度最大值均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6企业边界污染物浓度限值；厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放浓度最大值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”中的监控点处1h平均浓度值。

3.厂界噪声

监测期间（2023年1月12日~1月13日），本项目厂界噪声昼间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

五、工程建设对环境的影响

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环境保护设施均能正常运行。项目竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准；项目落实了各类固废的分类处置途径，实现了固废的综合利用和无害化处置；项目污染治理措施及排放落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

六、验收结论

本项目环保手续基本完备，已取得排污许可（排污登记号：91330226MA7C57PQ92001X）。经现场查验，宁波兴创户外用品有限公司年产300万根碳纤维管生产项目（先行）履行了环境影响评价制度，项目建设过程中执行了环境保护“三同时”制度，总体落实了环评报告表及其批复提出的各项环境保护措施，满足竣工环境保护验收条件，经审议验收组结论：项目已建部分竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

- 1、严格遵守环保法律法规，完善各项环境保护管理和监测制度，强化从事环保工作人员业务培训，重点完善车间的密闭性，减少废气的无组织排放，加强对废气治理设施的维护、管理及正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。
- 2、按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》相关要求，完善验收监测报告内容。完善竣工环保验收的相关手续，按规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

八、验收组成员信息表

参会人员名单				
	姓名	单位	身份证号码	电话
组长	郭志方	宁波兴创户外用品有限公司		1516788392
专家成员	王勤	宁波环境检测中心	无	130037102566
其他成员	陈丹蓉	宁波中南检测技术有限公司	-	18867878261

宁波兴创户外用品有限公司
 2018年 2月 21日



第三部分 宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目（先行）其他需要说明的事项

1. 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目（先行）环保设施于 2022 年 10 月竣工。宁波兴创户外用品有限公司委托宁波市甬蓝检测有限公司对宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目（先行）进行验收监测工作。按照检测委托合同，宁波市甬蓝检测有限公司提供废水、废气、噪声项目的监测服务。2023 年 2 月，宁波兴创户外用品有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》以及宁波市甬蓝检测有限公司出具“YLE20230034”检测报告，编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告；2023 年 2 月 21 日，宁波兴创户外用品有限公司组织成立本项目竣工环境保护验收工作组，验收工作组踏勘企业生产现场后，经认真讨论和审查，形成了如下验收意见：经现场查验，《宁波兴创户外用品有限公司年产 300 万根碳纤维管生产项目（先行）》环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，项目建设内容与项目环境影响报告表、及其批复基本一致，已落实了环保“三同时”和环境影响报告表及批复的各项环保要求，竣工环保验收条件基本具备。验收资料完整齐全，污染物达标排放、环保设施有效运行、

验收监测结论明确合理。验收工作组结论：该项目已建成部分竣工环境保护验收合格。

2. 其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

本建设项目运营期污染物为废水、废气、噪声、危险固废、一般固废、生活垃圾，企业已设有环保组织机构，完善环境管理台账记录。

（2）环境风险防范措施

本建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定要求制定环境风险应急预案，本项目已制定环境风险应急预案（备案编号：330226-2023-030-L）。

（3）环境监测计划

本建设项目环境影响报告表已制定环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施，无需说明。

3. 整改工作意见

根据验收意见，本项目已建成竣工验收合格，各项环保设施已基本落实到位，无相应整改。

宁波兴创户外用品有限公司

2023 年 5 月 30 日
