



**宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司**  
**年产 500 套板式家具、800 套石英石台面**  
**生产项目竣工环境保护验收报告**

建设单位:宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司

二〇二一年三月

建设单位法定代表人:\*\*\*

编制单位法定代表人:\*\*\*

项目负责人:\*\*\*

填表人:\*\*\*

建设单位: 宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司

电话: 136\*\*\*\*8893

邮编: 315600

地址: 宁海县岔路镇高坦村 107 号

编制单位: 宁波市甬蓝检测有限公司

电话: 0574-65358650

邮编: 315600

地址: 宁海县桃源街道堤树路 9 号

# 目 录

第一部分 宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目竣工环境保护验收监测报告表.....	1
表一 项目基本情况.....	1
表二 工程建设内容.....	3
表三 主要污染源、污染物处理和排放流程.....	8
表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定.....	9
表五 验收监测质量保证及质量控制.....	12
表六 验收监测内容.....	13
表七 生产工况及验收监测结果.....	14
表八 验收监测结论及建议.....	17
附件 1.宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司环评批复“甬环宁建（2020）310 号”.....	19
附件 2.宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司监测期间生产工况.....	22
附件 3.宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司生活污水去向说明.....	23
附件 4.宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司检测报告.....	24
附件 5.宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司监测方案.....	30
第二部分 宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目竣工环境保护验收意见.....	31
第三部分 宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目其他需要说明的事项.....	35

# 第一部分 宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目竣工环境保护验收监测报告表

表一 项目基本情况

建设项目名称	年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目				
建设单位名称	宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司				
建设项目性质	新建√ 改扩建 技改 迁建				
建设地点	宁海县岔路镇高坦村 107 号				
主要产品名称	板式家具、石英石台面				
设计生产能力	年产 500 套板式家具、800 套石英石台面				
实际生产能力	年产 500 套板式家具、800 套石英石台面				
建设项目环评时间	2020.11	开工建设时间	2020.12		
调试时间	2021.03	验收现场监测时间	2021.03.18-03.19		
环评报告表审批部门	宁波市生态环境局	环评报告表编制单位	宁波奇英环保技术咨询有限公司		
环保设施设计单位	-	环保设施施工单位	-		
投资总概算	300 万元	环保投资总概算	6 万元	比例	2%
实际总概算	300 万元	环保投资	6 万元	比例	2%
验收监测依据	<p>1、国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》；</p> <p>2、国家生态环境部 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告 2018 年 第 9 号）；</p> <p>3、浙江省人民政府令第 364 号《浙江省人民政府关于修改&lt;浙江省建设项目环境保护管理办法&gt;的决定》；</p> <p>4、浙江省环境保护厅办公室《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发〔2009〕76 号）；</p> <p>5、国环规环评〔2017〕4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；</p> <p>6、宁波奇英环保技术咨询有限公司《宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目环境影响报告表》；</p> <p>7、宁波市生态环境局《关于&lt;宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目环境影响报告表&gt;的审查意见》（甬环宁建〔2020〕310 号）；</p> <p>8、宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目验收监测方案。</p>				

验收监测评价  
标准、标号、  
级别、限值

### 1、废水

本项目生产用水为湿法作业及湿式除尘设备用水，废水进入沉淀池，经过沉淀捞渣后回用于生产，不外排，定期补充消耗；生活污水经化粪池处理后由宁海县岔路镇环境卫生所抽运。

### 2、废气

本项目废气为石材加工粉尘、木工粉尘、云石胶废气、热熔胶废气。木工粉尘经设备自带双筒布袋除尘设备处理后排放；石材加工粉尘采用湿法作业抑尘和水帘处理除尘；云石胶废气、热熔胶废气加强车间通风排放。厂界无组织废气污染物颗粒物、非甲烷总烃排放均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。具体详见表 1-1。

表 1-1 废气污染物排放标准

污染物	排放标准	无组织排放监控浓度限值 (mg/m <sup>3</sup> )
颗粒物	GB 16297-1996	1.0
非甲烷总烃		4.0

### 3、噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准。具体详见表 1-2。

表 1-2 厂界噪声执行标准

监测对象	项目	单位	限值	引用标准
厂界噪声	等效 A 声级	dB(A)	60（昼间）	（GB12348-2008） 2 类标准

### 4、固废

本项目产生的固体废弃物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发〔2009〕76 号）中的有关规定要求。一般工业固体废物执行《宁波市一般工业固体废物污染防治管理办法（试行）》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其相应标准修改单中规定。

表二 工程建设内容

### 1、项目基本概况

宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司利用自有的位于宁海县岔路镇高坦村 107 号的空置厂房作为生产用房，厂房建筑面积约 2000 平方米，项目总投资 300 万元。本项目板式家具生产设备为推拉锯、自动封边机、台钻等，工艺主要为下料、封边、钻孔等；石英石台面生产设备为红外线切割机、开孔机、翻面机、倒角机、抛光机、磨边机等，工艺为切割、打孔、倒角、磨边、抛光等；建设完成后形成年产 500 套板式家具、800 套石英石台面的生产能力。

企业于 2020 年 11 月委托宁波奇英环保技术咨询有限公司编制完成《宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目建设项目环境影响报告表》；2020 年 11 月 13 日，宁波市生态环境局以甬环宁建〔2020〕310 号文件对该项目予以批复。

目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

### 2、地理位置

宁海县东邻象山县，南接三门县，西界天台、新昌，北毗奉化，地理位置优越。象山港横贯东北，三门湾瀛环于东南，海岸线长达 176km<sup>2</sup>，港区开阔，水深浪静，不淤不冻。象山港插入县域内，全县拥有沿海码头 4 座，航运通达国内各沿海港口及长江中下游城市。34 省道（甬临线）、38 省道（象西线）和 74 省道（盛宁线）贯穿境内，甬台温高速公路和甬台温铁路由北向南穿过宁海县，交通便利，离杭州 261km，南距临海 76km，温州 282km。

宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司位于宁海县岔路镇高坦村 107 号。项目东北侧为空地；东南侧为小树林和老高坦居民区，居民区与石英石台面加工车间距离约 27m，与木加工车间距离约 60m；西北侧为宁海康美日用品有限公司；西南侧为高坦工业区在建厂房。厂区平面图详见图 2-1，地理位置图详见图 2-2。

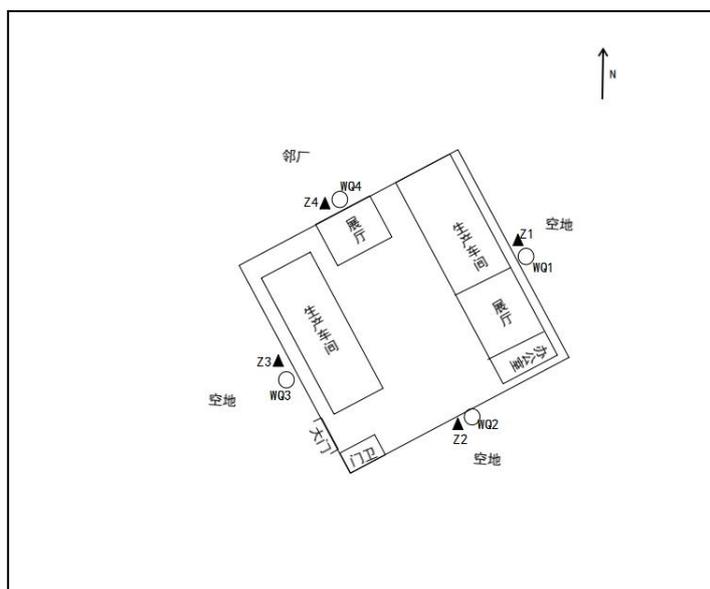


图 2-1 项目厂区平面图



图 2-2 项目地理位置图

### 3、建设内容和规模

本项目利用自有位于宁海县岔路镇高坦村 107 号的空置厂房作为生产用房，建筑面积约 2000m<sup>2</sup>，建成后形成年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目。项目生产内容与规模详见表 2-1。

表 2-1 项目生产内容与规模

产品名称	年产量	年运行时数
板式家具	500 套	2400h
石英石台面	800 套	2400h

### 4、主要生产设备详见表 2-2，主要原辅材详见表 2-3。

表 2-2 主要生产设备一览表

序号	设备名称	环评审批数量	实际设备数量	备注
1	推拉锯	2 台	2 台	-
2	自动封边机	2 台	2 台	-
3	台钻	1 台	1 台	-
4	排孔钻	1 台	1 台	-
5	气泵	1 台	1 台	-
6	储气罐	1 个	1 个	-
7	线上红外线切割机	1 台	1 台	-
8	双工位线上开孔机	1 台	1 台	-
9	翻面机	1 台	1 台	-
10	岩板倒角机	1 台	1 台	-
11	下挂条 45 度倒角切割机	1 台	1 台	-
12	挡水条圆弧抛光机	1 台	1 台	-
13	断料锯	1 台	1 台	-
14	台面直边上下侧面圆弧抛光机	1 台	1 台	-
15	除尘柜-离心静音型	1 台	1 台	-
16	异性石材曲直内圆磨边机	1 台	1 台	-
17	水刀	1 台	1 台	-
18	手工打磨机	5 台	5 台	-
19	水池	4 个	4 个	-

表 2-3 主要原辅材料消耗

序号	原辅材料名称	环评中年消耗量	实际年总消耗量	备注
1	细木工板	5000 张/年	5000 张/年	-
2	多层板	8000 张/年	8000 张/年	-
3	实木颗粒板	2000 张/年	2000 张/年	-
4	封边条	2 吨/年	2 吨/年	-
5	木工热熔胶	0.6 吨/年	0.6 吨/年	-
6	五金件	0.5 吨/年	0.5 吨/年	-
7	石英石石板	1200 张/年	1200 张/年	-
8	岩板	400 张/年	400 张/年	-
9	石英石专用胶	0.5 吨/年	0.5 吨/年	-
10	水磨片	0.01 吨/年	0.01 吨/年	-
11	切割片	0.025 吨/年	0.025 吨/年	-

5、主要生产工艺流程图详见图 2-3~4。

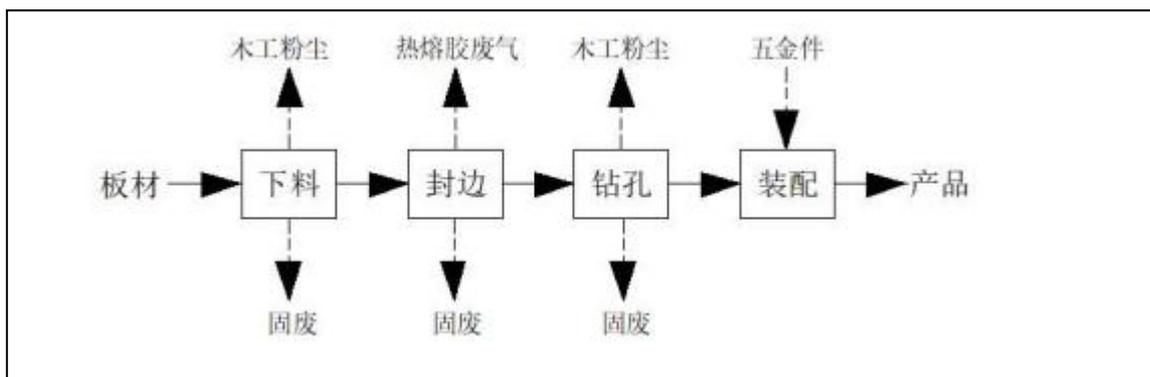


图 2-3 板式家具生产工艺流程图

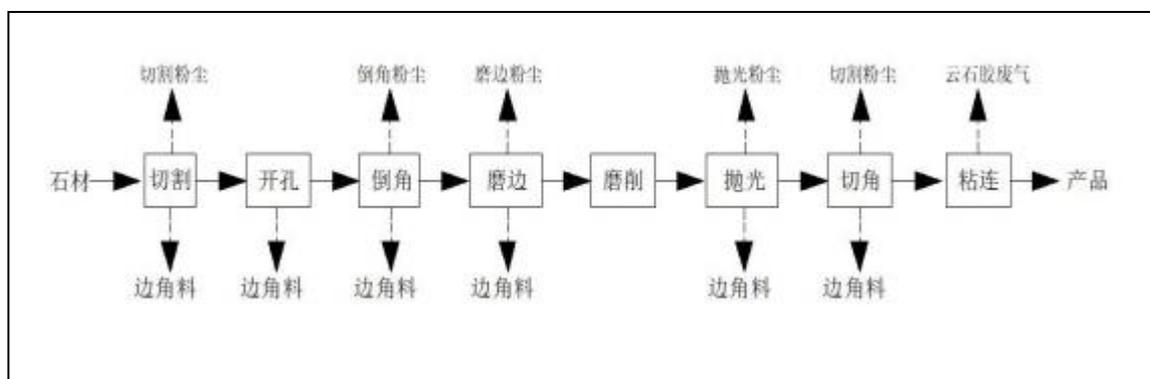


图 2-4 石英石台面生产工艺流程图

工艺说明：

板式家具生产工艺说明：

①下料：首先用锯机对木料进行下料，得到各个零部件，此过程会产生木工粉尘和木工边角料。

②封边：封边条为塑料制品，使用木工热熔胶将封边条与板材进行封边，该过程会产生有机废气和废封边条。

③钻孔：将板材按照设计图纸进行钻孔处理，会产生少量木工粉尘和木工废屑。

④装配：使用五金件进行装配，最后就是成品。

石英石台面生产工艺说明：

石材（石英石和岩板）原料按照设计要求，经过切割、开孔、倒角、磨边、抛光、切角等工艺，变成成品。

本项目所有石材（石英石和岩板）在加工过程中（切割、开孔、倒角、磨边、抛光）都需要持续加水，采取湿法作业，可以有效抑制粉尘的产生；仅有切割长短这个工艺需要干法切割（干法切割位于石材加工车间内部的一个半密闭小隔间，粉尘经负压收集后水帘处理），干法切割过程中安装有湿式除尘设备（即水帘）收集处理干法加工粉尘。

## 6、主要产污环节

（1）废水：主要为生活污水。

（2）废气：主要为石材加工粉尘、木工粉尘、云石胶废气、热熔胶废气。

（3）噪声：主要来自推拉锯、切割机等设备生产运行时产生的噪声。

（4）固废：主要为废包装材料、木加工废料、废封边条、木加工回收粉尘、废石材边角料、废切割打磨材料、沉渣、生活垃圾。

## 7、项目变动情况

本项目实际建设内容、生产规模、生产工艺、污染防治措施与环评批复基本一致，无重大变动情况。

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

**1、废气**

本项目废气主要为石材加工粉尘、木工粉尘、云石胶废气、热熔胶废气。木工粉尘经设备自带双筒布袋除尘设备处理后排放；石材加工粉尘采用湿法作业抑尘和水帘处理除尘；云石胶废气、热熔胶废气加强车间通风排放。废气来源及处理方式见表 3-1。

表 3-1 废气产生情况汇总

废气来源	废气污染物	排放方式	处理设施	排放去向
石材加工粉尘	颗粒物	间歇	湿法作业和水帘	大气
木工粉尘	颗粒物	间歇	双筒布袋除尘	大气
云石胶废气	非甲烷总烃	间歇	-	大气
热熔胶废气	非甲烷总烃	间歇	-	大气

**2、噪声**

本项目噪声主要来自推拉锯、切割机等生产设备生产运行时产生的噪声,通过关闭门窗、选用低噪声设备、安装减震垫等方式来达到减震降噪效果。

**3、固体废物**

本项目的固体废物主要来源产生情况见表 3-2。

表 3-2 固体废弃物产生及排放情况

序号	种类 (名称)	产生工序	属性	实际全年产生量 (吨/年)	实际情况
					利用处置方式及去向
1	废包装材料	原材料包装	一般固废	0.02	由资源回收公司回收利用
2	木加工废料	木加工	一般固废	4.342	
3	木加工回收粉尘	木加工废气处理	一般固废	0.233	
4	废石材边角料	石材加工	一般固废	18.5	
5	废切割打磨材料	水磨片、切割片更换	一般固废	0.03	
6	沉渣	沉淀池沉淀	一般固废	5.0	
7	废封边条	家具封边	一般固废	0.03	委托环卫部门统一清运
8	生活垃圾	员工生活	一般固废	3.0	

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

**1、建设项目环境影响报告表**

废水：近期生活污水经污水处理设施处理后达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准回用于绿化灌溉；远期待市政污水管网接通，生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管至宁海县城南污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 A 标准后排放。

废气：木工粉尘由设备自带除尘设备收集处理后车间无组织排放；石材加工粉尘采用湿式作业和水帘处理石材加工粉尘，并加强车间通排风；热熔胶废气加强车间通排风。

固废：废包装材料、木加工废料、木加工回收粉尘、废石材边角料、废切割打磨材料、沉渣由资源回收公司回收利用；废封边条、生活垃圾由环卫部门清运。

噪声：在选购设备时，应优先考虑低耗、低噪声设备；合理布局各机械设备，设备摆放尽量往车间中央靠；在布置设备时，在设备底部安装减震垫，生产时尽量保证车间门关闭；加强设备设施的维护和保养，确保设备设施的正常运行。

**2、关于《宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目》的审查意见 甬环宁建（2020）310 号**

根据你单位委托宁波奇英环保技术咨询有限公司编制的《环评报告表》结论，以及该项目环评行政许可公示情况，在项目符合产业政策、产业发展规划，选址符合主体功能区规划、城乡规划、土地利用总体规划等前提下，原则同意项目《环评报告表》结论。《环评报告表》经审查后可作为该项目日常运行管理的环境保护依据。

该项目选址在宁海县岔路镇高坦村 107 号，总投资 300 万元，其中环保投资 6 万元，项目建成后产能为年产 500 套板式家具、800 套石英石台面。

该项目木工粉尘、热熔胶废气、石材加工粉尘、云石胶废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表 2 新污染源大气污染物排放限值中的二级标准。

湿法作业及湿式除尘废水经处理后回用，不得外排。生活污水近期经处理后达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准后回用于绿化灌溉，不排放；远期待具备纳管条件，经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后排入市政污水管网，经宁海县城南污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。

该项目生产过程中产生的一般固废按“资源化、无害化”处置。

加强内部管理，合理布局厂房，选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

该项目实施后核定污染物排放总量为：VOCs0.006 吨/年，颗粒物 0.046 吨/年。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，若项目的性质、规模、地点、采

用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报审项目环评文件。项目建设、运行过程中产生不符合经报审的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按规定开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入生产。

### 3、本项目三同时落实情况

环评批复及审批意见及实际落实情况详见表 4-1：

表 4-1 环评批复及实际情况对照表

环评批复情况	实际落实情况
该项目选址在宁海县岔路镇高坦村 107 号，总投资 300 万元，其中环保投资 6 万元,项目建成后产能为年产 500 套板式家具、800 套石英石台面。	宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司利用自有的位于宁海县岔路镇高坦村 107 号的空置厂房作为生产用房，厂房建筑面积约 2000 平方米，项目总投资 300 万元。建设完成后形成年产 500 套板式家具、800 套石英石台面的生产规模。
该项目木工粉尘、热熔胶废气、石材加工粉尘、云石胶废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表 2 新污染源大气污染物排放限值中的二级标准。	本项目废气为石材加工粉尘、木工粉尘、云石胶废气、热熔胶废气。木工粉尘经设备自带双筒布袋除尘设备处理后排放；石材加工粉尘采用湿法作业抑尘和水帘处理除尘；云石胶废气、热熔胶废气加强车间通风排放。验收监测期间，厂界无组织废气污染物颗粒物、非甲烷总烃排放均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。
该项目生产过程中产生的一般固废按“资源化、无害化”处置。	本项目废包装材料、木加工废料、木加工回收粉尘、废石材边角料、废切割打磨材料、沉渣由资源回收公司回收利用；废封边条、生活垃圾由环卫部门清运。

续表 4-1 环评批复及实际情况对照表

环评批复情况	实际落实情况
<p>湿法作业及湿式除尘废水经处理后回用，不得外排。生活污水近期经处理后达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准后回用于绿化灌溉，不排放；远期待具备纳管条件，经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后排入市政污水管网，经宁海县城南污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。</p>	<p>本项目生产用水为湿法作业及湿式除尘设备用水，废水进入沉淀池，经过沉淀捞渣后回用于生产，不外排，定期补充消耗；生活污水经化粪池处理后由宁海县岔路镇环境卫生所抽运。</p>
<p>加强内部管理，合理布局厂房，选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准</p>	<p>验收监测期间，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2 类标准。</p>
<p>该项目实施后核定污染物排放总量为：VOCs0.006 吨/年，颗粒物 0.046 吨/年。</p>	<p>本项目根据企业实际原辅材料使用量，颗粒物排放总量为：0.0437t/a，VOCS 排放总量为 0.0057t/a。</p>
<p>根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报审项目环评文件。项目建设、运行过程中产生不符合经报审的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。</p>	<p>本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺未发生重大变动。</p>

表五 验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析方法

表 5-1 监测分析方法一览表

类别	项目名称	方法依据
废气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

2、质量控制与质量保证

(1) 环保设施竣工验收现场监测，按规定满足相应的工况条件，否则负责验收监测的单位立即停止现场采样和测试。

(2) 现场采样和测试严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因予以详细说明。

(3) 环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

(4) 环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按国家有关规定、监测技术规范和相关质量控制手册进行。

(5) 参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

(6) 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进现场前对气体分析、采样器流量计等进行校核。

(7) 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期的声级计。

(8) 验收监测的采样记录及分析测试结果，按照国家标准和技术规范有关要求进行处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

## 表六 验收监测内容

### 1、废气

无组织废气监测内容频次详见表 6-1。

表 6-1 无组织废气监测内容及频次

废气名称	监测点位	监测因子	监测频次
石材加工粉尘、木工粉尘、云石胶废气、热熔胶废气	企业厂界四周各设置 1 个监测点位	颗粒物、非甲烷总烃	3 次/天，共 2 天

备注：同步记录气象参数。


### 2、厂界噪声监测

在厂界布设 4 个监测点位，在厂界围墙外 1 米处，传声器位置高于墙体并指向声源处，监测 2 天，昼间 1 次。噪声监测内容见表 6-2。

表 6-2 监测内容及监测频次

污染物名称	监测点位	监测频次
厂界噪声	厂界四周各设 1 个监测点位	昼间 1 次，共 2 天

### 3、监测点位布置图

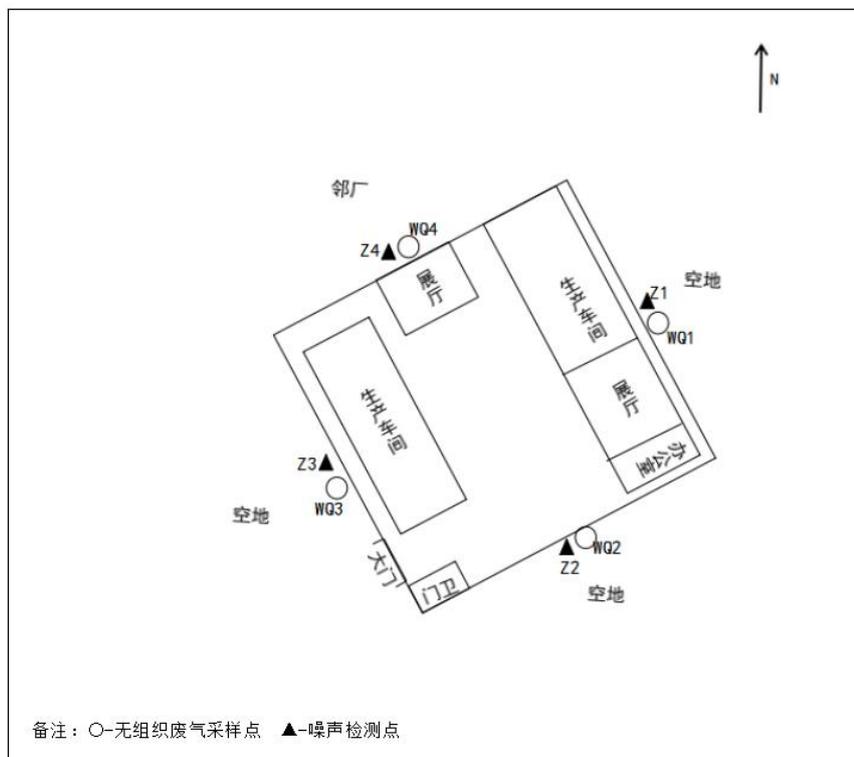

表七 生产工况及验收监测结果

1、生产工况

验收监测期间，依据建设项目相应产品在监测期间实际产量的工况记录方法，宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目的实际运行工况正常，且各项环保设施运行正常，具体生产工况情况如表 7-1 所示。

表 7-1 建设项目生产工况情况表

序号	产品名称	监测期间产量				设计年产量 (套/年)
		2021.03.18		2021.03.19		
		产量 (套)	负荷 (%)	产量 (套)	负荷 (%)	
1	板式家具	1.4	84.0	1.5	90.0	500
2	石英石台面	2.2	82.5	2.4	90.0	800

注：日设计产量等于全年设计产量除以全年工作天数，年工作时间 300 天。

验收监测结果：

2、废气监测

2.1 无组织废气监测

验收监测期间，厂界无组织废气污染物中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度最大值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。具体监测结果见表 7-2，监测期间气象参数见表 7-3。

表 7-2 无组织废气监测结果

监测点位	监测日期	监测频次	监测结果	
			颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> )	非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )
厂界东侧 WQ1	2021.03.18	1	0.317	0.71
		2	0.301	0.80
		3	0.351	0.75
	2021.03.19	1	0.385	0.85
		2	0.368	0.77
		3	0.334	0.81
厂界南侧 WQ2	2021.03.18	1	0.435	0.88
		2	0.418	0.83
		3	0.451	0.80
	2021.03.19	1	0.468	0.78
		2	0.435	0.73
		3	0.485	0.74

续表 7-2 无组织废气监测结果

监测点位	监测日期	监测频次	监测结果	
			颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> )	非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )
厂界西侧 WQ3	2021.03.18	1	0.435	0.71
		2	0.468	0.85
		3	0.485	0.82
	2021.03.19	1	0.401	0.82
		2	0.418	0.80
		3	0.452	0.74
厂界北侧 WQ4	2021.03.18	1	0.368	0.88
		2	0.351	0.83
		3	0.334	0.74
	2021.03.19	1	0.384	0.70
		2	0.368	0.76
		3	0.317	0.74
最大值			<b>0.485</b>	<b>0.88</b>
标准限值			<b>1.0</b>	<b>4.0</b>
是否符合			符合	符合
执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。				

表 7-3 监测期间气象参数

日期	频次	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气情况
2021.03.18	1	11.0	101.5	0.4	东南	阴
	2	15.4	101.3	0.3	东南	阴
	3	14.3	101.4	0.6	东南	阴
2021.03.19	1	12.5	101.4	0.9	东北	阴
	2	13.3	101.0	0.7	东北	阴
	3	15.4	100.9	1.0	东北	阴

注：表 7-2~4 中监测数据引自检测报告（YLE20210140）。

### 3、噪声

验收监测期间，本项目厂界四周昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，具体监测结果见表 7-4。

表 7-4 厂界噪声监测结果

监测点位	监测日期	昼间 Leq dB (A)	
		测量时间	测量结果
2021.03.18	厂界东侧 Z1	08:35-08:36	57.9
	厂界南侧 Z2	08:41-08:42	53.5
	厂界西侧 Z3	08:46-08:47	58.1
	厂界北侧 Z4	08:52-08:53	55.4
监测时气象条件		天气阴, 风速≤5m/s	
2021.03.19	厂界东侧 Z1	08:44-08:45	58.1
	厂界南侧 Z2	08:50-08:51	54.9
	厂界西侧 Z3	08:55-08:56	57.8
	厂界北侧 Z4	09:01-09:02	54.2
监测时气象条件		天气阴, 风速≤5m/s	
标准限值		60 dB (A)	
执行标准: 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类标准。			

注: 表 7-5 中监测数据引自检测报告 (YLE20210140)。

#### 4、总量控制要求

本项目根据企业实际原辅材料使用量, 颗粒物排放总量为: 0.0437t/a, VOCS 排放总量为 0.0057t/a, 符合总量控制要求。

表八 验收监测结论及建议

### 1、结论

#### (1) 废气监测结果及达标排放情况

验收监测期间，厂界无组织废气污染物颗粒物、非甲烷总烃排放浓度最大值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。

#### (2) 厂界噪声监测结果及达标排放情况

验收监测期间，本项目厂界四周昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准。

#### (3) 固体废物排放情况

本项目废包装材料、木加工废料、木加工回收粉尘、废石材边角料、废切割打磨材料、沉渣由资源回收公司回收利用；废封边条、生活垃圾由环卫部门清运。

### 2、总结论

综上所述，宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目在建设严格执行竣工环保“三同时”制度，验收资料齐全，环保污染防治措施基本落实，监测报告中各项污染物指标均达到相应的排放标准及相关环境标准，符合竣工环境保护验收的相关要求。

### 3、建议

加强车间管理，减少无组织废气的排放。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目					项目代码	-			建设地点	宁海县岔路镇高坦村 107 号		
	行业类别（分类管理名录）	C2110 木质家具制造 C3032 建筑用石加工					建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造						
	设计生产能力	年产 500 套板式家具、800 套石英石台面					实际生产能力	同设计能力			环评单位	宁波奇英环保技术咨询有限公司		
	环评文件审批机关	宁波市生态环境局					审批文号	甬环宁建〔2020〕310 号			环评文件类型	报告表		
	开工日期	2020.12					竣工日期	2021.02			排污许可证申领时间	-		
	环保设施设计单位	-					环保设施施工单位	-			本工程排污许可证编号	-		
	验收单位	宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司					环保设施监测单位	宁波市甬蓝检测有限公司			验收监测工况	正常		
	投资总概算（万元）	300					环保投资总概算（万元）	6			所占比例（%）	2		
	实际总投资（万元）	300					实际环保投资（万元）	6			所占比例（%）	2		
	废水治理（万元）	2	废气治理（万元）	3	噪声治理（万元）	0.5	固体废物治理（万元）	0.5			绿化及生态（万元）	0	其他（万元）	0
新增废水处理设施能力	-					新增废气处理设施能力	-			年平均工作时	2400h			
运营单位	宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）				-			验收时间	2021.03	
污染物排放达总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)	
	废水													
	化学需氧量													
	氨氮													
	石油类													
	废气													
	二氧化硫													
	烟尘													
	工业粉尘													
	氮氧化物													
	工业固体废物													
	与项目有关的其他特征污染物													

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9) = (4)-(5)-(8)-(11) + (1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# 宁波市生态环境局文件

甬环宁建（2020）310号

## 关于《宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司 年产 500 套板式家具 800 套石英石台面生 产项目环境影响报告表》的审查意见

宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司：

你单位报送的《环评文件建设单位申请书》以及随文附送的《年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目环境影响报告表》（以下简称《环评报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关环保法律法规，经研究，现将审查意见函告如下：

一、根据你单位委托宁波奇英环保技术咨询有限公司编制的《环评报告表》结论，以及该项目环评行政许可公示情况，在项目符合产业政策、产业发展规划，选址符合主体

功能区规划、城乡规划、土地利用总体规划等前提下，原则同意项目《环评报告表》结论。《环评报告表》经审查后可作为该项目日常运行管理的环境保护依据。

二、该项目选址在宁海县岔路镇高坦村 107 号，总投资 300 万元，其中环保投资 6 万元，项目建成后产能为年产 500 套板式家具、800 套石英石台面。

三、项目建设应落实以下环保措施：

1、该项目木工粉尘、热熔胶废气、石材加工粉尘、云石胶废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的表 2 新污染源大气污染物排放限值中的二级标准。

2、湿法作业及湿式除尘废水经处理后回用，不得外排。生活污水近期经处理后达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》(GB/T25499-2010)标准后回用于绿化灌溉，不排放；远期待具备纳管条件，经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准后排入市政污水管网，经宁海县城南污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排放。

3、该项目生产过程中产生的一般固废按“资源化、无害化”处置。

4、加强内部管理，合理布局厂房，选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准。

5、该项目实施后核定污染物排放总量为：VOCs0.006吨/年，颗粒物0.046吨/年。

四、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报审项目环评文件。项目建设、运行过程中产生不符合经报审的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，该项目方可正式投入生产。



## 工况证明

我公司委托宁波市甬蓝检测有限公司对本项目年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目进行验收监测，本公司实行 8 小时工作制，一年共生产 300 天，计划年产 500 套板式家具、800 套石英石台面。

监测期间（2021 年 3 月 18 日），我公司共生产板式家具（当日产量）1.4 套，共生产石英石台面（当日产量）2.2 套，监测期间（2021 年 3 月 19 日），我公司共生产板式家具（当日产量）1.5 套，共生产石英石台面（当日产量）2.4 套，符合监测工况要求。

公司名称：\_\_\_\_\_ (盖章)

日期：2021 年 3 月 19 日



## 生活污水去向证明

宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具 800 套石英石台面生产项目，位于宁海县岔路镇高坦村 107 号。项目生活污水经化粪池预处理后，由企业主动联系环卫部门后，环卫部门再进企业抽运。

特此证明！

岔路镇人民政府环境卫生所





191112052450

宁波市甬蓝检测有限公司

# 检测报告

## TEST REPORT

(甬蓝检测) 第 YLE20210140 号

项目名称: 宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司废气、噪声检测

委托单位: 宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司

报告编制 陈丹莹

审核人 张愉

批准人 周琳琳 (授权签字人)

报告日期 2021-03-21



## 说 明

- 一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖宁波市甬蓝检测有限公司红色检测报告专用章及其骑缝章均无效；
- 二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖宁波市甬蓝检测有限公司红色检测报告专用章均无效；
- 三、未经同意本报告不得用于广告宣传；
- 四、由委托方采样送检的样品，本报告仅对来样负责；
- 五、本报告正文共 4 页，一式 3 份，发出报告与留存报告的正文一致；
- 六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向宁波市甬蓝检测有限公司提出。

地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道堤树路 9 号

邮编：315600

电话：0574-65582860

传真：0574-65582860

样品类别 废气、噪声

委托单位及地址 宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司（宁海县岔路镇高坦村 107 号）

受检单位及地址 宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司（宁海县岔路镇高坦村 107 号）

采样地点 宁海县岔路镇高坦村 107 号（宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司）

采样日期 2021 年 3 月 18 日-3 月 19 日

检测单位 宁波市甬蓝检测有限公司（浙江省宁波市宁海县桃源街道堤树路 9 号）

检测日期 2021 年 3 月 18 日-3 月 20 日

检测方法 非甲烷总烃：环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法  
HJ 604-2017

总悬浮颗粒物：环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修  
改单

工业企业厂界环境噪声：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

评价标准 /

\*\*\*此页以下空白\*\*\*

# 检测结果

表1 无组织废气检测结果

采样 点位	采样 日期	采样 频次	采样点位坐标	检测结果	
				非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )	总悬浮颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> )
厂界东侧 WQ1	2021.03.18	1	纬度: 29°11'40" 经度: 121°18'48"	0.71	0.317
		2		0.80	0.301
		3		0.75	0.351
	2021.03.19	1	纬度: 29°11'40" 经度: 121°18'48"	0.85	0.385
		2		0.77	0.368
		3		0.81	0.334
厂界南侧 WQ2	2021.03.18	1	纬度: 29°11'40" 经度: 121°18'48"	0.88	0.435
		2		0.83	0.418
		3		0.80	0.451
	2021.03.19	1	纬度: 29°11'40" 经度: 121°18'48"	0.78	0.468
		2		0.73	0.435
		3		0.74	0.485
厂界西侧 WQ3	2021.03.18	1	纬度: 29°11'40" 经度: 121°18'48"	0.71	0.435
		2		0.85	0.468
		3		0.82	0.485
	2021.03.19	1	纬度: 29°11'40" 经度: 121°18'48"	0.82	0.401
		2		0.80	0.418
		3		0.74	0.452
厂界北侧 WQ4	2021.03.18	1	纬度: 29°11'40" 经度: 121°18'48"	0.88	0.368
		2		0.83	0.351
		3		0.74	0.334
	2021.03.19	1	纬度: 29°11'40" 经度: 121°18'48"	0.70	0.384
		2		0.76	0.368
		3		0.74	0.317
最大值				<b>0.88</b>	<b>0.485</b>

\*\*\*此页以下空白\*\*\*

表 2 采样期间气象参数


采样日期	采样频次	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气情况
2021.03.18	1	11.0	101.5	0.4	东南	阴
	2	15.4	101.3	0.3	东南	阴
	3	14.3	101.4	0.6	东南	阴
2021.03.19	1	12.5	101.4	0.9	东北	阴
	2	13.3	101.0	0.7	东北	阴
	3	15.4	100.9	1.0	东北	阴

表 3 厂界噪声检测结果

检测点位	检测日期	检测点位坐标	昼间 Leq dB (A)	
			测量时间	测量结果
厂界东侧 Z1	2021.03.18	纬度: 29°11'40" 经度: 121°18'48"	08:35-08:36	57.9
厂界南侧 Z2			08:41-08:42	53.5
厂界西侧 Z3			08:46-08:47	58.1
厂界北侧 Z4			08:52-08:53	55.4
检测时气象条件		天气阴, 风速≤5m/s		
厂界东侧 Z1	2021.03.19	纬度: 29°11'40" 经度: 121°18'48"	08:44-08:45	58.1
厂界南侧 Z2			08:50-08:51	54.9
厂界西侧 Z3			08:55-08:56	57.8
厂界北侧 Z4			09:01-09:02	54.2
检测时气象条件		天气阴, 风速≤5m/s		

\*\*\*此页以下空白\*\*\*

### 测点示意图

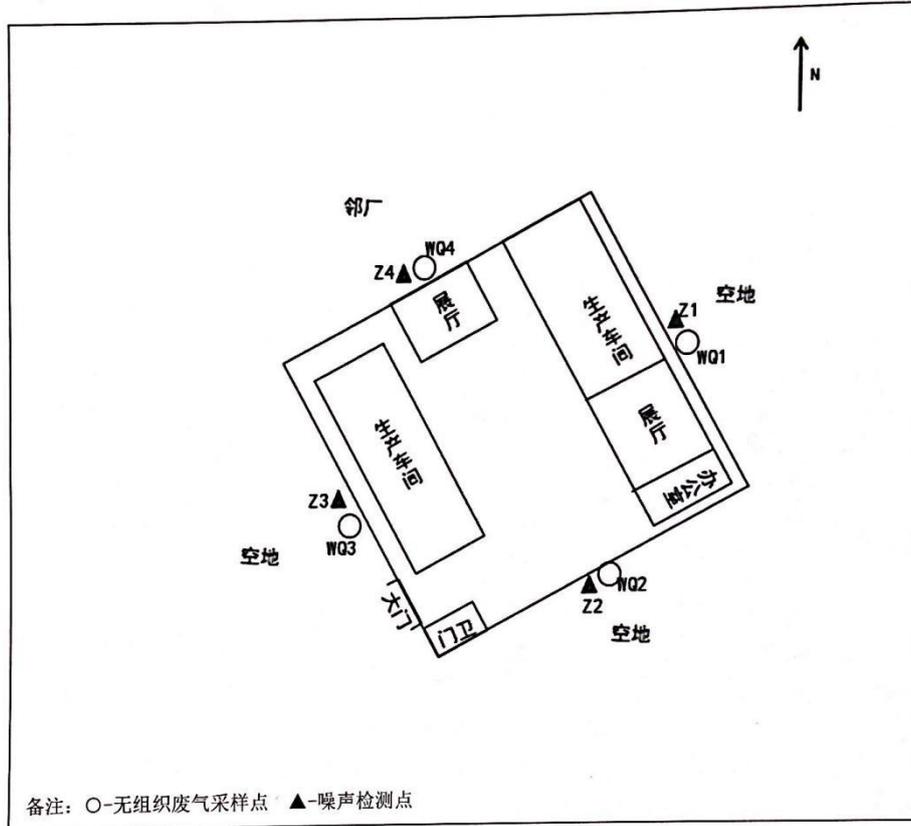

END



附件 5. 宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司监测方案

**宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司**  
**年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目**  
**监测方案**

一、无组织废气

1.1 执行标准：厂界无组织废气污染物中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

1.2 监测内容：

监测对象	监测点位	监测因子	监测频次	备注
无组织废气	企业厂界四周各设置 1 个监测点位	颗粒物、非甲烷总烃	3 次/天，共 2 天	同步记录气象参数

二、厂界噪声

2.1 执行标准：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准。

2.2 监测内容：

污染物名称	监测点位	监测频次
厂界噪声	厂界四周各设 1 个监测点位	昼间 1 次，共 2 天

**注：监测时应符合竣工验收监测工况要求。**

## 第二部分 宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目竣工环境保护验收意见

### 宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司 年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目 竣工环境保护验收意见

2021 年 3 月 22 日，宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司根据《年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

#### 一、工程建设基本情况

##### （一）建设地点、规模、主要建设内容

宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司位于宁波市宁海县岔路镇高坦村 107 号，建筑面积约 2000m<sup>2</sup>。主要为木工和石英石板加工设备，具体有推拉锯 2 台、自动封边机 2 台、台钻 1 台、手工打磨机 5 台、抛光机 2 台等生产设备，项目建成后实现年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产规模。项目实际建设地点、建设内容与环评批复基本一致。

##### （二）建设过程及环保审批情况

企业于 2020 年 11 月委托宁波奇英环保技术咨询有限公司编制了《宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目环境影响报告表》；宁波市生态环境局以“甬环宁建〔2020〕310 号”文件对该项目予以批复。本项目于 2020 年 12 月开工建设，环保设施于 2021 年 2 月竣工，并于 2021 年 3 月进行调试。

##### （三）投资情况

本项目实际总投资约 300 万元，其中环保投资约 6 万元，占投资总额的 2%。

##### （四）验收范围

本次验收的范围为宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目，为项目整体验收。

## 二、工程变动情况

经现场核查，项目实际建设内容、生产规模、生产工艺、污染防治措施与环评批复基本一致，本项目无重大变动情况。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）废水

主要为生活污水。

本项目生产用水为湿法作业及湿式除尘设备用水，废水进入沉淀池，经过沉淀捞渣后回用于生产，不外排，定期补充消耗；生活污水经化粪池处理后由宁海县岔路镇环境卫生所抽运。

### （二）废气

主要为石材加工粉尘、木工粉尘、云石胶废气、热熔胶废气。

本项目木工粉尘经设备自带双筒布袋除尘设备处理后排放。

本项目石材加工采用湿法作业抑尘和水帘处理除尘。

本项目云石胶废气、热熔胶废气加强车间通风排放。

### （三）噪声

项目的噪声污染主要来源于推拉锯、切割机等各类设备的机械噪声。项目采用合理布局，加装减震垫，选用低噪声设备等措施进行降噪。

### （四）固体废物

本项目废包装材料、木加工废料、木加工回收粉尘、废石材边角料、废切割打磨材料、沉渣由资源回收公司回收利用；废封边条、生活垃圾由环卫部门清运。

### （五）总量控制

本项目根据企业实际原辅材料使用量，颗粒物排放总量为：0.0437t/a，VOC<sub>s</sub>排放总量为0.0057t/a，符合总量控制要求。

## 四、环境保护设施调试效果

### （一）污染物排放情况

#### 1.废气

监测期间（2021年3月18日~3月19日），本项目厂界无组织废气污染物中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均最大值符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

## 2. 厂界噪声

监测期间（2021年3月18日~3月19日），本项目厂界噪声昼间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

## 五、工程建设对环境的影响

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环境保护设施均能正常运行。项目竣工验收废气、噪声监测数据能达到相关排放标准；项目落实了各类固废的分类处置途径，实现了固废的资源化、无害化处置；项目污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

## 六、验收结论

经现场查验，宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产500套板式家具、800套石英石台面生产项目履行了环境影响评价制度，项目建设过程中执行了环境保护“三同时”制度，总体落实了环评报告表及其批复提出的各项环境保护措施，满足竣工环境保护验收条件，经审议验收组结论：项目整体竣工环境保护验收合格。

## 七、后续要求

1、严格遵守环保法律法规，完善各项环境保护管理和监测制度，强化从事环保工作人员业务培训，重点加强车间管理，减少无组织废气的排放。

2、按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》相关要求，完善验收监测报告内容。完善竣工环保验收的相关手续，按规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

八、验收组成员信息表

参会人员名单				
	姓名	单位	身份证号码	电话
组长	高勇全	宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司	3802261	14470
专家成员	顾学平	宁波市环境保护局	22	1300
其他成员	陈丹宇	宁波市环境监测中心	-	18861

8893

宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司



### 第三部分 宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目其他需要说明的事项

#### 1. 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

##### 1.1 设计简况

建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

##### 1.2 施工简况

环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

##### 1.3 验收过程简况

宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目环保设施于 2021 年 2 月竣工。宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司委托宁波市甬蓝检测有限公司对宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目进行验收监测工作。按照检测委托合同，宁波市甬蓝检测有限公司提供废水、废气、噪声项目的监测服务。2021 年 3 月，宁波市甬蓝检测有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》以及宁波市甬蓝检测有限公司出具“YLE20210140”检测报告，编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告；2021 年 3 月 22 日，宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司组织成立本项目竣工环境保护验收工作组，验收工作组踏勘企业生产现场后，经认真讨论和审查，形成了如下验收意见：经现场查验，《宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司年产 500 套板式家具、800 套石英石台面生产项目》环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，项目建设内容与项目环境影响报告表、及其批复基本一致，已落实了环保“三同时”和环境影响报告表及批复的各项环保要求，竣工环保验收条

件基本具备。验收资料完整齐全，污染物达标排放、环保设施有效运行、验收监测结论明确合理。验收工作组结论：该项目竣工环境保护验收合格。

## 2. 其他环境保护措施的实施情况

### 2.1 制度措施落实情况

#### (1) 环保组织机构及规章制度

本建设项目运营期污染物为废水、废气、一般固废、生活垃圾，企业已设有环保组织机构，完善环境管理台账记录。

#### (2) 环境风险防范措施

本建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定未要求制定环境风险应急预案，因此本项目未制定环境风险应急预案。

#### (3) 环境监测计划

本建设项目环境影响报告表已制定环境监测计划。

### 2.2 配套措施落实情况

#### (1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施，无需说明。

## 3. 整改工作意见

根据验收意见，本建设项目竣工验收合格，各项环保设施已基本落实到位，无相应整改。

宁海县雅洁利新型装饰材料有限公司

2021年3月22日
